

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 9 月

010 期

项目：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程		填报周期：2018 年 8 月 27 日— 9 月 2 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、红都兴厂房屋顶电缆桥架、直流电缆敷设正在施工中；光伏组件已进场，准备施工。				
2、圆鑫标准厂房屋顶光伏组件已进场，正在施工中。				
3、凯斯特厂房屋顶光伏组件正在安装中。				
4、金富电力厂房屋顶逆变器、汇流箱、配电箱已安装完成，准备并网发电。				
5、海润服饰厂房屋顶光伏组件已进场，正在施工中。				
6、凯迪电子（金一珠宝）厂房屋顶光伏组件已安装完成。				
7、瑞京鸿兴厂房屋光伏组件正在施工中。				
8、瑞谷科技厂房屋顶逆变器、汇流箱、配电箱已完成安装，准备并网发电。				
9、金字电线电缆厂房屋顶光伏组件已进场，准备施工安装。				
10、江雄管道厂房屋顶光伏支架已完成安装；接地网焊接已完成；电缆桥架、直流电缆敷设已完成；光伏组件暂未进场。				
11、诚顺钟表厂房屋顶模板已进场，正在施工中。				
12、弘冠发制品厂房屋顶，条形基础尚未浇筑完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程		无		
2、开关站/升压站		无		
3、综合楼/附属建筑		无		
4、场内桩基施工		无		
5、支架及组件安装		光伏支架已安装容量 2835KW。光伏组件已到货 288 托。		
6、逆变器及箱变		无		
7、送出工程（含对侧）		无		
8、现场调试		无		
9、出图情况		图纸不全，部分图纸有电子档		
10、设备到货情况		系统名称	计划到货日期	实际到货日期
				本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

	光伏组件		20180829	累计到货 288 托
11、人员/机械情况	现场施工人员 60 人/次。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	蓝图未出，暂时只有电子版施工图。			
未解决的协调问题解决进展	瑞金经开区的厂房屋顶尚未满足本工程的装机容量要求，经开区厂房屋顶已基本解决，现等待工厂厂房屋顶防水施工完成后，光伏电站开始建设。			
五、下周计划主要工作内容				
1、组件区域工程	电缆桥架、直流电缆敷设正在施工中；光伏组件已到货，所有进场的厂房屋顶光伏组件都要完成安装，同时安装逆变器、汇流箱、配电箱等电气设备。			
2、逆变/箱变工程	无			
3、外线工程	无			
4、其他	无			

填报人： 李云 审核人： 苗守明 时间： 2018 年 9 月 2 日
工程现场照片（含文字描述）：




瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
与业主方、施工方三方共同巡视电站施工现场20180827



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
金富电力厂房屋顶逆变器安装20180828



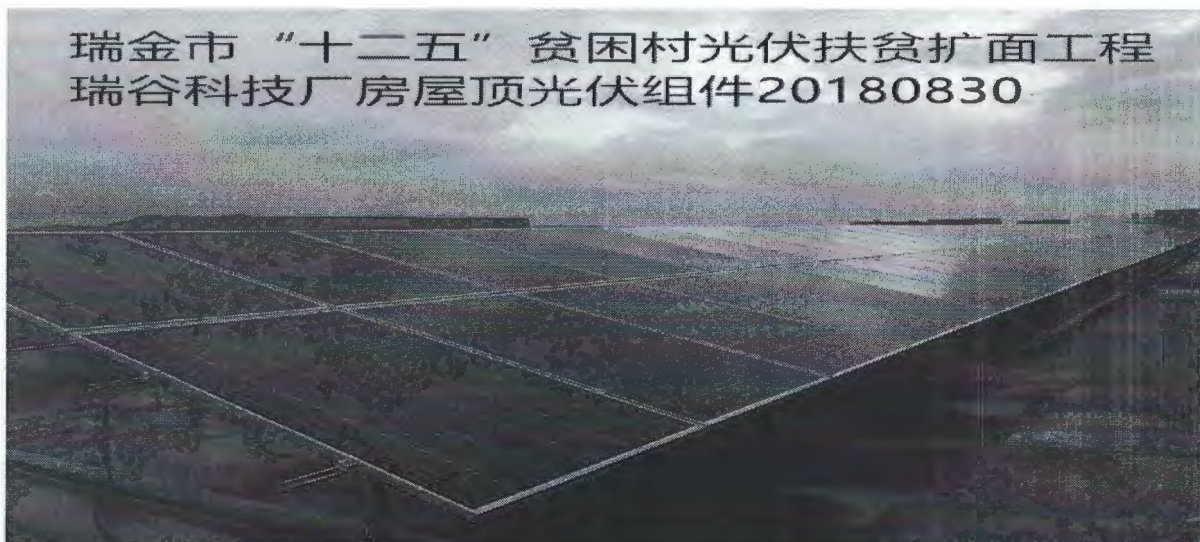

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
圆鑫标准厂房屋顶光伏组件安装20180901



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
圆鑫标准厂房屋顶光伏组件安装20180902

