

正衡监理光伏项目工程建设监理周报


2018 年 9 月


014 期

项目：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程		填报周期：2018 年 9 月 24 日— 9 月 30 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、红都兴厂房屋顶电缆桥架、直流电缆敷设正在施工中；光伏组件正在安装中。				
2、圆鑫标准厂房光伏电站已并网发电试运行。				
3、凯斯特光伏电站已并网发电试运行。				
4、金富电力光伏电站已并网发电试运行。				
5、海润服饰光伏电站已并网发电试运行。				
6、凯迪电子（金一珠宝）厂房屋顶光伏电站已并网发电试运行。				
7、瑞京鸿兴光伏电站已并网发电试运行。				
8、瑞谷科技光伏电站已并网发电试运行。				
9、金字电线电缆厂房屋顶电缆敷设施工中。				
10、江雄管道光伏电站建设已完成，等待并网发电。				
11、美家照明光伏电站已并网发电试运行。				
12、诚顺钟表厂房屋顶光伏支架已完成安装，直流电缆敷设施工中。				
13、乐群塑胶厂房屋顶光伏支架已完成安装，直流电缆敷设施工中。				
14、弘冠发制品厂房屋顶光伏支架已完成安装。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、支架及组件安装	光伏支架已安装容量 3.335KW，组件已安装 3.102KW。			
6、逆变器及箱变	8 个企业光伏电站并网发电试运行。			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况	图纸不全，部分图纸有电子档			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况	现场施工人员 140 人/次。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	蓝图未出，暂时只有电子版施工图。			
未解决的协调问题解决进展	瑞金经开区的厂房屋顶尚未满足本工程的装机容量要求，经开区厂房屋顶已基本解决，现等待工厂厂房屋顶防水施工完成后，光伏电站开始建设。			
五、下周计划主要工作内容				
1、组件区域工程	电缆桥架、直流电缆敷设正在施工中；光伏组件已到货，所有进场的厂房屋顶光伏组件都要完成安装，同时安装逆变器、汇流箱、配电箱等电气设备。			
2、逆变/箱变工程	组件安装完成的屋顶，同步安装逆变器、汇流箱、配电箱等电气设备。			
3、外线工程	无			
4、其他	无			

填报人：李云 审核人：苗守明 时间：2018 年 9 月 30 日
工程现场照片（含文字描述）：

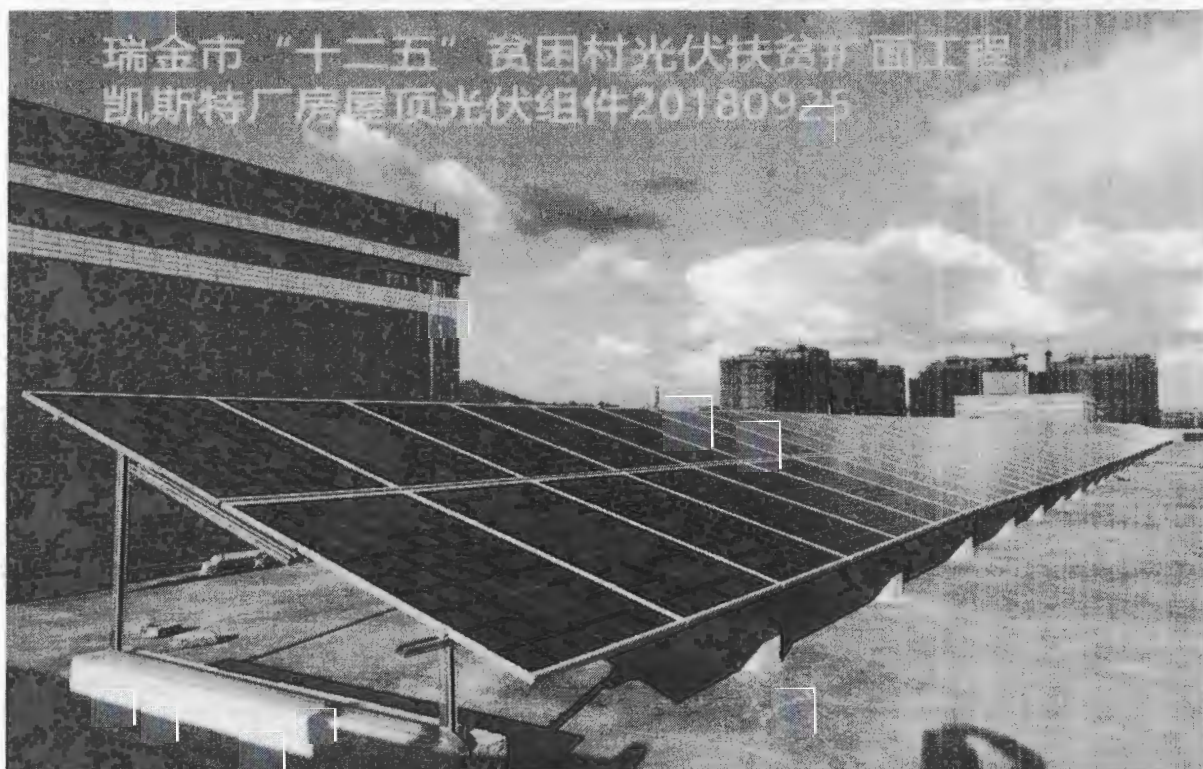

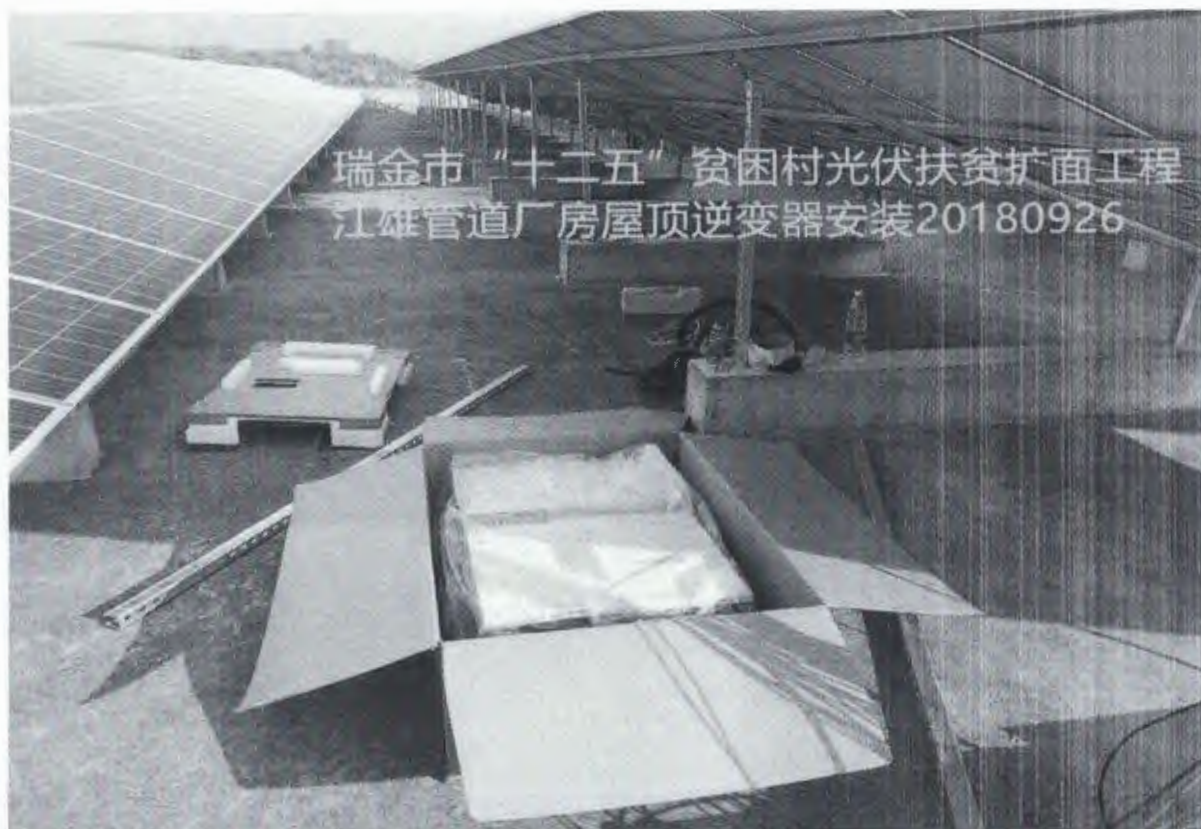

瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
红都兴厂房屋顶光伏组件20180927



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
江雄管道厂房屋顶光伏组件20180928



瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程
江雄管道厂房屋顶电缆敷设20180929

