

监 理 周 报

项目名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺 3.5856MW)

编号: GFDZJBM12-003

本周工作概况	1、本周(2018年10月27号-2018年11月02日),完成了2个箱变基础的梁柱、圈梁、检修平台支模。 2、箱变箱变基础的梁柱、圈梁、检修平台支模(两个)。 3、D号楼面开始测量放线、撒料、夹具檩条安装,截止11月02日已完成安装65%。 4、2018年10月27日焊接制作上楼钢爬梯(12米)一个。 5、监理项目部对已浇筑的两个箱变基础梁柱、圈梁、检修平台混凝土就行了初测(HT225-A型混凝土回弹仪),经初步检测符合设计要求。 6、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查,并做记录(监理日志)。
施工质量情况	施工质量存在以下问题: 1、施工过程中有个别施工人员戴安全帽帽带未系现象。 2、D号楼面夹具、檩条安装个别螺栓缺少平垫、弹簧垫、螺帽以及螺栓紧固不到位,存在松动现象。 3、上楼爬梯墙面上部固定离墙面间距过小,不利于施工人员上下楼安全,安全警示标志悬挂不规范。
材料进场情况	无

材料进场检验	无
隐蔽验收情况	无
发文情况	周监理会议纪要一份（编号：GFDZJBM09-003）。 监理检查记录表一份（编号：GFDZJBM14-003）。 监理月报一份（编号：GFDZJBM16-001）
收文情况	无。
安全情况	部分施工人员佩戴安全帽，监理巡视发现后，及时纠正并进行批评教育，本周无重大安全隐患。
下周工作要	1、监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1)、D号楼面夹具、檩条安装。 2)、箱变梁柱、圈梁以及检修平台支模、浇筑。 2、总包方专职安全员要每天跟踪施工人员作业，确保施工现场人员、设备零事故。 3、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。

点	4、与场区负责人协调过路（两段）电缆保护管敷设（破路直埋或架空敷设桥架）事宜，并落实具体施工方案。						
现场施工人员班组情况	安装施工人员 9 人。						
天气	1	2	3	4	5	6	7
	多云	晴	多云	晴	晴	多云	晴


编写人：宋龙

编制时间：2018 年 11 月 02 日

附施工照片：



召开周例会

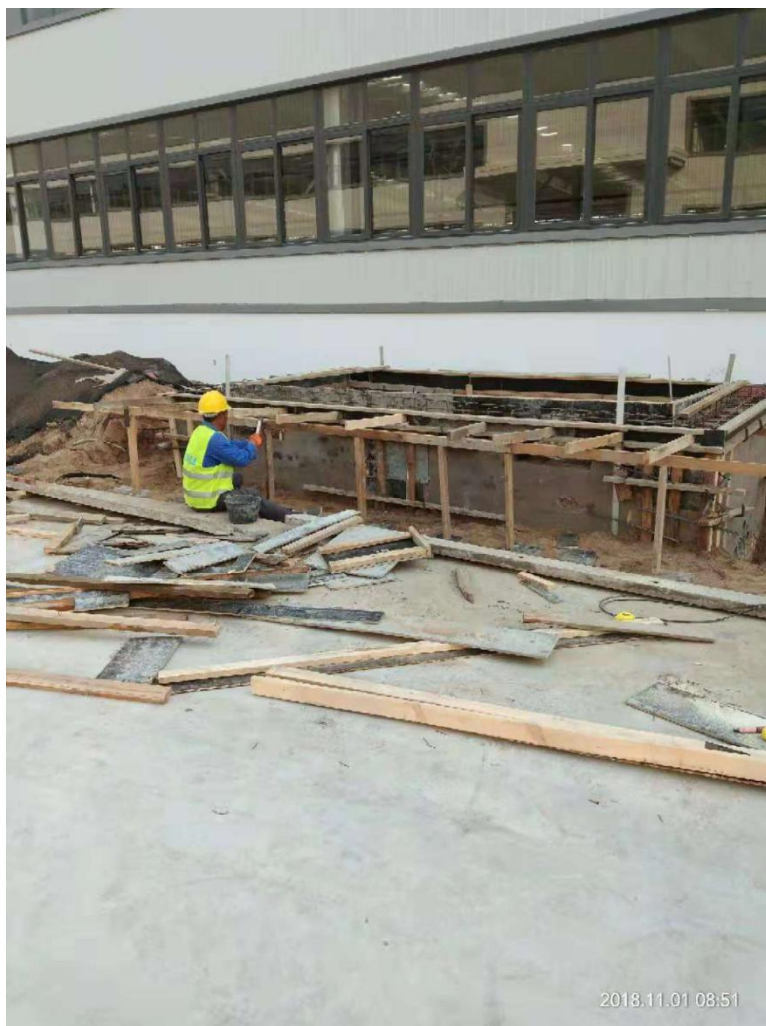

箱变基础支模



D 号厂房檩条安装
