

监 理 周 报

项目名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺 3.5856MW)

编号: GFDZJBM12-004

本周工作概况	1、2018 年 11 月 09 日完成了 3#、4#2 个箱变基础的浇筑。 2、D 号楼面开始夹具、檩条安装,截止 11 月 09 日已完成安装 100%。 3、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查,并做记录(监理日志)。 4、组件已进场 48 箱 0.4MWp,准备下周进行安装。
施工质量情况	施工质量存在以下问题: 1、施工过程中有个别施工人员戴安全帽帽带未系现象。 2、D 号楼面夹具、檩条安装个别螺栓缺少平垫、弹簧垫、螺帽以及螺栓紧固不到位,存在松动现象。 3、箱变基础支模与钢筋绑扎存在部分问题详见(监理通知单 002),已通知施工方整改完毕。
材料进场情况	1、高压电缆及接地线已 11 月 8 日部分到场。 2、组件已 11 月 9 日进场 48 箱 0.4MWp。
材料进场检验	已对经常组件进行开箱检查,并形成设备材料开箱记录表。

隐蔽验收情况	已对 3#4#箱变基础进行浇筑前验收。
发文情况	周监理会议纪要一份（编号：GFDZJBM09-004）。 监理通知单一份（GFDZJBM010-002）。 安全/质量活动记录表一份
收文情况	无。
安全情况	部分施工人员佩戴安全帽，监理巡视发现后，及时纠正并进行批评教育，本周无重大安全隐患。
下周工作要点	1、监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1)、D号楼面压块安装。 2)、D号楼面组件安装。 2、总包方专职安全员要每天跟踪施工人员作业，确保施工现场人员、设备零事故。 3、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。 4、与场区负责人协调过路（两段）电缆保护管敷设（破路直埋或架空敷设桥架）事宜，并落实具体施工方案。
现场施工人	安装施工人员 9 人。

员 班 组 情 况	
-----------------------	--

编写人：宋龙


编制时间：2018 年 11 月 09 日

日期	一	二	三	四	五	六	日
天气	中雨	中雨	小雨	小雨	晴	多云	晴

附施工照片：



箱变基础标高复测

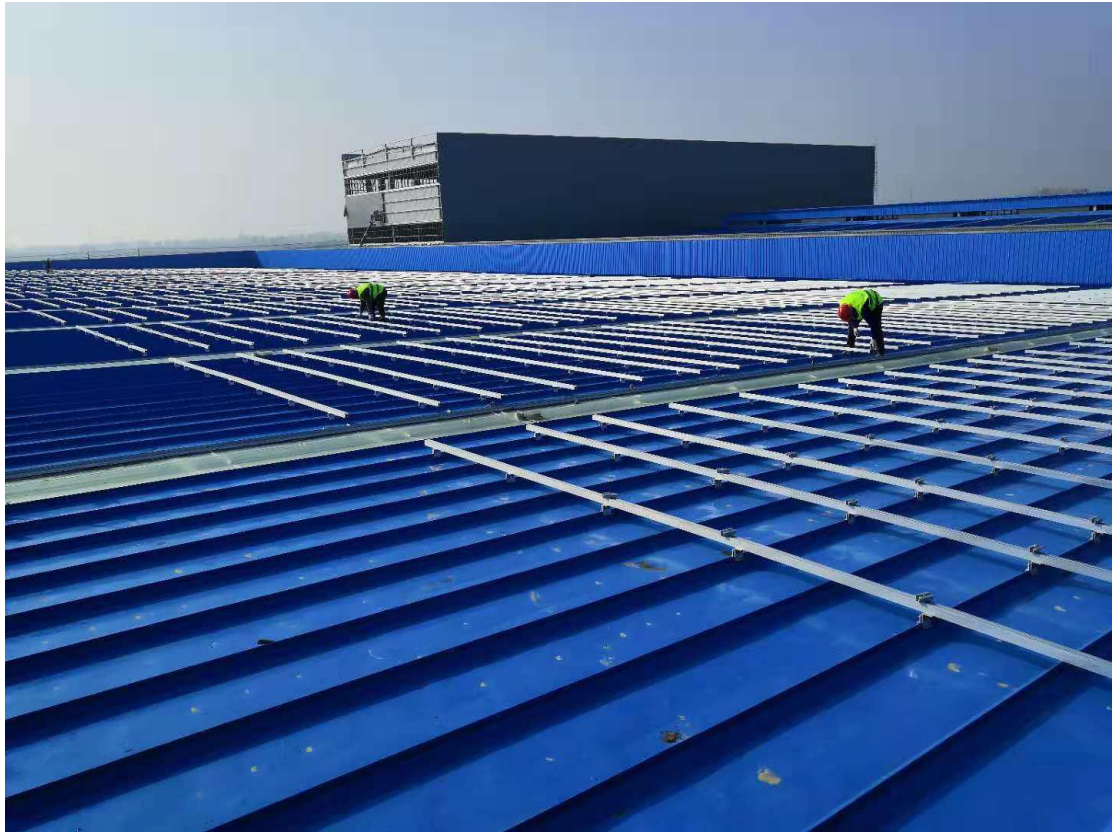

皮阿诺 D 号厂房压块、檩条安装



箱变基础浇筑
