

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

监 理 周 报

第 6 期

编 制 时 间：2018.11.23

监理单位编制人：宋龙

监理单位审核人：田同有

常州正衡电力工程监理有限公司

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

监理部

项目名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司

一、 工程概况：

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目建设项目位于河南省开封市兰考县。

河南开封兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目，位于开封市兰考恒大家具联盟产业园内，占地面积 676120 m²，距开封市约 43.3km，总装机容量 17.2422MW，其中(欧派 2.997MW, 占地面积 68130 m²，组件共 11100 块，汇流箱 1 个，箱变 3 个，一次舱 1 个，二次舱 1 个)(索菲亚 5.454MW，占地面积 127307 m²，组件共 11980 块，汇流箱 58 个，箱变 5 个，一次舱 1 个，二次舱 1 个)，(皮阿诺 3.5856MW，占地面积 149400 m²，组件共 13280 块，汇流箱 52 个，箱变 4 个，一次舱 1 个，二次舱 1 个)，(曲美 1.971MW, 占地面积 74854 m²，组件共 7300 块，汇流箱 24 个，箱变 2 个，一次舱 1 个，二次舱 1 个)，(大自然 3.2346MW，占地面积 129120 m²，组件共 11980 块，汇流箱 44 个，箱变 3 个，一次舱 1 个，二次舱 1 个)。电池组件厂家为 270 多晶硅类型，固定式安装。电站于 2018 年 12 月 31 日并网发电。

二、 施工概述：(包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述)

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程(土方工程、支架基础、场地及地下设施、建(构)筑物、设备基础、电缆沟等)

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1	兰考恒大（皮阿诺）	设备基础	预制舱基础模板安装完成	预制舱基础已浇筑完成	100%
2		电缆井砌体	/	电缆井砌体已完成	85%
3					
4					
5					

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电气安装等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1	兰考恒大（皮阿诺）	支架安装（皮阿诺）	D号屋面支架安装完成 70%	D号屋面支架安装完成 100% C号屋面支架安装完成 100% E号屋面组件安装完成 100%	100%
2		组件安装（皮阿诺）	D号屋面组件安装完成 30%	D号屋面组件安装完成 30%	14%
3					
4					
5					

3、进度情况分析：施工人员平均每天 16 人

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	（进场材料、构配件、设备）名称	进场时间（年月日）	进场数量（单位）	拟用部位
1	支架	2018.11.16	(若干)其他地区倒运	光伏区
2	组件	2018.11.09	/	光伏区
3	1*4m ² 电缆	2018. 11. 12	50768	光伏区
4	2*70m ² 电缆	2018. 11. 12	3890	

4	桥架	2018.11.18	(若干)其他地区倒运	光伏区
5	汇流箱	2018.10.10	/	光伏区
6	检修通道	2018. 11. 22	800 米	光伏区

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

管理人员：田有同、宋龙

2、施工单位：

(1) 管理人员：李宁

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	1、支架进场验收	进场材料报审表
		2、组件进场验收	进场材料报审表
		3、电缆进场验收	进场材料报审表
		4、电缆桥架进场验收	进场材料报审表
		5、检修通道进场验收	进场材料报审表
		6、接地扁钢进场验收	
2	监理旁站项目	1、组件吊装及组件分散	安全旁站记录表 001
		2、一次、二次预制舱浇筑	监理旁站记录表 003
3	施工质量检查记录	1、皮阿诺厂房屋面安全防护	
		2、C#厂房支架安装(皮阿诺)	对施工发现质量问题形成监理联系单
		3、E#厂房支架安装(皮阿诺)	下发至总包及业主经理
		4、	
		5、	
4	隐蔽工程质量验收	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5	
5	分部分项工程验收	1、	
		2	
		3	

6	其他	4	
		5	
		1	
		2	
		3	
		4	

七、施工质量问题

- 1、C、D号厂房，女儿墙安全防护不到位。
- 2、光伏组件倒运时，施工人员一个人背、扛组件，可能造成组件隐裂的现象。
- 3、D号楼面个别组件未对螺栓固定，易被大风吹动，造成组件移位受损。
- 4、C号、E号楼面个别夹具安装缺少垫片。
- 5、现场施工工序资料、材料进场资料报审不及时。
- 6、现场施工人员仍然存在未正确佩戴安全帽与反光背心。

八、安全文明施工

要求现场施工人员每天开早会进行安全技术交底形成文件并保存影像

九、沟通协调

- 1、材料进场速度比较慢，影响施工进度。

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

- 2、工程签证：
- 3、其他：

十一、天气统计表。

11月 天气	17	18	19	20	21	22	23
晴	阴	晴	阴	晴	晴	晴	晴
雨							
阴							
雾							

十二、监理工作统计表：

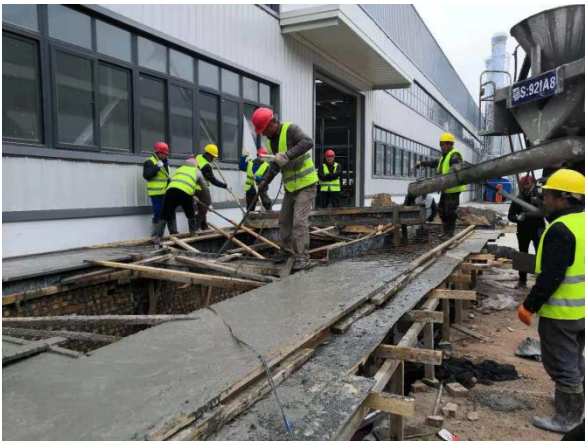
序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议	1		6	
2	审批施工组织设计（方案）	1		1	
3	审核施工图纸	1		1	
4	发出监理通知	1		3	
5	审批分包单位				
6	原材料审批	6		6	
7	构配件审批	1		1	
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收	1		/	
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收				
12	监理抽查复试				
13	监理见证取样				
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				

十三、本周监理工作小结：

- 1、2018 年 11 月 17 日一二次预制舱变基础已浇筑完成。
- 2、截止 11 月 23 日 C 号楼面光伏支架已安装完成 100%。
- 3、截止 11 月 23 日 E 号楼面光伏支架安装已完成 50%。
- 4、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）。

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	皮阿诺夹具组装	皮阿诺预制舱基础浇筑
图片		
文字描述	C号楼光伏支架安装	
图片		

二、质量问题影像

文字描述	施工材料随处堆放	
图片		

三、质量问检查影像

文字描述	夹具组装检查	支架安装检查
图片		

四、安全文明施工影像

文字描述	每日班前会	女儿墙安全防护
图 片		

五、其他施工事宜影像

文字描述	
图 片	
