

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

监 理 周 报

(曲美项目 1.971MW)

第 02 期

编 制 时 间：2018.12.14

监理单位编制人：任远威

监理单位审核人：田同有

常州正衡电力工程监理有限公司

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

监理项目部

第 1 页 共 11 页



扫描全能王 创建

项目名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(曲美项目 1.971MW)

建设单位：兰考县杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：临湘市振宇建筑工程有限责任公司

一、工程概况：

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目建设项目位于河南省开封市兰考县。

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目，位于开封市兰考恒大家具联盟产业园内，占地面积 676120 m²，距开封市约 43.3km，总装机容量 17.2422MW，其中(曲美 1.971MW, 占地面积 74854 m²，组件共 7300 块，汇流箱 24 个，箱变 2 个，一次舱 1 个，二次舱 1 个)，电池组件为 270 多晶硅类型，固定式安装。电站于 2019 年 01 月 30 日并网发电。

二、施工概述：(包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述)

1、本周监理项目部对箱变基础梁柱、圈梁、挑檐(检修平台)混凝土浇筑进行了监理质量旁站，经监理项目部检查旁站浇筑质量符合设计要求。

2、监理项目部、施工项目部共同对一二次预制舱基槽进行了检验。

3、监理项目部对一二次基础土方开挖、钢筋绑扎制作、底板混凝土浇筑、砌墙进行了检查验收以及质量旁站。

4、监理项目部对进场的沙、砖、水泥以及钢筋、镀锌钢管、接地扁铁材料进行了检查验收。

5、施工项目部已按监理项目部要求，能够每天召开施工人员早班会，对安全、质量、人员分工、进度就行了交底。本周无安全隐患。

三、工程项目进度情况一览表



1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量 (%)
1	兰考恒大	设备基础。	（ NJX01 、 NJX02）箱变基础梁柱、挑檐支模、浇筑完成。	100%	100%
2		设备基础砌墙。	一二次预制舱基础土方开挖、底板混凝土浇筑完成	100%	100%
3		一二次预制舱基础砌墙。	要求完成 30%	50%	
4					
5					

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电气安装等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量 (%)
1	兰考恒大	无			



	大				
2					
3					
4					
5					

进度情况分析：施工人员平均每天 8 人

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	(进场材料、构配件、设备) 名称	进场时间 (年月日)	进场数量 (单位)	拟用部位
1	砖	12 月 05 日	26000 块	箱变设备基础
2	水泥	12 月 05 日	3T	箱变设备基础
3	沙	12 月 05 日	40T	箱变设备基础
4	镀锌扁铁	12 月 10 日	40 根 50mmX5m m	箱变、一二次预制舱基础
5	镀锌钢管	12 月 08 日	11 根 (150mm X6m) 9 根 (100X6 m)	箱变、一二次预制舱基础以及直埋电缆铺设。



6				
---	--	--	--	--

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：田有同、宋龙、任远威

2、施工单位：

(1) 管理人员：罗灿

六、施工质量控制情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	沙、砖、水泥材料进场验收。	材料进场报审表
		箱变基础接地扁铁、镀锌钢管材料进场验收。	材料进场报审表
2	监理旁站项目	1、NJX01、NJX02 箱变基础梁柱、圈梁、挑檐混凝土浇筑	安全旁站记录表 (GFDZJBM30-002)
		2、一二次预制舱基础底板混凝土浇筑	安全旁站记录表 (GFDZJBM30-003)



		3、	
		4、	
		5	
3	施 工 质 量 检 查 记 录	1、一二次预制舱基基础土方开挖 验槽	平 行 检 验 记 录 表 (GFDZJBM26-004)
		2、一二次预制舱基础底板钢筋安 装检查	平 行 检 验 记 录 表 (GFDZJBM26-005)
		3、	
		4、	
		5、	
4	隐 蔽 工 程 质 量 验 收	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5	
5	分 部 分 项 工 程 验 收	1、	
		2	
		3	
		4	
		5	
6	其 他	1	
		2	
		3	
		4	



七、施工质量问题：无。

八、安全文明施工：

- 1、施工现场安全警戒线、安全警示标牌设置、悬挂不规范。
- 2、个别施工人员安全帽、反光背心佩戴不规范，要求加强安全防范意识。确保安全施工零事故。

九、沟通协调

- 1、监理项目部与业主项目部对本项目材料进场计划进行沟通协调，业主项目部本月暂无安排材料进场计划。
- 2、要求施工单位配合业主负责人尽快与场区协调两个屋面彩钢瓦漏水严重情况。

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

2、工程签证：无

3、其他：

十一、天气统计表。

日期 天气	12月08 号	12月09 号	12月10 号	12月11 号	12月12 号	12月13 号	12月 14号
晴	✓	✓	✓		✓	✓	✓
雨							
阴				✓			
雾							
温湿度							

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议	3	1	3	
2	监理旁站	3	2	3	
3	平行检验记录表	4	2	4	
4					



5	审批分包单位				
6	原材料审批				
7	构配件审批				
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收				
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收				
12	监理抽查复试				
13	监理见证取样	2		2	
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				

十三、本周监理工作小结：

1、2018 年 10 月 25 日施工人员进场，2018 年 11 月 28 日开始施工，监理项目部对进场施工人员进行了安全技术交底。

2、12 月 11 日监理项目部对一二次预制舱基础土方开挖进行验槽（平行检验一份），经监理项目部检查验收，符合设计要求。

3、12 月 12 日监理项目部对一二次预制舱基础底板钢筋绑扎制作进行了检查（平行检验一份）。

4、12 月 13 日监理项目部对一二次预制舱基础底板混凝土浇筑进行了质量旁站。


5、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）。

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	一二次预制舱基础土方开挖	一二次预制舱基础底板浇筑
------	--------------	--------------

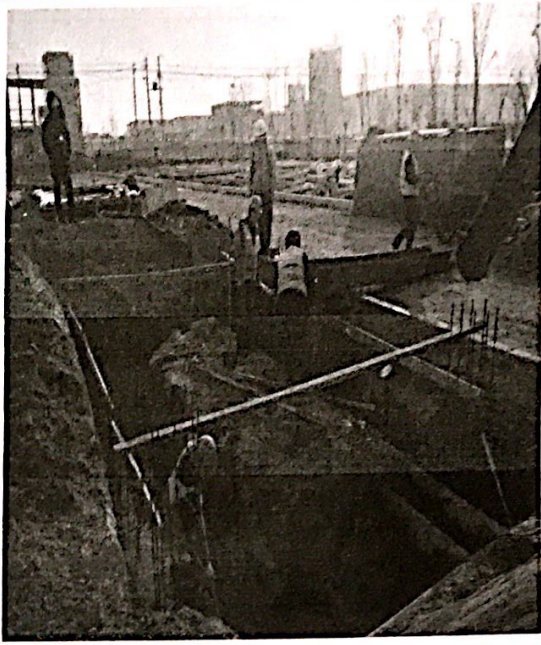

图片		
文字描述	一二次预制舱基础底板钢筋安装	一次预制舱接地镀锌扁铁焊接施工
图片		

二、质量问题影像

文字描述	无	
图片		



三、质量问检查影像

文字描述	无	无
图片		

四、安全文明施工影像

文字描述	每日早班会交底	
图片		



五、其他施工事宜影像

文字 描述	
图 片	

