

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

-曲美 1.971MW 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 09 期

编 制 时 间：2019.04.19

监理单位编制人：任远威

监理单位审核人：李云

常州正衡电力工程监理有限公司

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目



由 扫描全能王 扫描创建

项目名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美 1.971MW 分布式光伏发电项目

建设单位：兰考县杭泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：临湘市振宇建筑工程有限责任公司

一、工程概况：

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目建设项目位于河南省开封市兰考县。

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目，位于开封市兰考恒大家具联盟产业园内，占地面积 676120 m²，距开封市约 43.3km，总装机容量 17.2422MW，其中（曲美 1.971MW，占地面积 74854 m²，组件共 7300 块，汇流箱 24 个，箱变 2 个，一次舱 1 个，二次舱 1 个），电池组件为 270 多晶硅类型，固定式安装。

二、施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

1、本周施工项目部主要 1) 曲美 1#、2#厂房屋顶电缆桥架安装，2) 1#厂房屋面 4 平光伏直流电缆敷设完成，光伏组串之间接线完成。光伏直流高压电缆敷设。3) 2#厂房屋面光伏直流高压电缆敷设。4) 电缆进场 1860 米，已做设备材料开箱检查。

2、施工项目部已按监理项目部要求，对安全、质量、人员分工、进度、安全进行了交底。

3、施工现场无重大安全隐患。



三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1	兰考恒大	设备基础			100%
2		电缆井砌体			80%
3					
4					
5					

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电气安装等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1	兰考恒大 曲美厂区	光伏支架安装			100%
2		光伏组件安装			25%
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	(进场材料、构配件、设备) 名称	进场时间 (年月日)	进场数量 (单位)	拟用部位
1	电缆	2019. 4. 19	1860 米	曲美光伏区
2				
3				
4				
5				
6				
7				

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：李云、任远威

2、施工单位：

(1) 管理人员：罗灿

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	电缆进场 1860 米	设备材料开箱检查记录表
2	监理旁站项目	电缆、桥架吊运作业	安全旁站监理记录表



3	施工质量检查记录	1、现场施工质量检查	监理检查记录表
		2、	
		3、	
		4、	
		5、	
4	隐蔽工程质量验收	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5	
5	分部分项工程验收	1、	
		2、	
		3、	
		4	
		5	
6	其他	1	
		2	
		3	
		4	

七、施工质量问题：无

八、安全文明施工

1、施工项目部已按监理项目部要求，每天召开早班会，对施工人员进行安全技术交底形成文件并保存影像发至项目施工群。

2、本周无安全隐患，机械、人员零事故。

九、沟通协调：无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

1、工程签证：无

2、其他：无



十一、天气统计表。

日期 天气	04月13 日	04月14 日	04月15 日	04月16 日	04月17 日	04月18 日	04月19 日
晴					✓		
雪							
阴	✓						✓
多云		✓	✓	✓		✓	
温湿度							

十二、监理工作统计表：

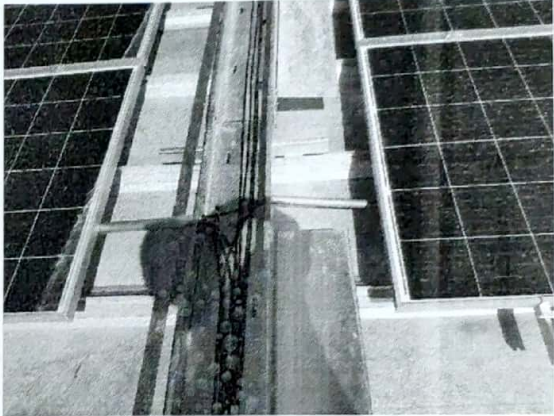
序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议	份	1	6	
2	审批施工组织设计（方案）	份			
3	审核施工图纸	份			
4	发出监理通知	份	2	4	
5	审批分包单位	份			
6	原材料审批	份			
7	构配件审批	份			
8	设备审批	份			
9	分项（检验批）工程质量验收	份			
10	分部（子分部）工程质量验收	份			
11	不合格项验收	份			
12	监理抽查复试	份			
13	监理见证取样	份			
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备	份			

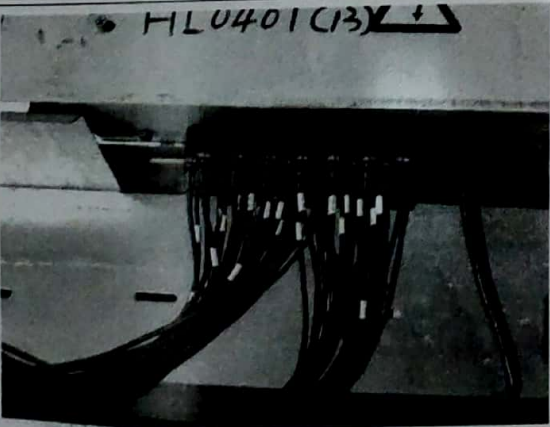


本周监理工作小结:

- 1、监理项目部坚持每天对场区施工部位进行检查。
- 2、监理项目部坚持每日对场区安全情况进行检查,发现安全隐患及时通知施工项目部,要求现场整改到位,安全监理员跟踪整改。
- 3、监理人员坚持每日记录施工现场情况(记录日志)以及监理检查记录表等。

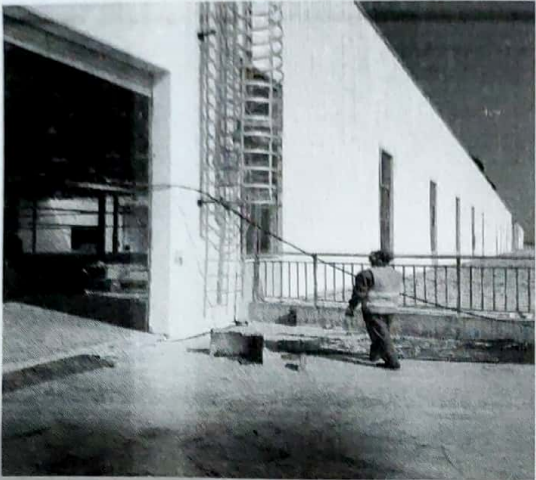
一、形象进度影像

文字描述	1#厂房屋面光伏组串间接线	1#厂房屋面电缆敷设
图片		

文字描述	汇流箱端电缆接线	接地扁钢摆放
图片		



二、质量问题影像

文字描述	施工人员未正确佩戴安全帽	
图片		

三、质量问题检查影像

文字描述	巡视检查 1#厂房屋面 4 平电缆 MC4 插头压接情况	1#厂房屋面电缆竖井安装情况
图片		



四、安全文明施工影像

文字描述	业主方、施工方与监理方共同检查光伏组件安装情况	
图片		

五、其他施工事宜影像

文字描述	每周监理例会	
图片	
