

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目
-大自然 3.2346MW 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 8 期

编 制 时 间：2019.09.06

监理单位编制人：任远威

监理单位审核人：苗守明

常州正衡电力工程监理有限公司
兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目
监理项目部



项目名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-大自然 3.2346MW 分布式光伏发电项目

建设单位：兰考县兴泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司

一、 工程概况：

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目建设项目位于河南省开封市兰考县。

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目，位于开封市兰考恒大家具联盟产业园内，占地面积 676120 m²，距开封市约 43.3km，总装机容量 17.2422MW，其中(大自然 3.2346MW，占地面积 129120 m²，组件共 11980 块，汇流箱 44 个，箱变 3 个，一次舱 1 个，二次舱 1 个。电池组件厂家为 270 多晶硅类型，固定式安装。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

1、本周施工项目部主要工作：1#屋面光伏区支架檩条安装；1#屋面光伏区中压块组装原装里#屋面光伏区放线定位安装夹具，4#屋面光伏区支架檩条搬运与安装。

2、本周施工现场安全检查，未发现重大安全隐患。



三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1	兰考恒大-大自然	箱变设备基础		95%	95%
2		电缆井砌体		80%	80%
3		一二次预制舱基础		95%	95%
4					
5					

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电气安装等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1	兰考恒大-大自然	光伏支架	45%	50%	50%
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	(进场材料、构配件、设备) 名称	进场时间 (年月日)	进场数量 (单位)	拟用部位
1	光伏组件	20190901	3589 块	1#屋面光伏区
2	支架檩条	20190901	1837 根	1#、4#屋面光伏区
3	紧固件	20190901	25810 只	1#、4#屋面光伏区
4				
5				
6				
7				

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：任远威

2、施工单位：

(1) 管理人员：李宁

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	支架檩条、紧固件进场	设备开箱检查记录表



2	监理旁站项目		
3	施工质量检查记录	1、监理检查记录表	
		2、	
		3、	
		4、	
		5、	
4	隐蔽工程质量验收	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5	
5	分部分项工程验收	1、	
		2、	
		3、	
		4	
		5	
6	其他	1、	
		2	
		3	
		4	

七、施工质量问题：

- 1、屋面光伏区中压块组装过程中缺少弹簧垫；
 - 2、个别施工人员未按照规定佩戴安全帽；
- 以上问题，现场要求立即整改。

八、安全文明施工

- 1、本周无安全隐患，机械、人员零事故。

九、沟通协调：无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

- 1、工程签证：无
- 2、其他：无



十一、天气统计表。

日期 天气	08月31 日	09月01 日	09月02 日	09月03 日	09月04 日	09月05 日	09月06 日
晴	✓					✓	✓
雨				✓			
阴							
多云		✓	✓		✓		
温湿度							

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议	份	1	6	
2	审批施工组织设计（方案）	份			
3	审核施工图纸	份			
4	发出监理通知	份		3	
5	审批分包单位	份			
6	原材料审批	份			
7	构配件审批	份			
8	设备审批	份			
9	分项（检验批）工程质量验收	份			
10	分部（子分部）工程质量验收	份			
11	不合格项验收	份			
12	监理抽查复试	份			
13	监理见证取样	份			
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备	份			




本周监理工作小结：

- 1、监理项目部坚持每天对大自然光伏区施工部位进行巡视检查。
- 2、监理人员对施工现场支架檩条安装情况进行现场巡查。
- 3、监理人员对施工现场屋面光伏区放线定位安装夹具进行检查，发现个别夹具存在安装不到位现象。
- 4、监理人员坚持每日记录施工现场情况（记录日志）以及监理检查记录表等。




一、形象进度影像

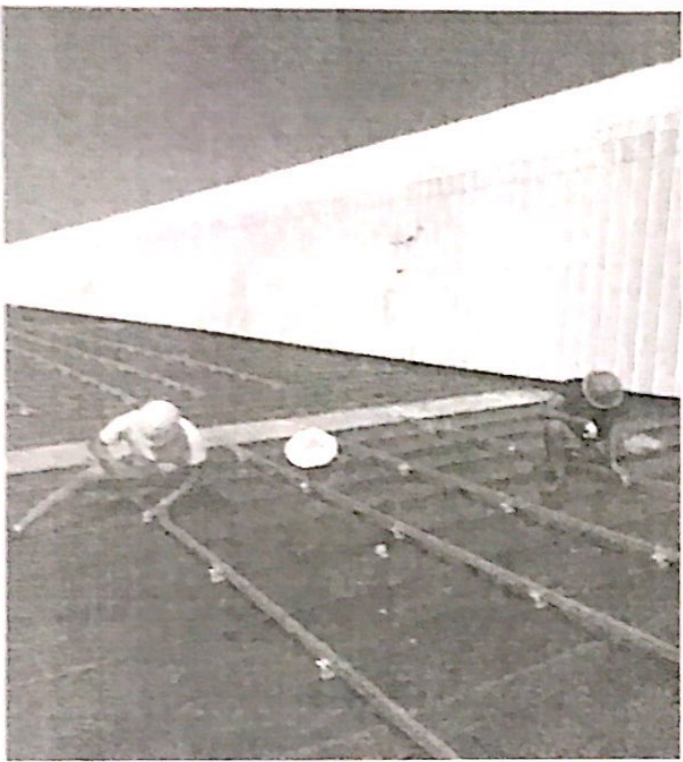文字描述	4#屋面光伏区支架檩条安装	4#屋面光伏区檩条连接片安装
图片		
文字描述	4#屋面光伏区放线定位安装夹具	4#屋面光伏区中压块组装
图片		
文字描述	1#屋面光伏区中压块组装	1#屋面光伏区中压块安装



图片

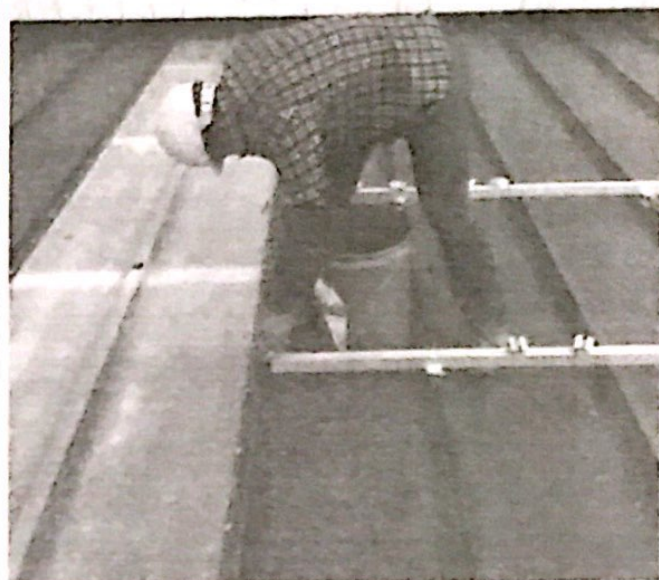

二、质量问题影像

文字描述		
图片		

三、质量问题检查影像

文字描述		
图片		

四、安全文明施工影像

文字描述		
图片		

五、其他施工事宜影像

文字描述	周监理例会	
图片		

