

监 理 周 报

项目名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺3.5856MW)

编号: GFDZJBM12-002

本周工作概况	1、本周(2018年10月20号-2018年10月26日), 完成了2个箱变基础的梁柱、圈梁、检修平台混凝土浇筑。 2、箱变箱变基础的梁柱、圈梁、检修平台支模(两个)。 3、D号楼面于10月24日开始测量放线、撒料、夹具檩条安装, 截止10月26日已完成安25%。 3、2018年10月21日监理项目部、业主项目部、施工项目部对施工现场进行了安全质量大检查, 并做安全质量检查记录。 4、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查, 并做记录(监理日志)。
施工质量情况	施工质量存在以下问题: 1)、施工过程中有个别施工人员戴安全帽帽带未系现象。 3)、箱变检修平台模板上沿不平整, 未按设计要求进行支模、浇筑。 4)、箱变梁柱钢筋未按图纸下料、剪裁, 存在偏低、偏短现象(局部)。 6)、D号楼面夹具、檩条安装个别螺栓缺少平垫、弹簧垫、螺帽以及螺栓紧固不到位, 存在松动现象。 7)、上楼爬梯安全警示标志悬挂不规范。 8)、已浇筑完成的箱变基础养护不到位。
材料	无



进场情况	
材料进场检验	无
隐蔽验收情况	无
发文情况	周监理会议纪要一份（编号：GFDZJBM09-002）。 安全质量检查记录一份（编号：GFDZJBM14-003）
收文情况	无。
安全情况	部分施工人员佩戴安全帽，监理巡视发现后，及时纠正并进行批评教育，本周无重大安全隐患。
下周工	1、监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1)、D号楼面夹具、檩条安装。 2)、箱变梁柱、圈梁以及检修平台支模。 2、总包方专职安全员要每天跟踪施工人员作业，确保施工现场人员、设备零事故。



作要点	3、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。							
现场施工 人员班组 情况	安装施工人员 12 人。							
天气	1	2	3	4	5	6	7	
	多云	晴	多云	阴	晴	多云	晴	

编写人：董琅军


编制时间：2018 年 10 月 27 日

附施工照片：





监理单位田同有检查箍筋间距

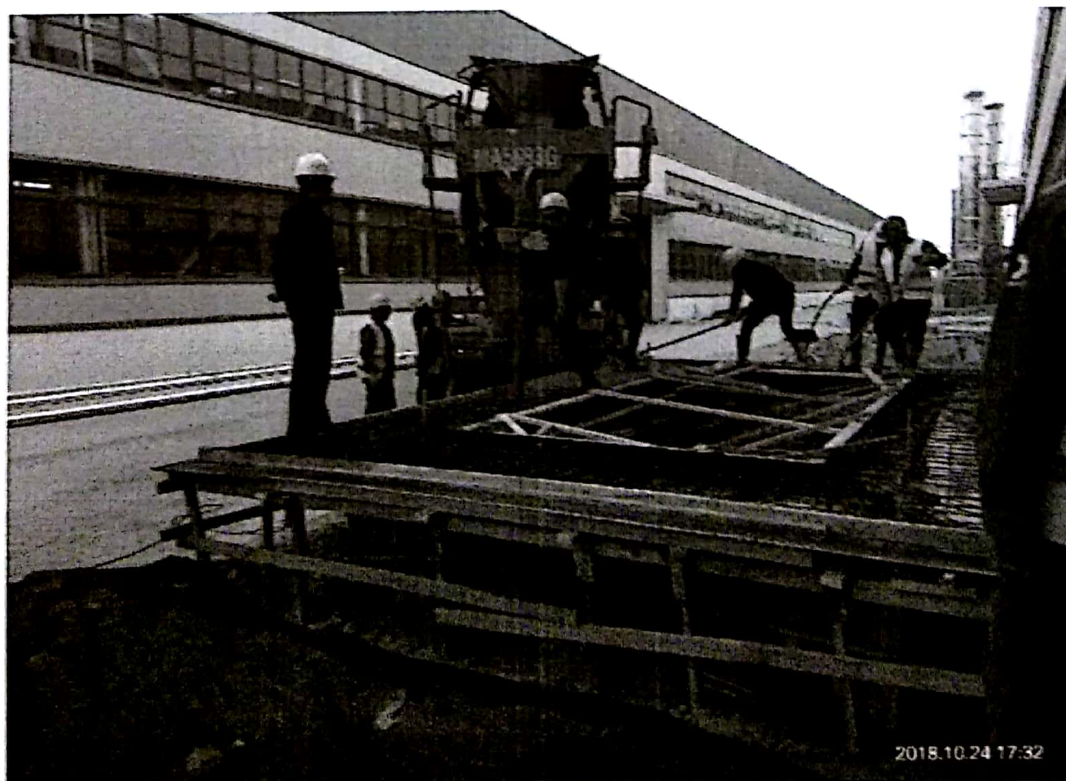


监理单位田同有旁站箱变浇筑





第二次监理例会

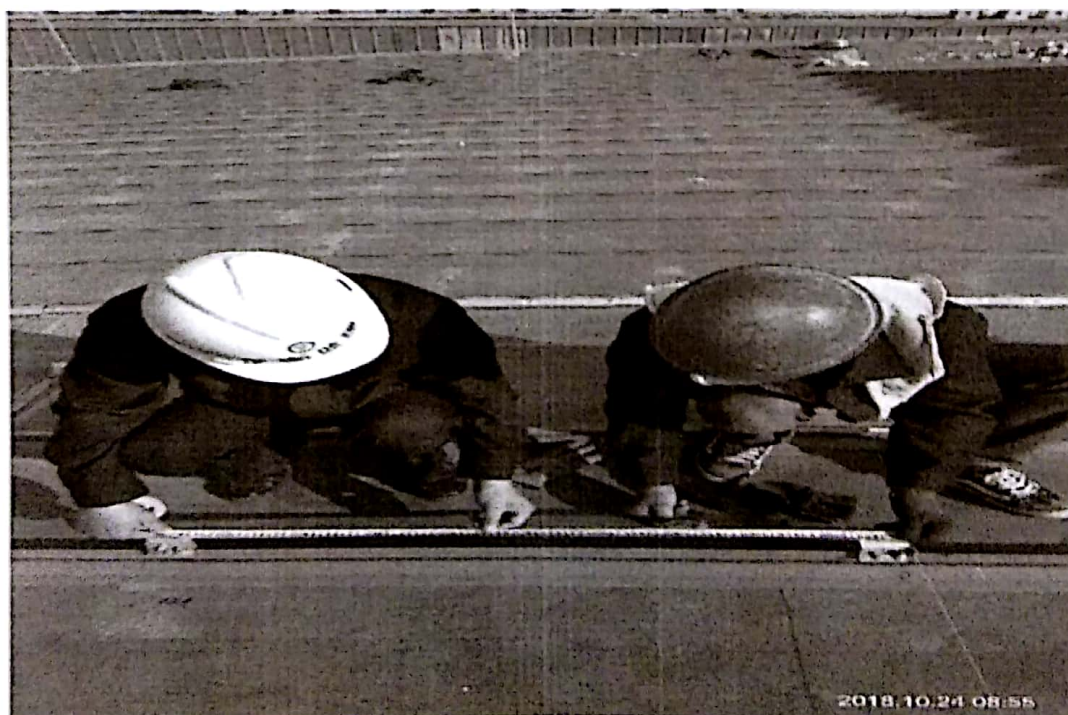

监理项目部田同有检查夹具安装

