

宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号

100MW 渔光互补项目周报

2018 年 10 月 22 日

2018 年 10 月 28 日

宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

监理部

2018 年 10 月 28 日



1、本周项目进展情况

1) 施工准备工作及手续办理

序号	项目手续	完成情况
1	建设用地规划许可证	办理中
2	建设项目用地预审	办理中
3	建设工程规划许可证	办理中
4	图纸审查意见	办理中
5	建筑工程施工许可证	办理中
6	消防设计审查	办理中
7	安全预评价报告评审意见	办理中
8	工程环评试生产意见	暂无
9	江苏省电力公司购售电合同	暂无
10	地方供电局并网调度协议	暂无
11	电力业务许可证	暂无
12	上网电价批复	暂无
13	省电力质监	暂无
14	一次二次电力公司验收	暂无
15	环评验收	暂无
16	工程质量验收	暂无
17	工程竣工验收	暂无
18	工程资料归档备案	暂无

2) 设计工作

1) 1、光伏区红线图、初步设计、试桩任务书、支架规划书已出, 现场总平面布置图、升压站布置图, 道路施工图纸已出, A 桩基图纸已出, B 桩基图纸已出, D-1 桩基图纸已出, C-4 桩基图纸已出。

3) 本周工程完成情况

1. A1、C4、D1 光伏区开始注水
2. 光伏区共打桩 1004 根
3. 淤泥换土完成 100%
4. 道路修筑完成 95%
5. 场地平整完成 90%
6. 升压站综合楼土方开挖、钢筋、模板制作安装、垫层浇筑、承台浇筑完成

4) 送出工程

此项工程由国家电网公司实施，不在工作范围范围内。

5) 主要设备到货情况

序号	名称/型号		总数量	当日到货	累计到货
1	组件	单晶 370W	209196 片	0 片	0 片
		叠瓦 400W	76120 片	0 片	0 片
2	支架	2*9 布置、26 列联动	447 套	0 套	0 套
		2*8 布置、26 列联动	195 套	0 套	0 套
3	逆变器	箱逆变一体机、35KV 干式箱变	50 台	0 台	0 台
4	主变压器		1 台	0 台	0 台
5	汇流箱	16 进 1	待定	0 台	0 台
		4 进 1	待定	0 台	0 台
6	开光柜		2 面	0 面	0 面
7	SVG 设备仓		1 台	0 台	0 台
8	变压器		1 台	0 台	0 台
9	隔离开关		1 件	0 件	0 件

6) 安全、文明生产情况

- 1、现场起吊作业未拉警戒线。
- 2、升压站临时用电电缆未做套管保护
- 3、钢筋加工机械接地不符合临时用电要求

7) 阶段验收

2018 年 12 月 31 日并网

8) 里程碑节点执行情况

里程碑节点名称	完成时间	备注
光伏阵列桩基	2018. 11. 20	

鱼塘改造	2018.11.30	
综合楼建筑结构工程	2018.11.07	
升压站场平及开挖地基处理	2018.10.06	
室外设备基础、事故油池、户外配电装置基础等	2018.11.20	
升压站调试、试验	2018.12.15	
首次并网发电	2018.12.20	
项目整体正式移交生产	2018.12.30	

2、下周工作计划：

- 1) A、B 标主道路加宽右侧清淤，主道路填土修筑，辅道清淤、A1 打桩
- 2) 各标段桩基基础开始打桩，桩基础施工完成 5000 根，支架立柱安装 1000 根
- 3) 综合楼基础浇筑完成 100%
- 4) ± 0 层现浇板浇筑完成 100%
- 5) 主变基础桩基开始打桩、土方开挖完成 100%
- 6) 一次预制舱、GIS 基础打桩完成 100%

3、存在问题及需要协调事宜


- 1) 升压站设备基础图出图过慢，需跟进
- 2) 光伏区桥架基础图出图过慢，需跟进

4、现场影像资料

	
D 标打桩	钢筋绑扎
	
钢筋加工	模板制作安装



B 标打桩

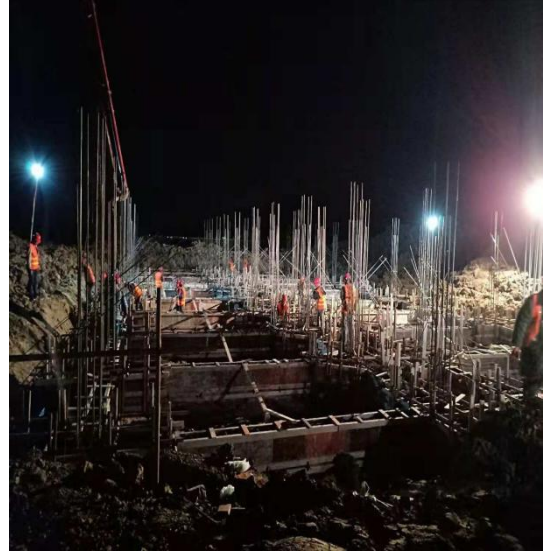

升压站承台浇筑
