

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2020 年 64 期

项目：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	填报周期：2020 年 9 月 12 日—2020 年 9 月 18 日
一、项目总体建设进度汇总： (1) . 风机吊装累计完成：42 台。 (2) . 塔筒内电气累计完成：38 台。 (3) . 35KV集电线路基础累计开挖 162 基，累计浇筑 162 基。 (4) . 35KV集电线路基础回填累计完成 162 基。 (5) . 35KV集电线路铁塔组塔累计完成 121 基。 (6) . 35KV集电线路铁塔立塔累计完成 121 基。 (7) . 35KV集电线路接地累计完成 162 基。 (8) . 箱变安装累计完成：42 台。 (9) . 导线展放累计完成：19km。 (10). 风机验收累计完成：17 台。 (11) . 风机设备到货：塔筒 44 套，机舱 46 套，轮毂 49 套，叶片 49 套,塔材 136 基。	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	无
2、升压站	无
3、综合楼/附属建筑	无
4、场内桩基施工	无
5、风机吊装及电气安装	1、650T作业面：F09#吊装完成，B05#650T组车完成； 2、GTK作业面：F14#吊装完成，B14#吊装至 1 段塔筒； 3、塔筒内电气：F11#；
6、箱变基础、箱变安装及沉降观测点施工	无
7、35KV 集电线路	1、组塔：CD21#. CD24#. CD25#. CD22#. CD28#. CD29#完成 6 基； 2、立塔：CD21#完成 1 基； 3、电缆沟开挖：B04#. K07#. K06#. K01#. Z01#. K02#. K03#. K03+1#，完成 8 台； 4、高压侧电缆敷设：B04#. K07#. K06#. K01#. Z01#. K02#. K03#. K03+1#，完成 8 台； 5、电缆沟铺砖：DT1-5#. DT1-12#. DT1-7#. DT3-1#. DT1-14#. DT1-16#. DT2#共计 6 基。 6、 、高压侧电缆敷设；F19#, F20#, F21#, F22#, F23#, F24#, F25#, K04#, B01#, B03#, F27#, Z03#, Z02#, F31#, F32#, F33#, F34#, F35#, F36#, F37#, F39#, F28#, F40#, B08#, 累计完成：24 台； 7、 、电缆支架：F21#； 8、南线路挂牌完成 100% 9、引下线安装：F19#.

8、送出工程（含对侧）		无		
9、现场调试		无		
10、出图情况		无		
11、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	塔筒			累计到货 44 套
	机舱			累计到货 46 套
	轮毂			累计到货 49 套
	叶片			累计到货 49 套
	塔材			累计到货 136 基
	电缆			累计到货 20 盘
	导线 JL/GIA-240/30			32.115 吨
12、人员/机械情况	本周施工人员 148 人、铲车 2 台，发电机 2 台，650T 履带吊车 1 台、75T 履带吊车 1 台，80T 汽吊车、220T 汽吊车 1 台、1100T 吊车 1 台、洒水车 1 台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2019.5.15		2019.5.15	
2、首套风机安装	2019..6.15		2019.11.10	风机平台及道路不具备吊装条件
3、线路倒送电	无			
4、首个发电单元并网	无			
5、全容量并网	无			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	总包方就风机安装分项工程垫已垫资 1400 多万，本月资金困难、无法周转、有可能出现两吊装作业面全部停工，需业主方尽快支付前费窝工费、机位、道路扩修复、设备二次倒运等全部费用；避免发生全线停工的恶性事件发生。			
未解决的协调问题解决进展	已协调解决			

五、下周计划主要工作内容	
1、道路工程	无
2、综合楼工程	无
3、升压站工程	无
4、风电场区域工程	风力发电机组吊装:1. B05#、B14#整机吊装完成, 650T转场至B07#吊装完成; G TK转场至费F16#吊装完成; 2. 低压侧接线: 4 台完成, 整机消缺验收完成 4 台;
5、风机基础及升压站沉降观测	无
6、35KV 集电线路	1、北线铁塔组立 6 基, 导线展放 10 基; 2、南线: 电缆支架完成。
7、其他	无

填报人: 赵文渠 审核人: 赵文渠 时间: 2020 年 9 月 18 日
 工程现场照片(含文字描述):





升压站电缆敷设到35kV配电室2020.9.14



协鑫潘总召开进度推进会2020.9.15




南线铁塔验收2020.9.14



铁塔螺栓少一个螺母2020.9.15



南线铁塔挂牌2020.9.16 (2)

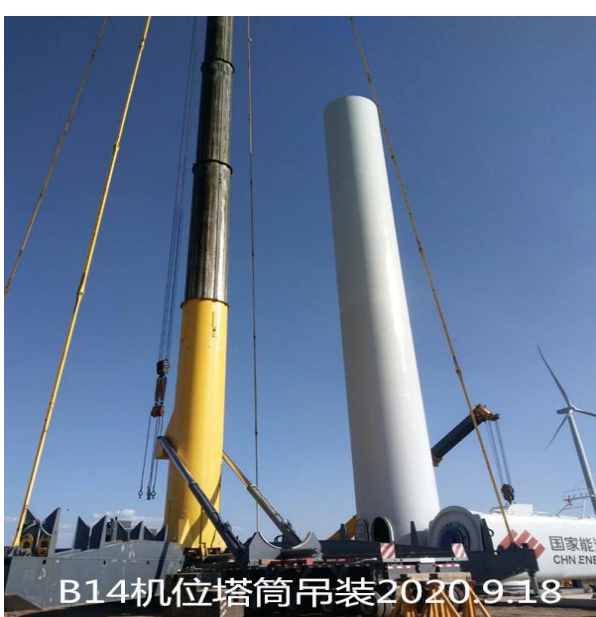

B14机位塔筒吊装2020.9.18
