

监 理 周 报

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

2019 年 03 月 第七期

总监理工程师: 刘 媛

监理项目部 (章)

报告日期: 2019 年 03 月 10 日

监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目，位于河北省沧州市黄骅市经济开发区河北光华荣昌汽车部件生产有限公司院内，利用厂区内的两个生产车间屋面，总装机容量 3.1MW。

本周组件板进场，安装单位进场开始施工。2#厂房屋面夹具安装完成约 1MWp。

厂房加固继续安装。

1、施工进度：

2#厂房屋面夹具安装完成 1.3MWp，檩条完成 1MWp。

2、设计图纸情况

图纸齐全。

3、工程资料情况

江苏中天资料未上报。

4、质量、安全情况

江苏中天科技现场安全文明管理不到位，又部分工人现场未带安全帽，监理发出监理通知单要求施工单位价钱对现场安全文明的管理力度和安全技术交底。

屋面采光带处防水施工工人现场吸烟，经现场指出后已改正。

夹具、檩条安装和厂房加固施工质量符合要求。

5 需协调事宜

无。

二、本周监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

厂房加固单位进场工人较少，已要求施工单位增加劳动力。

2 、工程质量控制方面的工作情况

巡视现场每天检查现场施工质量，有问题及时指出督促施工单位整改。

3、安全生产管理方面的工作情况。

每天检查安全文明情况，发出监理通知单一份。

4、工程计量与工程款支付方面的工作情况

无。

三、工程存在问题及建议

无。


四、下周监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

- 1、跟踪落实施工进度，重点督促加固单位的厂房加固工程；
- 2、严格控制施工质量，尤其是组件安装；
- 3、做好现场安全文明管理工作；
- 4、审核签署施工单位上报的资料；

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

完善监理过程的文件编写和保存；

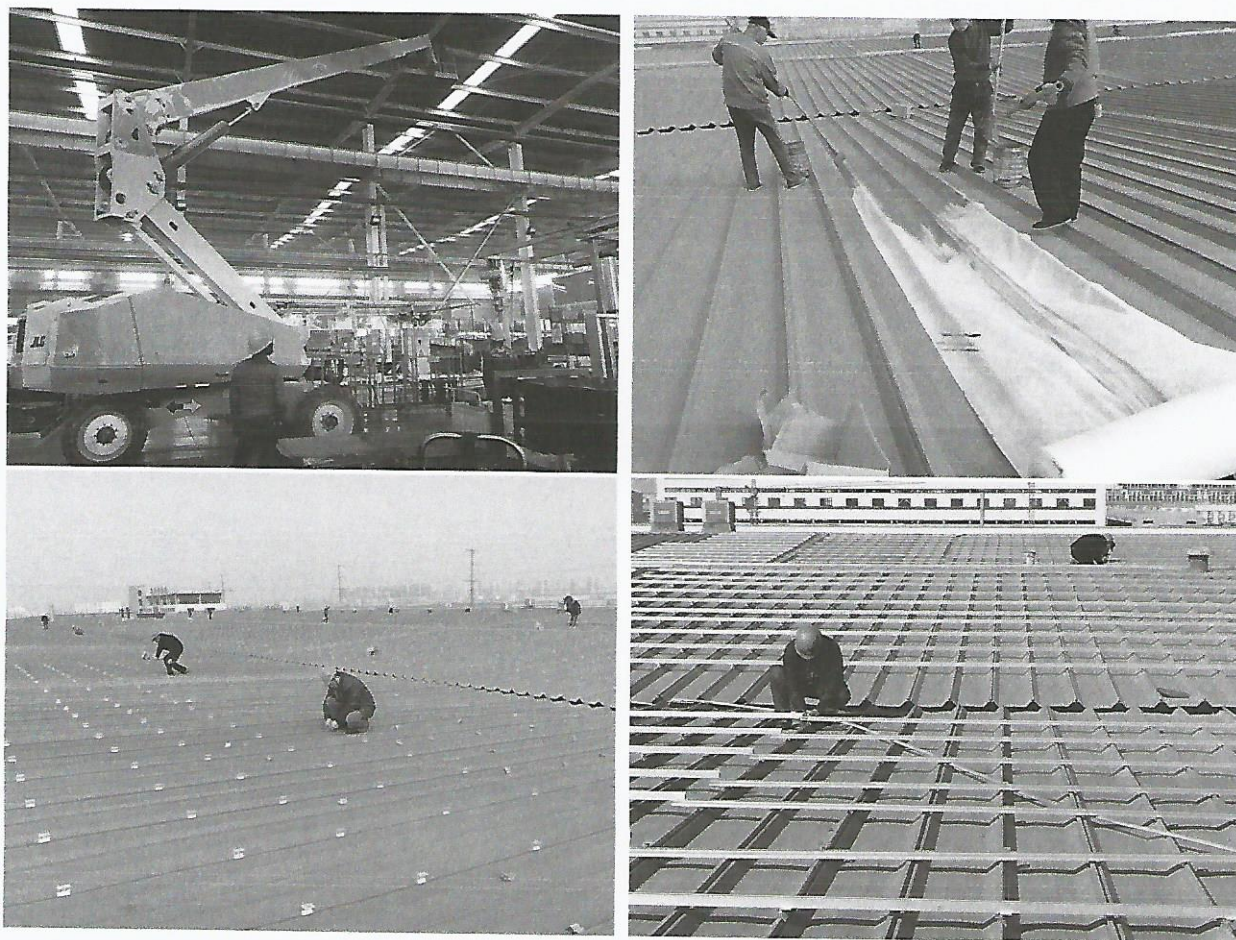

常州正衡电力工程监理有限公司

黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目监理部

2019 年 03 月 10 日

监理项目部
