

监 理 周 报

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

2019 年 04 月 第十一期

总监理工程师: 刘士发



报告日期: 2019 年 04 月 07 日

监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目，位于河北省沧州市黄骅市经济开发区河北光华荣昌汽车部件生产有限公司院内，利用厂区内的两个生产车间屋面，总装机容量 3.1MW。

1、施工进度：

屋面组件安装完成 0.4MWp，累计安装完成 3.1MWp。

1#厂房屋面桥架安装完成、接地扁铁焊接完成、检修到安装完成、汇流箱安装完成。

1#厂房二层柱加固北侧柱完成，南侧墙内柱加固完成 30%。

1#、2#厂房之间穿越桥架安装吊装完成。

2、设计图纸情况

图纸齐全。

3、工程资料情况

资料上报不及时。

4、质量、安全情况

现场安全文明主要存在以下问题：1、现场部分工人未带安全帽，2、1#屋面西南处堆放桥架等材料过于集中，形成加大的集中荷载，存在安全隐患。以上问题已发出监理现场指出后施工单位已当场整改完成，符合要求。

其他质量安全文明情况符合要求。

5 需协调事宜

无。

二、本周监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

本周加固单位新增厂房之间穿越桥架的支架安装工程，影响三天工期。

厂方由于环保需要，停工一天。

2 、工程质量控制方面的工作情况

巡视现场每天检查施工质量，有问题及时指出督促施工单位整改。

3、安全生产管理方面的工作情况。

每天检查安全文明情况，发现问题及时指出，督促整改。

组织建设、施工单位进行第三次工地例会，重点对安全方面提出要求。

4、工程计量与工程款支付方面的工作情况

审核确认加固单位关于厂房之间穿越桥架的支架工程申请。

三、工程存在问题及建议

无。



四、下周监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

- 1、跟踪落实施工进度，重点督促加固单位的厂房加固工程；
- 2、严格控制施工质量，尤其是接地扁铁焊接工艺和电缆敷设工程质量；
- 3、做好现场安全文明管理工作，尤其是涉及动火作业的安全文明工作；

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

完善监理过程的文件编写和保存；

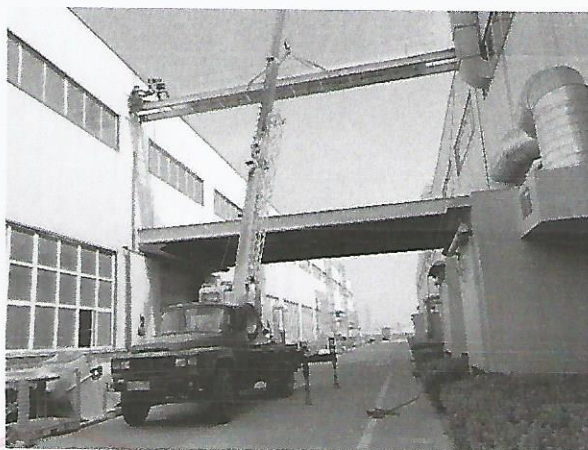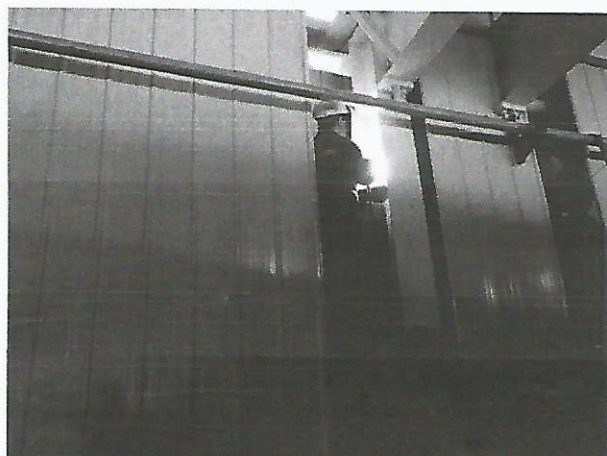

常州正衡电力工程监理有限公司

黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目监理部

2019年04月07日
