

监 理 周 报

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

2019 年 04 月 第十二期

总监理工程师: 刘士发



监理单位(章)

报告日期: 2019年04月14日

监 理 周 报

一、 本周工程实施情况

黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目，位于河北省沧州市黄骅市经济开发区河北光华荣昌汽车部件生产有限公司院内，利用厂区内的两个生产车间屋面，总装机容量 3.1MW。

1、施工进度：

1#、2#厂房之间穿越桥电缆敷设完成，光伏区至并网柜电缆敷设完成。

2#厂房屋面桥架安装完成、接地扁铁焊接完成 50%、汇流箱安装完成。

1#厂房屋面电缆敷设完成，接地网扁铁完成，屋面清洗系统管道安装材料就位。

二层柱加固北侧柱完成。南侧墙内柱加固完成 70%，累计完成 100%。

2、设计图纸情况

图纸齐全。

3、工程资料情况

资料上报不及时。

4、质量、安全情况

现场安全文明主要存在以下问题：1、现场部分工人未带安全帽，2、1#厂房二层立柱加固工作已完成，监理验收时发现二层柱加固部分 T 型梁的肋板处防锈防火涂料漏刷。以上问题监理已在现场当场指出，施工单位已整改，符合要求。

其他质量安全文明情况符合要求。

5 需协调事宜

无。

二、本周监理工作情况

1、工程进度控制方面的工作情况

无。

2 、工程质量控制方面的工作情况

巡视现场每天检查施工质量，有问题及时指出督促施工单位整改，验收加固单位二层南侧墙内立柱封闭前的防锈和防火涂料质量及北侧柱防锈和防火涂料质量，发现问题及时指出督促整改。

3、安全生产管理方面的工作情况。

每天检查安全文明情况，发现问题及时指出，督促整改。本周现场主要表现为现场施工人员个别未带安全帽。

4、工程计量与工程款支付方面的工作情况

与加固单位现场负责人成亦强现场确认 2#屋面北侧排风口改向，共 6 个，并向建设单位反映确认对其中四个进行整改。

三、工程存在问题及建议

无。


四、下周监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

- 1、并网柜、预制舱的吊装安全作业；
- 2、严格控制施工质量，尤其是接地扁铁焊接工艺和电缆敷设工程质量；
- 3、做好现场安全文明管理工作，尤其是涉及动火作业的安全文明工作；

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

完善监理过程的文件编写和保存；

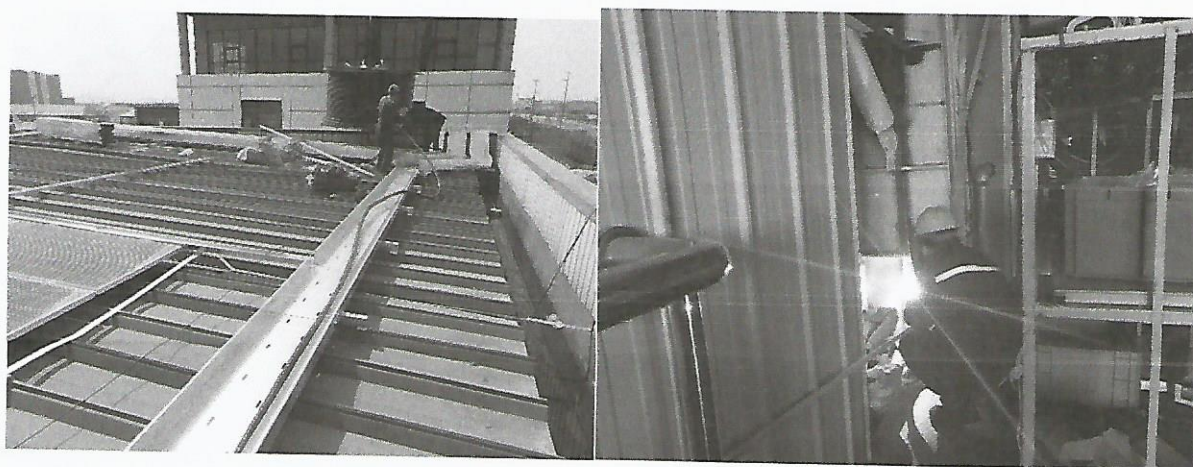

常州正衡电力工程监理有限公司

黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目监理部

2019 年 04 月 14 日
