

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 第一期

项目：华菱一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电		填报周期：1 月 18 日—1 月 23 日		
项目情况报告				
一、项目总体建设进度汇总：				
7#屋面导轨开始安装，，七号厂房屋面瓦楞锁边加固，T 型钢件加工制作，				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、7#屋面	瓦楞锁边加固，T 型钢件加工制作，			
2、7#屋面	导轨安装，组件安装			
3、1#屋面	未施工			
4、1#屋面	未施工			
10、出图情况	已出电子版施工图			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	光伏组件			
	光伏导轨	2019.1.18	2019.1.18	7#屋面已全部到现场
	接地扁铁			
11、人员/机械情况	施工人员 10 人			
二、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比及分析：				

项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、	无	无	无	
2、	无	无	无	
3、	无	无	无	
4、	无	无	无	
5、	无	无	无	
四、主要协调问题及解决情况：				
提出需要协调的问题	1、7#厂房室内加固掉焊渣事宜需与厂方协调； 2、1#厂房施工事宜需与厂方协调。			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、7#屋面	夹具，导轨，接地扁铁，防雷，4 m²电缆，组件安装。			
2、7#屋面	组件安装。			
3、1#屋面	未施工			
4、1#屋面	未施工			
6、	。			
7、				
7、其他				

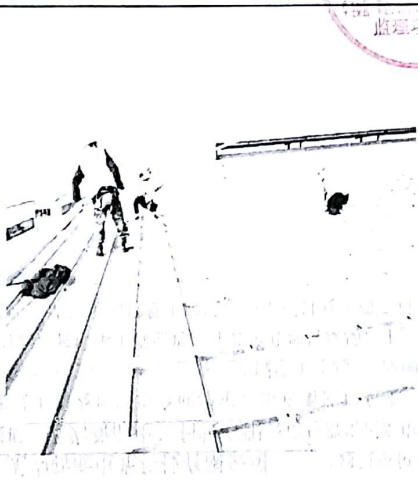
填报人：郭光禧 审核人：李元堂 时间：2019年1月23日



工程现场照片（含文字描述）：

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	导轨定位与安装		瓦楞边加固	
图片				
文字描述	导轨安装		焊接处设置灭火器	
图片				
文字描述	并网发电			
