

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 08 期


项目：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目			填报周期：2019.05.20-2019.05.26	
本周工作如下； 1、每日参加沙钢班前（7:15）班后（17:15）会议。 2.海力物流支架安装累计完成约 9.3MW。 3.宽厚板成品库支架安装完成累计 2.3MW。 4.热处理支架安装累计 1.96MW。 5.宽厚板成品库屋面除锈完成 7000 平方米。 6.热处理除锈累计完成 24500 平方米。 7、召开第八次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-008 上传至监理云。 8、巡视现场发现除锈、防腐问题并形成通知单-004 下发于施工单位并抄送至业主。 需协调与帮助： 暂无				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装		支架安装约 14MW		
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况		已督促施工单位尽快出具施工蓝图		
10、设备/材料到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
				支架及配套辅材到货 15MW

11、人员/机械情况	施工人员 79 人，现场管理人员 9 人,25T 吊车一辆，电动工具 50 把			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	6.30			
5、全容量并网	业主要求 6.30			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、施工方尽快提交前期报审资料及现场施工图； 2、施工方尽快确定地面设备基础位置；			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程				
7、其他				

填报人： 张良玉 审核人： 严卫忠 时间： 2019 年 05 月 26 日

现场照片（含文字描述）：


海力物流屋面施工情况（A1区）

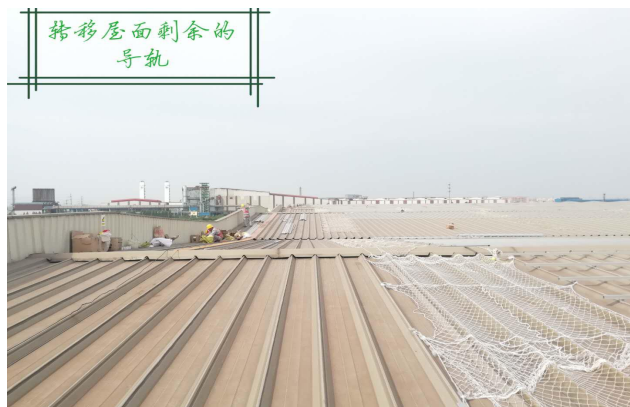

热处理屋面除锈作业（B2区）



检查宽厚板施工情况（B1区）

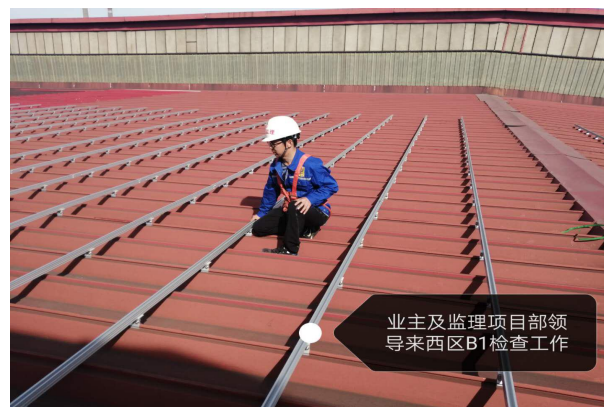

召开第八次监理例会



问题照片：螺栓未紧固到位及未除锈安装支架

