

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

-喜临门 2.8944MW 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 04 期

编 制 时 间：2019.03.29

监理单位编制人：任远威

监理单位审核人：李云

常州正衡电力工程监理有限公司

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目



由 扫描全能王 扫描创建

项目名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW 分布式光伏发电项目

建设单位：兰考县恒泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：江苏中天科技工程有限责任公司

一、工程概况：

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目建设项目位于河南省开封市兰考县。

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目，位于开封市兰考恒大家具联盟产业园内，占地面积 676120 m²，距开封市约 43.3km，总装机容量 17.2422MW，其中（喜临门 2.8944MW，占地面积 18489 m²，组件共 10720 块，汇流箱 35 台，箱变 3 个，一次舱 1 个，二次舱 1 个），电池组件为 270 多晶硅类型，固定式安装。

二、施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

1、本周喜临门项目光伏组件进场 2604 块。

2、因兰考县环保部门严查，当地混凝土泵站不允许出售混凝土。现场因材料未进场，相关工序无法开展施工，本周暂停施工。

3、本周施工现场无安全隐患。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基



础、电缆沟等)

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量 (%)
1	兰考恒大	设备基础			40%
2		电缆井砌体			80%
3					
4					
5					

2、安装工程 (支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电气安装等)

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量 (%)
1	兰考恒大				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	(进场材料、构配件、设备) 名称	进场时间 (年月日)	进场数量 (单位)	拟用部位
1	光伏组件	2019. 3. 25	2604 块	11#厂房屋面
2				



3				
4				
5				
6				
7				

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：李云、任远威

2、施工单位：

(1) 管理人员：蔡红兵

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	光伏组件	设备开箱检查记录表
		光伏支架	设备开箱检查记录表
2	监理旁站项目	无	
3	施工质量检查	1、现场巡视检查	监理检查记录表
		2、安全专项检查	监理检查记录表



	记录	3、	
		4、	
		5、	
4	隐蔽工 程质量 验收	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5	
5	分部分 项工程 验收	1、无	
		2、	
		3、	
		4	
		5	
6	其他	1	
		2	
		3	
		4	

七、施工质量问题：无

八、安全文明施工

1、本周无安全隐患，机械、人员零事故。

九、沟通协调：无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

1、工程签证：无

2、其他：

现在现场施工人员暂时离场，本周暂停施工。

十一、天气统计表。

日期 天气	03月23 日	03月24 日	03月25 日	03月26 日	03月27 日	03月28 日	03月29 日
晴							
雪							
阴							
多云	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
温湿度							



十二、监理工作统计表：

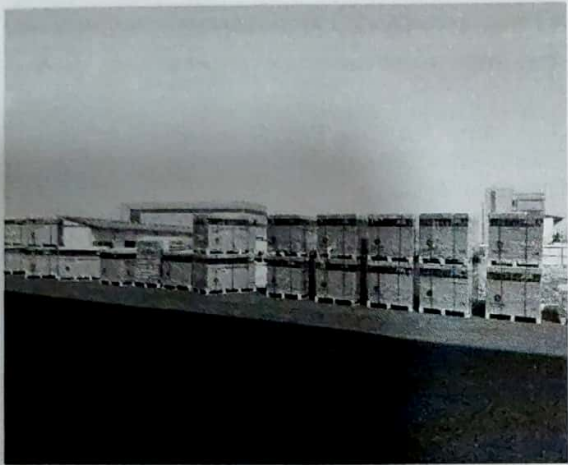
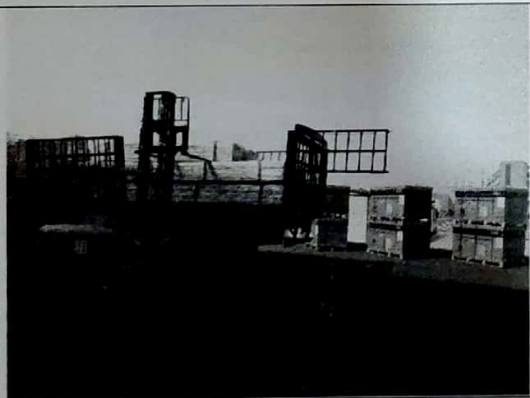
序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议	份	1	2	
2	审批施工组织设计（方案）	份			
3	审核施工图纸	份			
4	发出监理通知	份	1	1	
5	审批分包单位	份			
6	原材料审批	份			
7	构配件审批	份			
8	设备审批	份			
9	分项（检验批）工程质量验收	份			
10	分部（子分部）工程质量验收	份			
11	不合格项验收	份			
12	监理抽查复试	份			
13	监理见证取样	份			
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备	份			

本周监理工作小结：

- 1、监理项目部坚持每天对场区施工部位进行检查。
- 2、监理人员坚持每日记录施工现场情况（记录日志）以及监理检查记录表等。
- 3、监理项目部与建设单位一起对喜临门项目进行安全大检查工作。



一、形象进度影像

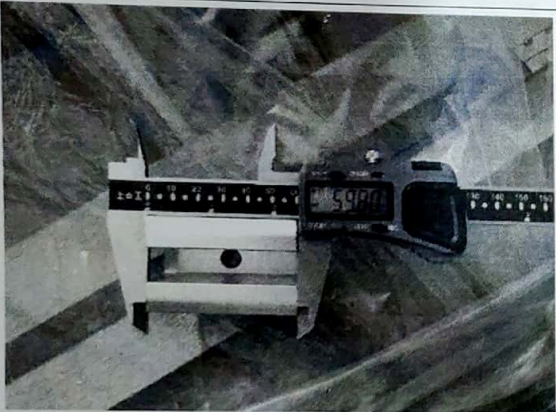
文字描述	喜临门项目光伏组件进场	光伏组件卸货中
图片		
文字描述	光伏支架卸货中	
图片		



二、质量问题影像

文字描述	现场施工人员未戴安全帽	登高作业人员未戴安全防护工具
图片		

三、质量问题检查影像

文字描述	检查中压块长度符合要求	检查夹具长度符合要求
图片		

四、安全文明施工影像

文字描述	检查光伏支架到场情况	
图片		



--	--	--

五、其他施工事宜影像

文字描述	光伏组件做到货检测-组件 EL 检测	
图片		

