

烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 3 期

编 制 时 间：2019.04.21

监理单位编制人：段光林

监理单位审核人：刘士发

常州正衡电力工程监理有限公司

烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

监理部

项目名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

建设单位：烟台市皓阳光伏有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：山东昱兴电力有限公司

一、工程概况：

本工程为烟台市皓阳光伏有限公司 2.7608MWp 分布式光伏发电项目，全部采用固定式发电系统，太阳能光伏组件选用 280WP 的多晶硅组件，每 20 块组件串联成一串后接入集中式逆变器把直流电转换成交流电，经变压器升压后经由用户侧 10KV 母线实现光伏并网发电。

二、施工概述：

本周施工人员一共 18 人，完成了设备基础平台浇筑完成 2 个，屋面导轨、夹具全部安装完成，北屋面组件安装完成 3/4。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1		设备基础	设备基础墙体砌筑		50%
2		设备平台浇筑	完成 50%	50%	80%
3					

2、安装工程

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1		导轨夹具安装	屋面全部安装完成	安装完成	100%
2		组件安装	北屋面 3/4	已安装完成	100%
3					
4					

3、进度情况分析：

施工人员少，以要求增加人员。

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	（进场材料、构配件、设备）名称	进场时间 （年月日）	进场数量 （单位）	拟用部位
1	电缆桥架	2019 年 4 月 15 日	全部到货	屋面
2	电缆	2019 年 04 月 18 日	全部到货	屋面
3	组件	2019 年 4 月 18-19 日	全部到货	屋面
4				

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：段光林

2、施工单位：

（1）管理人员：杨彭飞、赵富水

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	桥架	检查记录表
2	监理旁站项目	1、组件吊运	安全旁站
		2、	
		3、	
3	施工质量检查记录	1、	
		2、	
		3、	
4	隐蔽工程质量验收	1、钢筋绑扎	监理通知单
		2、	
		3、	
		4、	
		5	
5	分部分项工程	1、	
		2	

	验收	3	
6	其他	1	
		2	

七、施工质量问题

组件安装时部分压块没有安装到位，以要求现场整改。

八、安全文明施工

部分施工人员不能按要求佩戴安全帽，要求施工单位负责人对其进行教育，不行下次就让撤场。现场垃圾没有及时清理，要求施工方每天下班前必须清理干净。

九、沟通协调

要求施工单位加强现场的安全、质量管理。

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

无

十一、天气统计表。

日 期 天 气	15	16	17	18	19	13	14
晴	√	√	√	√	√		
雨							
阴						√	√
雾							
温湿度							

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议			1	
2	审批施工组织设计（方案）				
3	审核施工图纸			1	
4	发出监理通知			1	
5	审批分包单位				
6	原材料审批				

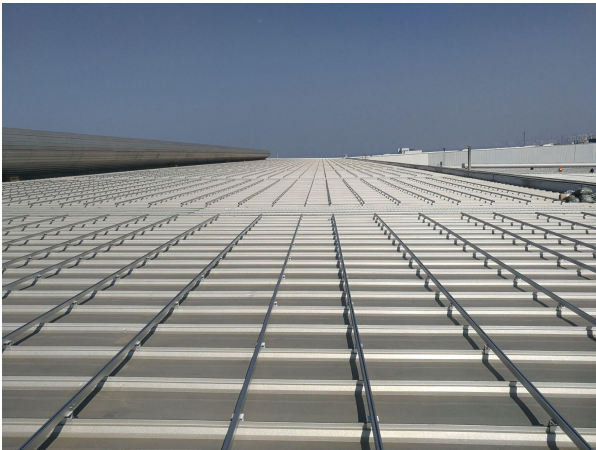
7	构配件审批				
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收				
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收			1	
12	监理抽查复试			1	
13	监理见证取样				
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				

十三、本周监理工作小结：

到施工现场查看安全文明施工情况及施工进度。对不符合规范要求的，责令及时整改到位。

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	北屋面导轨安装完成	设备平台浇筑
图片		

二、质量问题影像

文字描述	钢筋长度不够	
图片		

三、质量问检查影像

文字描述	桥架镀锌层抽检	
图片		

四、安全文明施工影像

文字描述	吊运组件	
图片		

五、其他施工事宜影像

文字描述	支模	
图片		
