

烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

监 理 周 报 ;

第 4 期

编 制 时 间: 2019.05.26

监理单位编制人: 杨振宇

监理单位审核人: 刘士发



常州正衡电力工程监理有限公司

烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

监理部

项目名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

建设单位：烟台市皓阳光伏有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：山东昱兴电力有限公司

一、工程概况：

本工程为烟台市皓阳光伏有限公司 2.7608MWp 分布式光伏发电项目，全部采用固定式发电系统，太阳能光伏组件选用 280WP 的多晶硅组件，每 20 块组件串联成一串后接入集中式逆变器把直流电转换成交流电，经变压器升压后经由用户侧 10KV 母线实现光伏并网发电。

二、施工概述：

本周施工人员一共 16 人，组件安装全部完成；电气设备接线调试完成；耐压试验完成；汇流箱出线电缆、高压电缆全部完成；桥架安装基本完成；防雷接地扁铁网基本完成，屋顶 4 平方直流电缆敷设基本完成，检修通道完成 50%

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量 (%)
1		设备基础	全部完成	已完成	100%
2		电缆沟开挖	全部完成	已完成	100%
3					

2、安装工程

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量 (%)
1		导轨夹具安装	屋面全部安装完成	安装完成	100%
2		组件安装	全部完成	安装完成	100%

3	桥架安装	全部完成	全部完成	100%
4	电气设备安装	全部完成	全部完成	100%

3、进度情况分析:

应业主要求与5月26日并网验收,施工进度基本吻合。

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	(进场材料、构配件、设备)名称	进场时间 (年月日)	进场数量 (单位)	拟用部位
1	电缆桥架	2019年4月15日	全部到货	屋面
2	电缆	2019年04月18日	全部到货	屋面
3	组件	2019年4月18-19日	全部到货	屋面
4	箱逆变器,一、二次柜	2019年5月8日-9日	全部到货	厂区内

五、现场人员配置情况

1、监理单位:常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员:杨振宇

2、施工单位:

(1) 管理人员:杨彭飞、赵富水

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收		
2	监理旁站项目		
3	施工质量检查记录	1、	
		2、	
		3、	
4	隐蔽工程质量验收	1、	
		2、	
		3、	

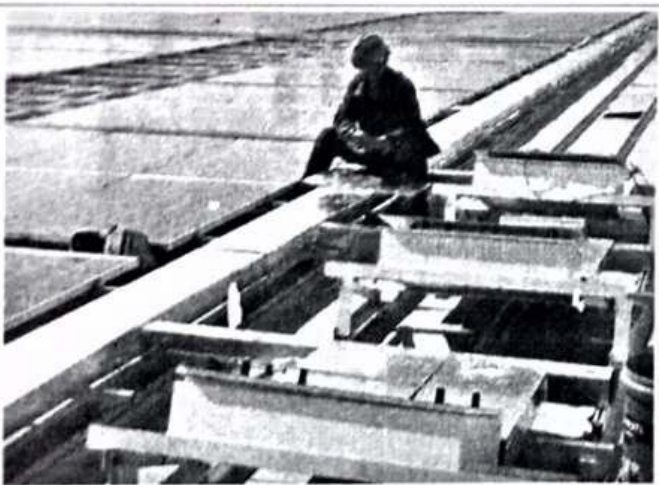
5	审批分包单位				
6	原材料审批				
7	构配件审批				
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收				
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收				
12	监理抽查复试				
13	监理见证取样				
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				

十三、本周监理工作小结：

到施工现场查看安全文明施工情况及施工进度。对不符合规范要求的，责令及时整改到位。

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	桥架封盖板	继电保护试验
图片		

二、质量问题影像

文字 描述		
图 片		

三、其他施工事宜影像

文字 描述		
图 片		
