

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 第 10 期

项目：太仓振辉一期 5MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2019 年 6 月 15 日—6 月 21 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、本周施工人员进场 26 人，叉车 1 台，吊车一台				
2、纺织一期加固完成，防腐涂料未做，后续都没有做				
3、本周组件到货 5760 块，安装完成 3360 块。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
施工工序	完成比例	完成容量 (本项目容量 5MW)		
1、支架混凝土配重块浇筑	100%	5MW		
2、夹具、支架进场	100%	5MW		
3、支架安装	85%	4.25MW	纺织一期未做	
4、接地扁铁连接	85%	4.25MW	组件安装的同时做接地	
5、桥架安装	80%	4MW		
6、直流电缆	90%	4.5MW		
7、钢梁加固	100%	5MW		
8.逆变器安装	100%	73 个		
9、并网柜安装	100%	11 个	目前 8 台未接铜牌，等待停电计划	
10、组件安装	31%	1.5MW	目前到货 5760 块	
11、汇流箱安装	71%	21	总 21，完成 15 个	
12、出图情况	80%			
,5、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	2019.4.17	2019.4.17	全部到货

	组件	2019.5.25		计划更改
	逆变	2019.5.18	2019.5.18	全部到货
	汇流箱	2019.5.15		全部到位
	直流电缆	2019.5.26	2019.05.09	全部到位
	电气设备	2019.5.20	2019.6.07	并网柜、汇流箱、逆变器全到
	电缆桥架	2019.05.02	2019.05.02	
6、人员/机械情况		施工人员 26 人，1 台伸臂车		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、 支架混凝土配重块浇筑	2019.4.12		2019.4.19	全部完成
2、夹具、支架进场	2019.4.17		2019.5.13	全部到货
3、支架安装	2019.4.17		2019.5.26	
4、预埋电缆管				
5、组件安装	2019.5.10		2019.6.13	组件到货滞后
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展		交流电缆未到货		

五、下周计划主要工作内容	
1、纺织一期防腐涂料	完成 100%
2、直流电缆	完成 100%
3、桥架安装	完成 90%
4、组件到货安装	完成 90%
5 接地扁铁完成	完成 90%
6、并网柜、逆变器、汇流箱 接线安装	完成 100%


填报人： 李金梁 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 6 月 21 日




振辉三期厂房 3#直流电缆组串安装
组件到货



振辉三期厂房 3#组件安装

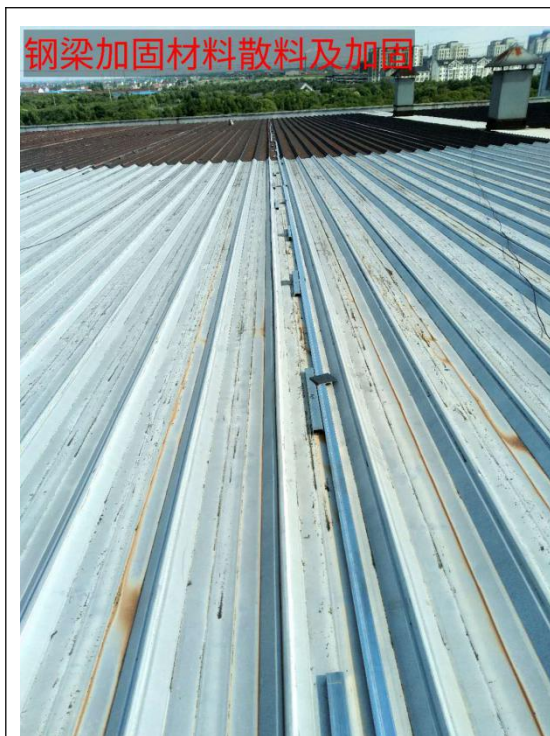

纺织一期钢梁加固材料散料

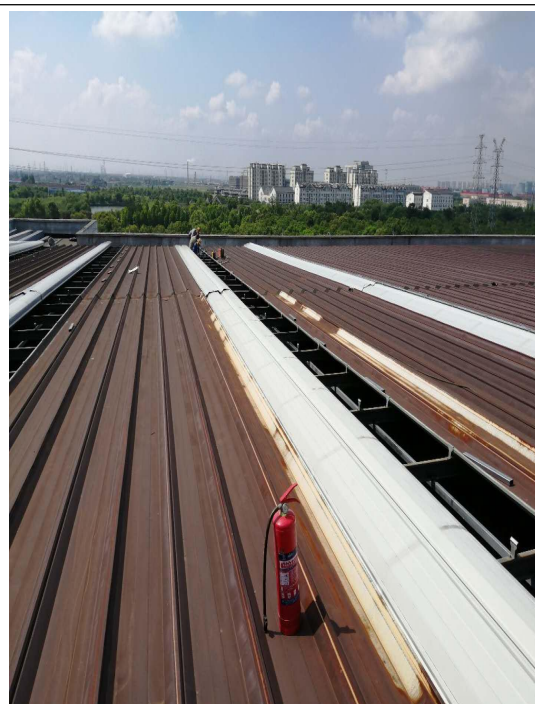

纺织一期钢梁加固
