

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 第 13 期

项目：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2019 年 6 月 8 日—6 月 14 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、本周人员进场 4 人。				
2 本周 3 号楼安装组件 800 块。				
3 本周光纤全部敷设完成。				
4 本周电缆头全部制作完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、人员进场		4 人		
2、支架混凝土配重块浇筑		100%		
3、夹具、支架进场		100%		
4、支架安装		100%		
5、桥架安装		1 号楼完成 100% 2 号楼 100% 3 号楼 100%		
6、逆变器安装		安装 26 台 共 26 台		
7、焊接扁铁		0%		
8、直流电缆		1 号楼 100% 2 号楼 100% 3 号楼 100%		
9、交流电缆		1 号楼 90% 2 号楼 100% 3 号楼 100%		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	2019.4.12	2019.4.12	到齐 100%
	组件	2019.5.10		到 1049 块。
	逆变	2019.4.12	2019.4.12	26 台 100%
	电 缆	2019.4.10 2019.4.18	2019.4.10 2019.4.18	直流电缆 30600 米 100% 交流电缆 3760 米 100%
	电气设			未到货

	备			
11、人员/机械情况	4 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、支架混凝土配重块浇筑	2019.4.12		2019.4.12	
2、夹具、支架进场	2019.4.12		2019.4.12	
3、支架安装	2019.4.13		2019.4.30	
4、桥架安装	2019.5.1		2019.5.17	
5、出图情况	2019.3.23			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	组件进场时间不确定			
未解决的协调问题解决进展	组件不合格率为 7%，大于施工规范要求的 5%，组件退货，重新发货。			
五、下周计划主要工作内容				
1、组件安装	6 月份进场安装			
2、并网柜安装	安装完成			
3、光伏电缆敷设	敷设完成			

填报人： 李连明 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 6 月 14 日

3 号楼安装桥架盖板



3 号楼安装组件




敷设光纤



3 号楼搬运组件未戴安全帽



违规搬运，一人搬运组件

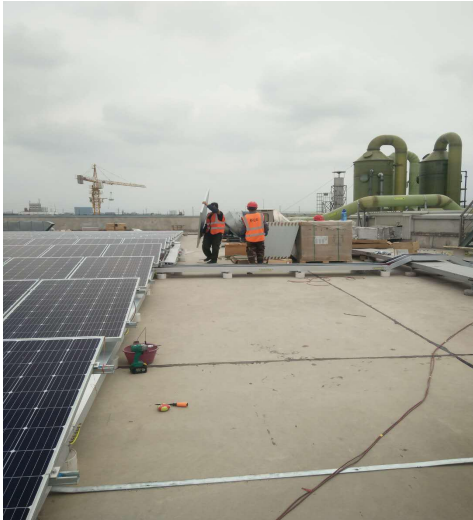

制作 MC4 接头

