

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019年 第6期

项目：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2019年4月20日—4月26日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、本周人员进场 7 人				
2、本周 1 号楼支架安装全部完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、人员进场	7 人			
2、支架混凝土配重块浇筑	100%			
3、夹具、支架进场	100%			
4、支架安装	100%			
5、预埋电缆管	0%			
6、箱变基础施工	0%			
7、电缆沟、箱变基础开挖	0%			
8、车棚钢架施工	0%			
9、出图情况	100%			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施
	支架	2019.4.12	2019.4.12	到齐 100%
	组件			未到货
	逆变	2019.4.12	2019.4.12	26 台 100%
	电缆	2019.4.10	2019.4.10	直流电缆 30600 米 100%
		2019.4.18	2019.4.18	交流电缆 3760 米 100%
电气设			未到货	

	备			
11、人员/机械情况	17人 搅拌机一台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、支架混凝土配重块浇筑	2019.4.12		2019.4.12	
2、夹具、支架进场	2019.4.12		2019.4.12	
3、支架安装	2019.4.13		2019.4.30	
4、预埋电缆管				
5、出图情况	2019.3.23			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1号楼支架安装个别不整齐，极个别支架底座缺少弹垫。			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、组件安装	5月10日之间进场安装			
2、桥架安装	5月1日安装			
3、光伏电缆敷设	5月6日敷设			

填报人： 李连明 审核人： 徐耀生 时间： 2019年4月26日

3 号楼支架安装




2 号楼水泥基础修复抹平




分散螺栓，弹垫



安装立柱支架

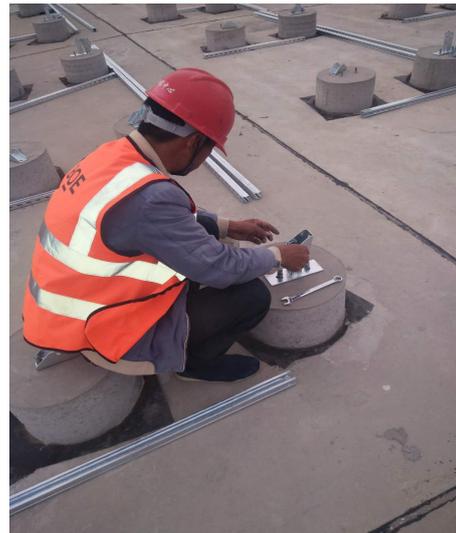

检测支架水平度数

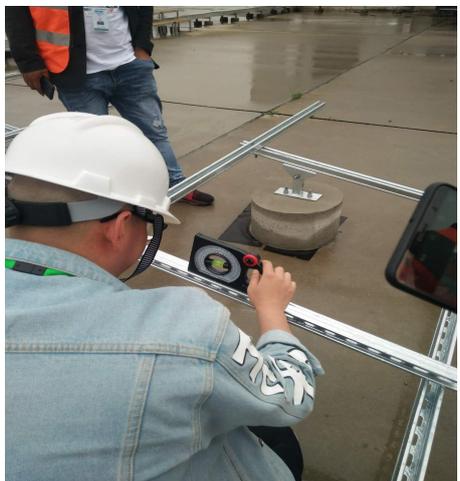

检测横梁镀锌层厚度

