

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报


2019 年 第 7 期

|                          |                                  |                              |                        |                                             |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 项目：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 |                                  | 填报周期：2019 年 4 月 27 日—5 月 3 日 |                        |                                             |
| 一、项目总体建设进度汇总：            |                                  |                              |                        |                                             |
| 1、本周人员进场 7 人。            |                                  |                              |                        |                                             |
| 2、本周 3 号楼支架安装全部完成。       |                                  |                              |                        |                                             |
| 3 本周 2 号楼支架安装完成。         |                                  |                              |                        |                                             |
| 4 本周 1 号楼桥架安装完成 80%。     |                                  |                              |                        |                                             |
| 5 本周逆变器安装 10 台。          |                                  |                              |                        |                                             |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况        |                                  |                              |                        |                                             |
| 1、人员进场                   | 7 人                              |                              |                        |                                             |
| 2、支架混凝土配重块浇筑             | 100%                             |                              |                        |                                             |
| 3、夹具、支架进场                | 100%                             |                              |                        |                                             |
| 4、支架安装                   | 100%                             |                              |                        |                                             |
| 5、桥架安装                   | 1 号楼完成 80%    2 号楼 0%    3 号楼 0% |                              |                        |                                             |
| 6、逆变器安装                  | 安装 10 台    共 26 台                |                              |                        |                                             |
| 7、焊接扁铁                   | 0%                               |                              |                        |                                             |
| 8、电缆敷设                   | 0%                               |                              |                        |                                             |
| 9、出图情况                   | 100%                             |                              |                        |                                             |
| 10、设备到货情况                | 系统名称                             | 计划到货日期                       | 实际到货日期                 | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施             |
|                          | 支架                               | 2019.4.12                    | 2019.4.12              | 到齐    100%                                  |
|                          | 组件                               |                              |                        | 未到货                                         |
|                          | 逆变                               | 2019.4.12                    | 2019.4.12              | 26 台    100%                                |
|                          | 电缆                               | 2019.4.10<br>2019.4.18       | 2019.4.10<br>2019.4.18 | 直流电缆 30600 米    100%<br>交流电缆 3760 米    100% |
|                          | 电气                               |                              |                        | 未到货                                         |

|                                |                            |      |               |               |
|--------------------------------|----------------------------|------|---------------|---------------|
|                                | 设<br>备                     |      |               |               |
| 11、人员/机械情况                     | 7 人                        |      |               |               |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |                            |      |               |               |
| 项目主节点                          | 计划<br>日期                   | 调整日期 | 完成日期          | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、 支架混凝土配重<br>块浇筑              | 2019.<br>4.12              |      | 2019.<br>4.12 |               |
| 2、夹具、支架进场                      | 2019.<br>4.12              |      | 2019.4.<br>12 |               |
| 3、支架安装                         | 2019.<br>4.13              |      | 2019.4.<br>30 |               |
| 4、桥架安装                         | 2019.<br>5.1               |      |               |               |
| 5、出图情况                         | 2019.<br>3.23              |      |               |               |
| 四、主要协调问题及解决情况                  |                            |      |               |               |
| 提出需要协调<br>的问题                  | 1 号楼支架安装个别不整齐，极个别支架底座缺少弹垫。 |      |               |               |
| 未解决的协调<br>问题解决进展               |                            |      |               |               |
| 五、下周计划主要工作内容                   |                            |      |               |               |
| 1、组件安装                         | 5 月 10 日之间进场安装             |      |               |               |
| 2、桥架安装                         | 5 月 8 日安装完成                |      |               |               |
| 3、光伏电缆敷<br>设                   | 5 月 6 日敷设                  |      |               |               |

填报人： 李连明 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 5 月 3 日


1 号楼支架安装

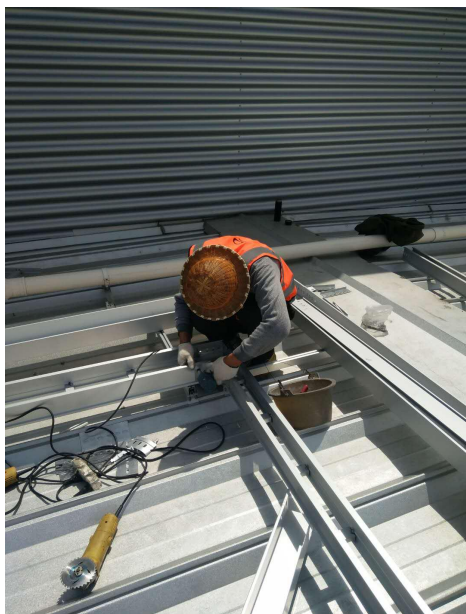

3 号楼安装逆变器




3 号楼调整斜梁位置

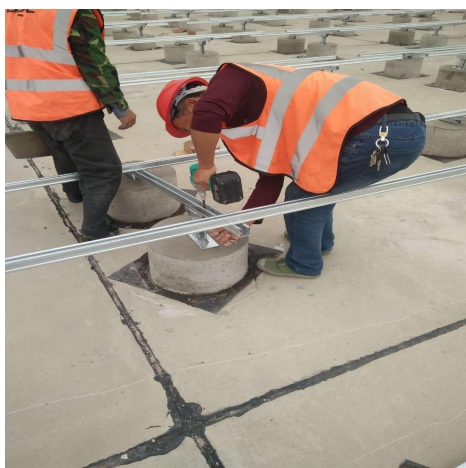

3 号楼支架安装完成



制作桥架预置石块

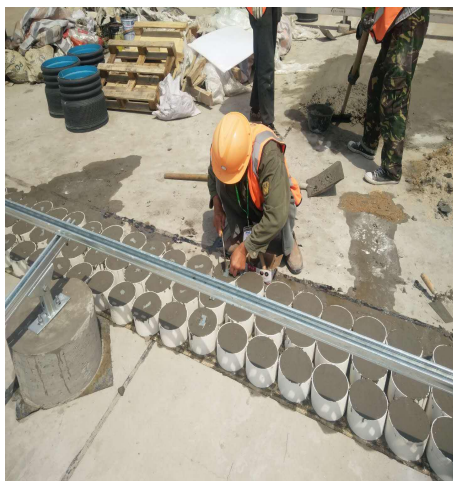

制作桥架预置石块模具

