

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 第 6 期

项目名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶2.97MW 分布式光伏发电项目			填报周期：2019 年 8 月 26 日—8 月 30 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
1、2#厂房加固完成。				
2、1#厂房屋面组件完成约 0.3MW。				
3、2#厂房屋面组件开始安装，完成约 0.7MW。				
4、3#厂房屋面夹具支架安装全部完成，组件完成 0.35MW。				
5、3#厂房加固完成 15%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、				
2、出图情况		已出图。		
9、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	20190727~0801	20190809	已到货 100%
	组件	20190724-0727	20190726	已到货 100%
	桥架	20190820~0824	20190826	已到货 100%
	逆变	20190814~0817	20190807	已到货 100%
	汇流箱	20190828~0831		未到货（订购合同已签，排产中）
	电缆	20190817~0823		未到货
	电气设备	20190911~0914		未到货
10、人员/机械情况		施工人员 32 人，登高曲臂车 3 台，汽车吊、叉车个 1 台。		

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、夹具、支架进场	20190801	20190808	20190809	已全部进场
2、加固材料进场	20190730	/	20190806	已全部进场
3、屋面临边围栏	20190802	20190809	/.	1#、2#完成，3#未完成
4、屋顶放线	20190801	20190807	20190808	/
5、1#厂房加固	20190811	/	20190816	加固开始晚、人员少，已完成
6、2#厂房加固	20190906	20190826	20190826	已完成
7、3#厂房加固		20190906	/	设计与现场不符，技术方案已取得
8、逆变器采购到场	20190817	/	20190807	提前到场，未延误。
9、1#屋面支架、夹具安装完成	20190811	/	20190820	人员不足， 8 月 20 日已完成
10、2#屋面支架、夹具安装完成	20190819	/	20190826	进场晚，已完成
11、3#屋面支架、夹具安装完成	20190826	/	20190826	已完成
12、1#屋面组件安装完成	20190828	/	/	8 月 23 日已开始安装
13、2#屋面组件安装完成	20190905	20190905	/	预计 8 月 31 日完成
14、3#屋面组件安装完成	20190913	20190905	/	预计 9 月 1 日完成
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题		1、厂房内生产繁忙，与加固作业冲突较大，智能晚上加班，与厂房沟通量大。		
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、1#厂房屋面组件安装		完成		

2、2#厂房屋面组件安装	完成
3、3#厂房屋面组件安装	完成

填报人： 常青 审核人： 徐耀生 时间： 2019年08月30日



桥架安装




组件安装



组件吊装



总监巡视

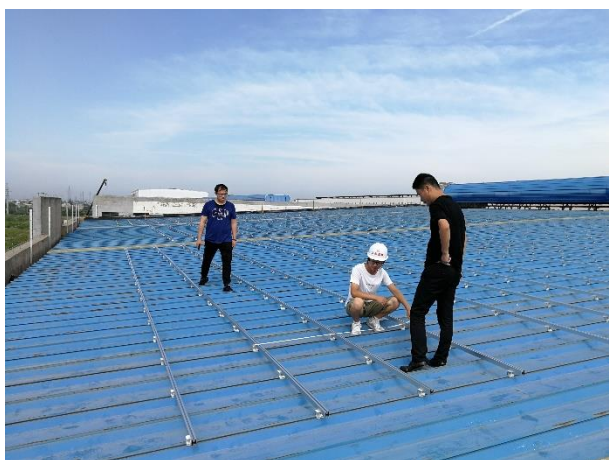

2#、3#屋面支架验收



桥架进场检验
