

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 第 9 期


项目名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶2.97MW 分布式光伏发电项目			填报周期：2019 年 9 月 15 日—9 月 21 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
1、2#厂房屋面直流电缆完成 80%。				
2、3#厂房屋面直流电缆完成。				
3、接地扁铁吊装散料完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、		/		
2、出图情况		已出图。		
9、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	20190727~0801	20190809	已到货
	组件	20190724-0727	20190726	已到货
	桥架	20190820~0824	20190826	已到货
	接地	/	/	已到货
	逆变	20190814~0817	20190807	已到货
	汇流箱	20190828~0831	20190910	未到货
	电缆	20190817~0823	20190906-0915	20190907 直流电缆进场
	电气设	20190911~0914	20190913	未到货

	备			
10、人员/机械情况	施工人员 11 人，登高曲臂车 2 台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、夹具、支架进场	20190801	20190808	20190809	已全部进场
2、加固材料进场	20190730	/	20190806	已全部进场
3、屋面临边围栏	20190802	20190809	/.	已完成
4、1#厂房加固	20190811	/	20190816	已完成
5、2#厂房加固	20190906	20190826	20190826	已完成
6、3#厂房加固		20190906	/	已完成
7、1#屋面支架、夹具安装完成	20190811	/	20190820	人员不足， 8 月 20 日已完成
8、2#屋面支架、夹具安装完成	20190819	/	20190826	进场晚，已完成
9、3#屋面支架、夹具安装完成	20190826	/	20190826	已完成
10、1#屋面组件安装完成	20190828	20190905	20190908	已完成
11、2#屋面组件安装完成	20190905	20190905	20190906	已完成
12、3#屋面组件安装完成	20190913	20190905	20190908	已完成
13、逆变器安装	20190913	/	20190909	已完成
14、直流电缆	20190919	20190915	/	3#完成
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题		无		
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				

1、接地安装	完成
2、汇流箱安装	完成
3、并网柜进场	完成

填报人： 常青 审核人： 徐耀生 时间： 2019年09月21日


工程图片：

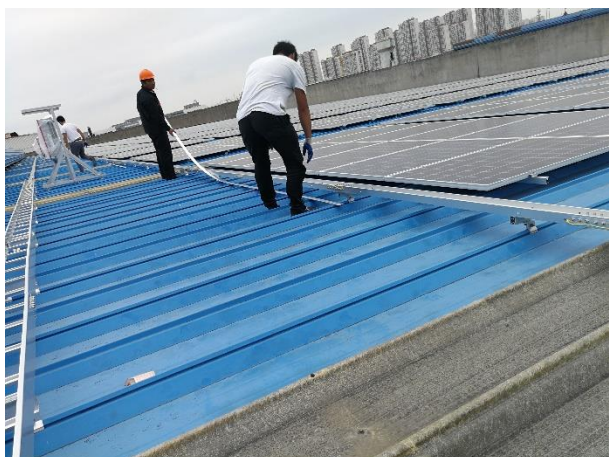

接地扁铁散料



电缆安装

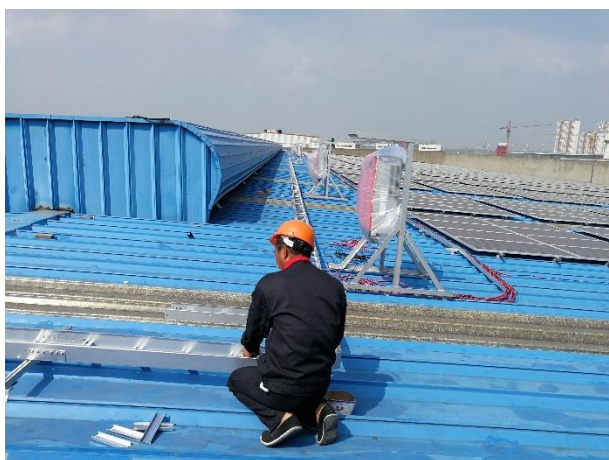

桥架安装



厂房加固预验收
