

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 第 08 期

2019年 第08期

项目：鑫和阳常州光 阳摩托 6MW 分布式 光伏发电项目	填报周期：2019年08月24日—08月30日			
一、项目总体建设进度汇总：				
1、CK 压焊车间加固工作完成 100%				
2、CKH 机加车间光伏工作完成 50%				
3、CKK 仓库车间光伏工作完成 51%				
4、CKK 组装车间光伏工作完成 51%				
5、CK 压焊车间光伏工作完成 53%				
6、CK 零件车间光伏工作完成 52%				
7、CK 散件中心车间光伏工作完成 49%				
8、CK 组装车间光伏工作完成 45%				
9、CK 整车车间光伏工作完成 45%				
10、2#研测车间光伏工作完成 15%				
11、光阳车棚光伏工作完成 30%				
12、光星光伏工作完成 40%				
二、项目总体建设进度计划：				
(1) 7月20日~9月30日支架安装；				
(2) 8月15日~9月15日组件安装；				
(3) 8月30日~9月20日检修通道施工；				
(4) 9月10日~9月20日视频监控安装施工；				
(5) 8月25日~10月05日电气安装；				
(6) 10月06日~10月12日电气试验调试；				
(7) 10月13日~10月20日项目并网验收。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、人员进场	25人			
2、支架混凝土配重块浇筑	基本完成			
3、夹具、支架进场	组件到货十箱安装车棚			
4、支架安装	已完成工作量的 100%			
5、预埋电缆管	100%			
6、箱变基础施工	无			
7、电缆沟、箱变基础开挖	90%			
8、车棚钢架施工	车棚安装组件			
9、出图情况	部分图纸			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况： 累计到货（）， 已到货数量（）%， 延误原因及催



扫描全能王 创建

				货措施
	支架	7月17日		
	组件	8月15日		
	逆变	8月10日	7月30日	100%
	汇流箱	8月20日	8月20日	
	电缆	8月20日	8月15日	
	电气设备	8月25日		
11、人员/机械情况	现场施工人员 25 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度对比及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施(简述)
1、支架混凝土配重块浇筑				
2、夹具、支架进场	7月17日		8月25日	
3、支架安装	7月30日		8月22日	
4、组件安装	8月15日	9月10日		组件未进场,增加施工人员
5、出图情况				满足施工要求
四、主要协调问题及解决情况: 满足现场施工要求				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、汇流箱出线电缆敷设完成 2、并网柜出线敷设完成 3、直流电缆敷设开始 4、完善桥架安装				

填报人: 杨振宇 审核人: 徐耀生 时间: 2019年08月30日

项目监理周报影像文件

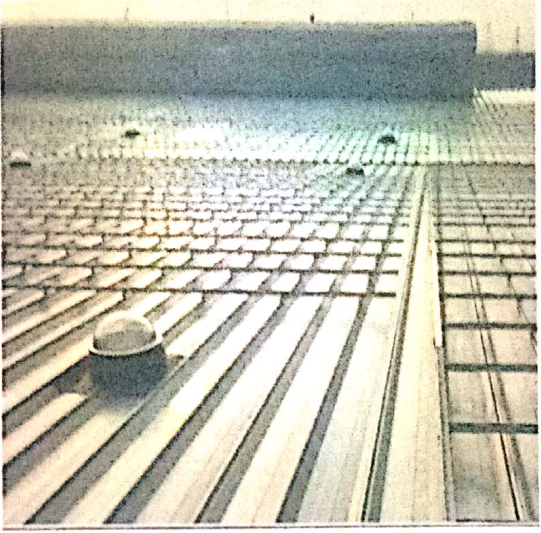
一、形象进度影像

文字描述	185 电缆敷设	并网柜就位 20190827
图片		



扫描全能王 创建

二、质量问题影像

文字描述	压块螺栓紧固不到位	滑轨安装偏斜
图片		

三、安全文明施工影像

文字描述		
图片		

