

赫章县大山坪风电场项目监理周报

2020 年 04 期

项目：赫章县大山坪风电场项目		填报周期：2020 年 04 月 21 日—04 月 27 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、升压站土建部分：（1）、路边垫石子完成。（2）、东北侧排水沟抹灰完成。（3）、升压站消防室砌筑完成 40%。（4）、生活楼外墙真石喷涂完成 45%。（5）、主变鹅卵石铺设完成。（6）、伸缩门洞砌筑完成 20%。 2、风机位部分：（1）、17#风机基础钢筋绑扎完成，模板安装完成。（2）、10#风机基础开挖完成。（3）、18#风机基础刷漆完成、回填完成。（4）、1#风机基础平台放线完成、1#主路放线完成、1#支路放线完成。（5）、2#风机支路放线完成。 3、电气部分：（1）、主变端子箱安装完成、接线完成。（2）、电缆沟内铜排等电位完成。（3）、接地变电站用变接地完成。（4）、升压站接地刷漆完成 30%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	（1）、升压站站内路边铺石子完成。（2）、进站道路边坡绿化完成 60%..			
2、升压站土建工程	（1）、升压站东北侧排水沟、抹灰完成。（2）、升压站主变鹅卵石铺设完成。（3）、升压站伸缩门洞砌筑完成 20%。			
3、升压站附属建筑	（1）、生活楼外墙真石喷涂完成 45%。（2）、消防小室砌筑完成 40%。			
4、风机位工程	（1）、17#风机基础钢筋绑扎完成，模板安装完成。（2）、18#风机基础刷漆完成、土方回填完成。（3）、10#风机基础开挖完成。（4）、1#风机平台放线完成、1#主路放线完成、支路放线完成。（5）、2#风机支路放线完成。			
5、升压站电气工程	（1）、主变端子箱安装完成、接线完成。（2）、电缆沟铜排等电位完成。（3）、接地变电站用变接地完成。（4）、升压站接地刷漆完成 30%。			
6、送出工程	（1）、G23---G36 铁塔导线、地线、光纤展放工作完成。（2）、G23---G36 铁塔附件安装工作完成。（3）、G18---G23 铁塔导线展放工作完成 60%、（4）、G18---G23 地线展放工作完成。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、风机基础工程	无	无	无	
2、风机基础垫层浇筑工程	无	无	无	



3、风机基础环 安装工程	无	无	无	
4、风机基础钢 筋绑扎工程 (17#)	无	无	020.04.24	
5、风机基础模 板支护工程 (17#)	2020.04. 25	无	2020.04.2 6	
6、风机基础预 埋件工程 (17#)	2020.04. 26	无	2020.04.2 7	
7、风机基础混 凝土浇筑工程	无	无	无	
8、风机基础土 方回填工程 (18#)	2020.04. 24	无	2020.04.2 5	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调 的问题	G1-G4 塔位在文物保护区内，需要手续办理完成后方可施工。			
未解决的协调 问题解决进展	已组织贵州省文物考古研究所及文保中心专家现场考察，待出具相应 报告后协调毕节市土地预审专家进行评估，再开展相应工作。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	风场 2# 主路局部换填。			
2、生活楼工程	(1)、生活楼外墙真石喷涂完成。			
3、升压站工程	(1)、主体结构外墙施工完成，土建收尾。(2)、消防小室砌筑完成。			
4、风机场区工 程	(1)、10# 风机基础换填完成，垫层浇筑完成。(2)、17# 风机基础浇 筑完成。(3)、2# 道路局部换填完成。			
5、风机位箱变 工程				
6、外线工程	(1)、铁塔 G1, G2 组立完成。(2)、铁塔 G23---36 光纤展放工作完 成。(3)、铁塔 23---G29 导线，地线展放工作完成。			
7、其他				

填报人：朱名 审核人：田国栋 时间：2020 年 04 月 28 日

工程现场照片（含文字描述）：






17#风机基础钢筋绑扎监理检查



18#风机混凝土基础验收

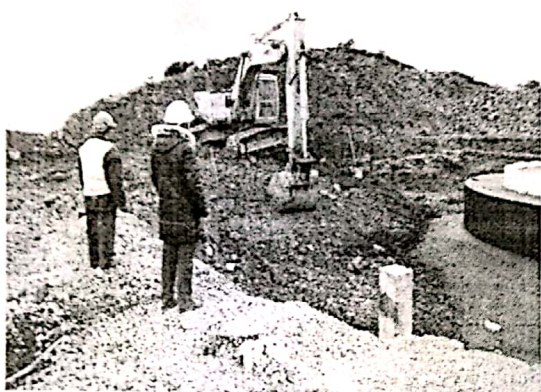


18#风机基础土方机械回填、夯实



监理测试 18#风机混凝土强度



升压站继保室静电地板安装

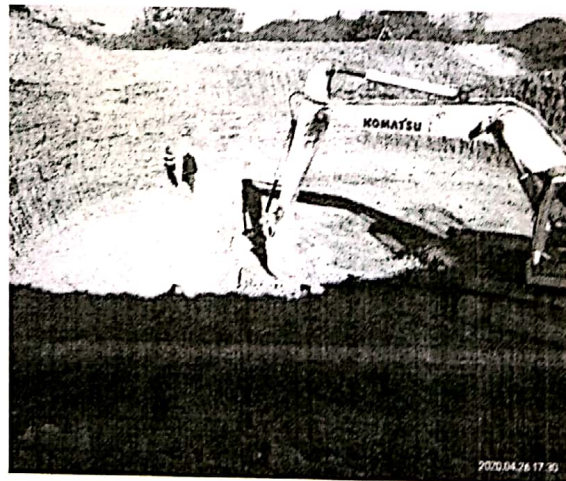

10#风机基坑换填开挖

