

赫章县大山坪风电场项目监理周报

2020 年 07 期

项目：赫章县大山坪风电场项目		填报周期：2020 年 05 月 12 日—05 月 18 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、升压站土建部分：（1）、升压站消防小室砌筑完成。（2）、生活楼、SVG 外墙真石漆喷涂完成。（3）、伸缩门洞砌筑完成。（4）、站内草坪铺设完成。（5）、站内材料转运场地清理。（6）、生活楼中控室后台办公桌安装完成				
2、风机位部分：（1）、17#风机基础浇筑完成。（2）、16#渣土场挡墙基础开挖完成。（3）、1#风机平台放线完成、1#主路放线完成、支路放线完成。（4）、2#风机支路放线完成。				
3、电气部分：（1）、升压站高压电缆敷设完成、终端头安装完成。（2）、升压站接地刷漆完成				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站道路工程	无			
2、升压站土建工程	（1）、升压站消防小室砌筑完成。（2）、站内草坪铺设完成。（3）、站内材料转运场地清理。（4）、升压站伸缩门洞砌筑完成。（5）、生活楼、（6）、外墙真石喷涂完成。			
3、生活楼附属建筑	（1）、生活楼中控室后台办公桌安装完成。			
4、风机位工程	（1）、17#风机基础浇筑完成。（2）、16#渣土场挡墙基础开挖完成。（3）、1#风机平台放线完成、1#主路放线完成、支路放线完成。（4）、2#风机支路放线完成。			
5、升压站电气工程	（1）、升压站高压电缆敷设完成、终端头安装完成。（2）、升压站接地刷漆完成。			
6、送出工程	（1）、铁塔基础线路复测全部完成。（2）、铁塔基础分坑测量放样完成。（3）、36 基浇筑完成。（4）、36 基铁塔组立完成 G5—G36 共。（5）、32 基铁塔螺栓紧固完成 G5—G36 共。（6）、32 基 G18—G36 铁塔导线、地线展放完成、附件安装完成。（7）、G14—G36 铁塔光纤展放完成。（8）、G14—G18 铁塔导线、地线展放完成。			
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、风机基础工程	无	无	无	
2、风机基础垫层浇筑工程（17#）	无	无	无	



3、风机基础环 安装工程	无	无	无	
4、风机基础钢 筋绑扎工程 (17#)	无	无	无	
5、风机基础模 板支护工程 (17#)	无	无	无	
6、风机基础预 埋件工程 (17#)	无	无	无	
7、风机基础混 凝土浇筑工程 (17#)	2020.04. 29	无	2020.04.2 9	
8、风机基础土 方回填工程	无	无	无	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调 的问题	(1)、基础环到货时间。(2)、机位变更。(3)、地勘报告。(4)、 1#主线、1#、2#、3#风机支线及 1#、2#、3#风机位征地			
未解决的协调 问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站道路 工程	无			
2、生活楼工程	(1)、生活楼内部水电安装完成。			
3、升压站工程	(1)、升压站绿化养护。(2)、升压站主体结构外墙施工完成。(3)、 升压站土建收尾。			
4、风机场区工 程	(1)、16#渣土场挡墙砌筑。(2)、2#道路局部换填。			
5、风机位箱变 工程	(1)、17#风机基础养护。(2)、13#风机平台基础开挖。(3)、10#风 机基础换填完成、垫层浇筑完成。			
6、外线工程	(1)、铁塔 G14—G18 附件安装工作完成。(2)、铁塔 G8—G14 导线、 地线展放工作完成 60%。 (3)、铁塔 G3 组立。 (4) 110kV 可乐变电站站外可线间隔土建施工完成 30%			
7、其他				

填报人: 张成 审核人: 张成 时间: 2020 年 05 月 19 日



扫描全能王 创建

工程现场照片（含文字描述：




华能监检中心专家现场检查汇报专题会




华能监检中心专家检查施工现场



16#渣场挡土墙砌筑

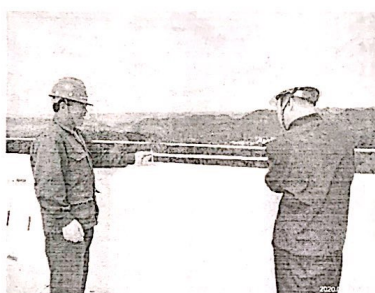

监理检查升压站屋面防雷接地带支撑检查

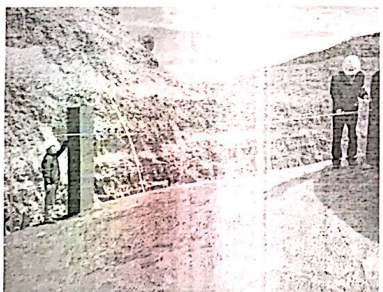


监理检查 16#风机混凝土基础浇筑规格



监理检查钢筋制作情况



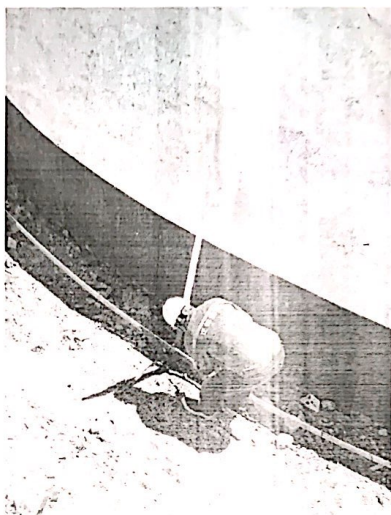

监理检查 16#风机基础防雷接地



14#风机位进场道路土方开挖



监理检查验收屋面安装护栏规格型号



验收复查 10#风机毛石换填深度及浇筑质量

