

赫章县大山坪风电场项目监理周报

2020 年 08 期

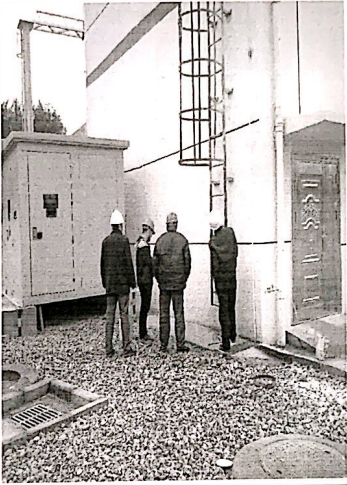
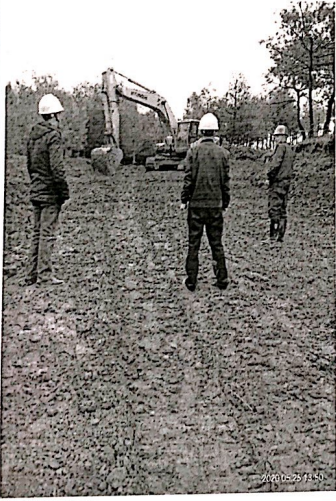
项目：赫章县大山坪风电场项目		填报周期：2020 年 05 月 19 日—05 月 25 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、升压站土建部分：（1）、升压站屋顶避雷带引下线安装焊接完成。（2）、监理发现问题整改消缺。 2、风机位部分：（1）、16#渣土场挡墙砌筑完成 60%。（2）、10#风机基础钢筋加工完成。（3）、13#风机平台开挖完成、13#风机基础开挖完成 70%。（4）、15#风机道路开挖完成 80%。（5）、14#风机道路开挖完成 5%。（6）、监理发现问题整改。 3、电气部分：（1）、升压站高压电缆敷设完成、终端头安装完成。（2）、升压站接地刷漆完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站土建工程	监理发现问题整改消缺。			
2、风机基础工程	（1）、10#风机基础钢筋加工完成。（2）、13#风机平台开挖完成、13#风机基础开挖完成 70%。			
3、风机位工程	（1）、15#风机道路开挖完成 80%。（2）、14#风机道路开挖完成 5%。（3）、16#渣土场挡墙砌筑完成 60%。			
4、升压站电气工程	（1）、升压站屋顶避雷带引下线安装焊接完成。（2）、监理发现问题整改消缺。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、风机基础平台开挖工程（13#）	2020.05.18	无	2020.05.21	
2、风机基础开挖工程（13#）	2020.05.20	无	无	
3、风机基础环安装工程	无	无	无	
4、风机基础道路工程（14#15）	15#2020.05.20。 14#2020.05.23	无	无	
5、风机基础模板支护工程	无	无	无	



6、风机基础预埋件工程	无	无	无	
7、风机基础混凝土浇筑工程	无	无	无	
8、风机基础土方回填工程	无	无	无	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、机位变更。 2、地勘报告。 3、1#主线、1#风机、2#风机、3#风机支线及 1#、2#、3#风机位征地。 4、升压站农网接线问题。 5、生活楼中控室后台电脑安装。 6、调试人员进场 GIS 厂家需要一起进场安装六氟化硫。 7、通讯柜蓄电池未安装，厂家需进场知道安装。			
未解决的协调问题解决进展	业主正在协调中			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站土建工程	升压站土建收尾，监检整改项消缺。			
2、生活楼工程	防雷接地下引整改。			
3、升压站电气工程	(1)、升压站建筑物内部水电安装。(2)、设备间环氧自流平施工。(3)、升压站电气调试。			
4、风机场区工程	(1)、16#渣土场挡墙砌筑。(2)、15#风机道路开挖。			
5、风机位基础工程	(1)、13#风机基础开挖。(2)、10#基础环吊装调平，10#风机基础钢筋绑扎。			
6、外线工程				
7、其他				

 填报人: 张本 审核人: 明有 时间: 2020年5月26日


工程现场照片（含文字描述：

问字 描述 照片	主变龙门架爬梯安全门安装要求	监理检查升压站爬梯护笼改造
		
文字 描述 照片	监理检查 14#风机位道路开挖	监理检查 10#风机基础土方开挖
		



文字描述	监理检查 15#风机位道路开挖	钢筋绑扎现场检查
照片		
文字描述	基础环进场吊卸监理人员进行安全旁站	
照片		

