

赫章县大山坪风电场项目监理周报

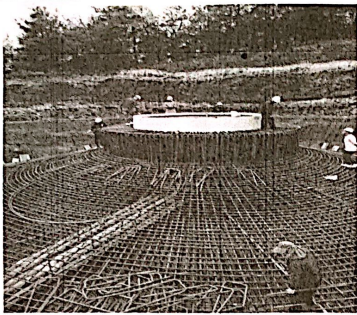
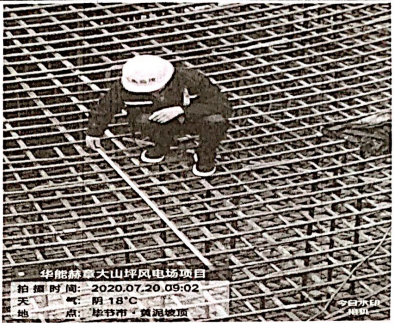
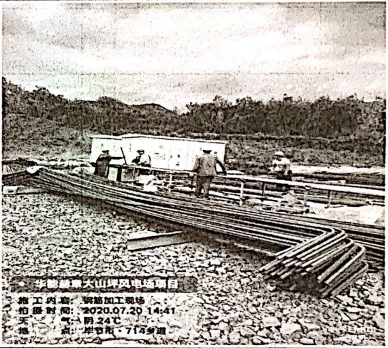
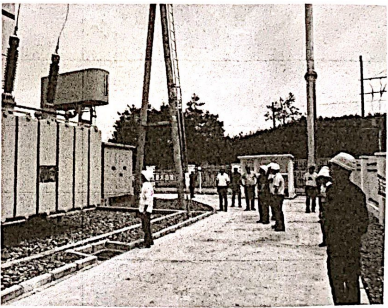
2020年7月第3期

项目：赫章县大山坪风电场项目		填报周期：2020年7月14日-2020年7月20日		
一、项目总体建设进度汇总： 9#风机基坑开挖完成；10#风机基础浇筑完成；12#风机基坑垫层浇筑完成，钢筋绑扎完成，模板安装完成、预埋管安装完成、接地完成；13#风机基础浇筑完成；14#风机道路开挖完成60%；15#风机平台开挖20%，换填完成700米；16#、17#、18#风机基础浇筑完成、回填完成；X1#风机平台开挖完成20%；16#渣场挡墙砌筑完成；1#主线道路开挖完成650米；升压站主体结构完成，电气一次、二次设备安装完成，电气二次调试完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站土建工程	消缺整改			
2、风机基础工程	12#风机基础钢筋绑扎、模板安装。			
3、风机位工程	14#风机道路开挖完成60%；15#风机平台开挖20%，换填完成700米。			
4、升压站电气工程	整改消缺			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
12#风机基础钢筋绑扎、模板安装	2020.7.14	/	2020.7.20	
14#风机道路开挖	2020.7.10	/	2020.7.25	
15#风机平台开挖	2020.7.12	/	2020.7.30	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1#线征地问题			
未解决的协调问题解决进展	业主正在协调中			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站土建工程	消防水箱注水、防雷接地扩网。			
2、升压站电气工程	消缺整改。			
3、风机场区工程	14#风机道路开挖、15#风机平台开挖。			
4、风机位基础工程	12#风机基础混凝土浇筑。			

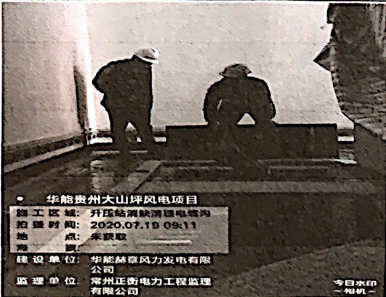
填报人：任远成 审核人：李俊平 时间：2020年07月20日



工程现场照片：（含文字描述）

文字描述 照片	12#风机基础钢筋绑扎	12#风机基础监理工程师钢筋验收
		 华能绿山大山坪风电项目 拍摄时间: 2020.07.20 09:02 天气: 阴 18°C 地点: 华能绿山大山坪风电项目
文字描述 照片	9#风机基础垫层浇筑完成	钢筋制作场预制 14#风机位钢筋
	 华能绿山大山坪风电项目 施工区域: 9#风机基础垫层浇筑完成 拍摄时间: 2020.07.16 08:55 天气: 阴 23°C 地点: 未设置 海拔: 2279.4米 建设单位: 华能绿山风力发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 华能绿山大山坪风电项目 施工内容: 钢筋加工现场 拍摄时间: 2020.07.20 14:41 天气: 阴 24°C 地点: 华能绿山大山坪风电项目
文字描述 照片	华能公司领导到 12#风机位视察	华能公司领导到升压站视察
		



文字描述 照片	华能公司领导主持召开现场协调会	华能公司领导主持召开现场协调会
		
文字描述	9#风机位土方外运	复测 12#风机位基础环水平度
	 • 华能贵州大山坪风电项目 施工区域: 9#风机基础土方外运 拍摄时间: 2020.07.16 08:56 天气: 晴 23°C 地点: 未联联 海拔: 2277.4米 建设单位: 华能赫章风力发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印: 电眼	 • 华能贵州大山坪风电项目 施工区域: 12#基础环复测水平度 拍摄时间: 2020.07.16 08:30 天气: 晴 23°C 地点: 未联联 海拔: 2326.4米 建设单位: 华能赫章风力发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印: 电眼
文字描述 照片	12#风机位焊接模板保护层	升压站清理电缆沟
	 • 华能贵州大山坪风电项目 施工区域: 12#基础环焊接模板保护层 拍摄时间: 2020.07.19 08:55 天气: 未联联 海拔: 2313.7米 建设单位: 华能赫章风力发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印: 电眼	 • 华能贵州大山坪风电项目 施工区域: 升压站清理电缆沟 拍摄时间: 2020.07.19 09:11 天气: 未联联 海拔: 2313.7米 建设单位: 华能赫章风力发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 今日水印: 电眼

