

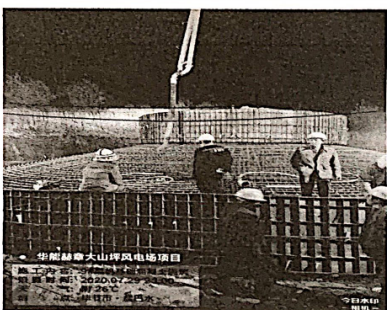
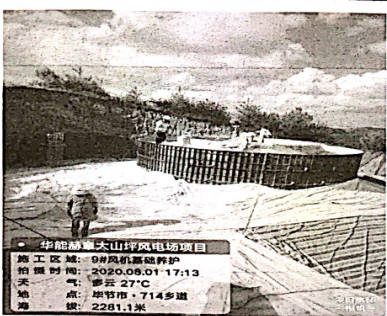
赫章县大山坪风电场项目监理周报

2020年7月第5期

项目：赫章县大山坪风电场项目		填报周期：2020年7月28日-2020年8月3日		
一、项目总体建设进度汇总：				
9#、10#、12#、13#风机基础浇筑完成；14#风机基坑开挖完成，基础垫层浇筑完成、钢筋绑扎完成15%；15#风机平台开挖完成、基础开挖完成30%；16#、17#、18#风机基础浇筑完成、回填完成；X1#风机平台开挖完成20%；16#渣场挡墙砌筑完成；1#主线毛路开挖完成1080米；2#风机毛路开挖80米；11#处弃渣场挡土墙基础开挖完成20%；升压站主体结构完成，电气一次、二次设备安装完成，电气二次调试完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站土建工程	按照升压站受电前监检通报内容整改。			
2、风机基础工程	9#风机基础浇筑完成。			
3、风机位工程	14#风机基坑开挖完成，基础垫层浇筑完成、钢筋绑扎完成15%；15#风机基础开挖完成30%；1#主线毛路开挖完成1080米；2#风机毛路开挖80米。			
4、升压站电气工程	升压站防雷接地扩网。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
9#风机基础浇筑完成	2020.7.28	/	2020.8.3	
14#风机基础垫层浇筑完成	2020.7.28	/	2020.8.3	
14#风机基础钢筋绑扎	2020.7.30	/	2020.8.6	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1#线征地问题			
未解决的协调问题解决进展	业主正在协调中			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站土建工程	按照升压站受电前监检通报内容整改。			
2、升压站电气工程	按照升压站受电前监检通报内容整改。			
3、风机场区工程	15#风机基础开挖；1#主线毛路开挖；2#风机毛路开挖。			
4、风机位基础工程	14#风机基础钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑。			

 填报人： 任江波 审核人： 黄兴平 时间： 2020 年 08 月 03 日


工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	9#风机基础模板支护	9#风机基础验筋
照片	 检查9#风机基础模板支护 施工记录 天气: 阴 19度 西北风3级 湿度80% 经纬度: 104.4892685 海拔: 272646300 地址: 常州市林草园在基巴水附近 时间: 2020-07-29 08:25:46	 9#风机基础钢筋检查 施工记录 天气: 晴 18度 西北风4级 湿度80% 经纬度: 104.4893525 海拔: 272646946 地址: 常州市林草园在基巴水附近 时间: 2020-07-28 08:51:02
文字描述	9#风机基础测量基础环水平度	9#风机基础混凝土浇筑
照片	 • 华能林草大山坪风电场项目 施工区域: 9#风机基础测量基础环水平度 施工内容: 基础环测量浇筑混凝土 拍摄时间: 2020.07.29 09:27 天气: 阴 19℃ 地点: 常州市·蓝巴水 海拔: 2270.5米	 • 华能林草大山坪风电场项目 施工区域: 9#风机基础浇筑 拍摄时间: 2020.07.29 09:27 天气: 阴 19℃ 地点: 常州市·蓝巴水 海拔: 2270.5米
文字描述	9#风机基础混凝土浇筑完成	9#风机基础养护
照片	 9#风机基础 施工记录 天气: 多云 20度 东风3级 湿度86% 经纬度: 104.4891926 海拔: 272646120 地址: 常州市林草园在基巴水附近 时间: 2020-07-31 08:30:42	 • 华能林草大山坪风电场项目 施工区域: 9#风机基础养护 拍摄时间: 2020.08.01 17:13 天气: 多云 27℃ 地址: 常州市·714乡道 海拔: 2261.1米



文字描述 照片	11#挡土墙基础开挖	可乐变电站设备基础浇筑
	 11#挡土墙基础开挖 施工记录 天气：多云 经纬度：104.4952230 海拔：27.2580314 时间：2020-08-03 16:05:27	 升压站构支架浇筑 施工记录 天气：多云 22度 东南风5级 湿度78% 经纬度：104.4106439 海拔：27.2323414 地址：沙湾镇葛家沟村葛家沟附近 时间：2020-08-03 09:37:39
文字描述 照片	升压站焊接接地扁钢	升压站接地电阻测量
	 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域：升压站 施工内容：焊接接地扁钢 拍摄时间：2020.08.01 16:06 天气：多云 27°C 地点：毕节市·盐巴水 海拔：2259.4米 今日水印相机	 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域：升压站接地电阻测量 拍摄时间：2020.08.02 09:31 天气：多云 22°C 地点：毕节市·盐巴水 海拔：2303.1米 今日水印相机

