


赫章县大山坪风电场项目监理周报

2020年8月第2期


项目：赫章县大山坪风电场项目		填报周期：2020年8月11日-2020年8月17日		
一、项目总体建设进度汇总：				
9#、10#、12#、13#、14#风机基础浇筑完成；15#风机钢筋绑扎完成40%；16#、17#、18#风机基础浇筑完成、回填完成；X1#风机平台开挖完成20%；16#渣场挡墙砌筑完成；1#主线毛路开挖完成1080米；2#风机毛路开挖至风机平台；1#风机毛路开挖150米；11#处弃渣场挡土墙基础开挖完成；11#风机平台开挖完成；升压站主体结构完成，电气一次、二次设备安装完成，电气二次调试完成。				
二、本周工程建设内容及完成情况				
1、升压站土建工程	按照升压站受电前监检通报内容整改。			
2、风机基础工程	15#风机钢筋绑扎完成40%。			
3、风机位工程	1#主线毛路开挖完成1080米；2#风机毛路开挖至风机平台；1#风机毛路开挖150米；11#风机平台开挖完成。			
4、升压站电气工程	按照升压站受电前监检通报内容整改。			
三、截止本周工程建设进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
15#风机基础钢筋绑扎	2020.8.11	/	2020.8.20	
15#风机基础模板安装	2020.8.11	/	2020.8.22	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1#线征地问题			
未解决的协调问题解决进展	业主正在协调中			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站土建工程	按照升压站受电前监检通报内容整改。			
2、升压站电气工程	按照升压站受电前监检通报内容整改。			
3、风机场区工程	1#主线毛路开挖；2#风机毛路开挖；1#风机毛路开挖；11#风机基础开挖。			
4、风机位基础工程	15#风机基础钢筋绑扎、模板安装、基础混凝土浇筑			
5、其他	16#17#18#箱变基础开挖			

 填报人： 张立 审核人： 张立 时间： 2020 年 08 月 17 日


工程现场照片：(含文字描述)

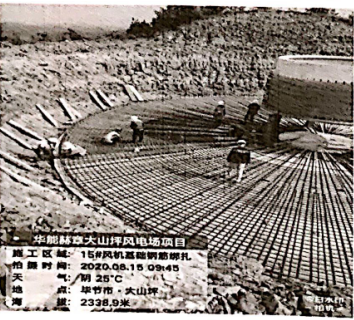文字描述 照片	14#风机基础混凝土浇筑	14#风机基础养护
	 华能薛家大山风电场项目 施工区域: 14#风机基础混凝土浇筑 拍摄时间: 2020.08.15 10:54 天气: 晴 24℃ 地点: 常州市·龙家湾路子	 华能薛家大山风电场项目 施工区域: 14#风机基础混凝土养护 拍摄时间: 2020.08.15 10:54 天气: 晴 24℃ 地点: 常州市·龙家湾路子
文字描述 照片	15#风机基础环吊装	15#风机基础环测量
	 15#风机基础环吊装 施工记录 天气: 多云 25度 南风 3级 湿度65% 经纬度: 104.5177361 海拔: 27.2659261 高程: 2356.8米 地址: 常州市薛家大山 时间: 2020-08-13 15:53:12	 15#风机基础环测量 施工记录 天气: 多云 26度 东南风 3级 湿度61% 经纬度: 104.5177071 海拔: 27.2659260 高程: 2346.7米 地址: 常州市·龙家湾路子 时间: 2020-08-13 16:57:35
文字描述 照片	15#风机基础钢筋绑扎	18#风机平台环网接地焊接
	 华能薛家大山风电场项目 施工区域: 15#风机基础钢筋绑扎 拍摄时间: 2020.08.13 09:49 天气: 阴 25℃ 地点: 常州市·大山坪 海拔: 2338.9米	 华能薛家大山风电场项目 施工区域: 18#风机平台环网接地焊接 拍摄时间: 2020.08.13 16:23 天气: 晴 24℃ 地点: 常州市·大山坪 海拔: 2338.9米

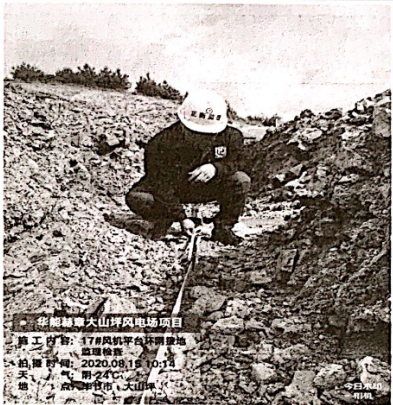

文字描述	17#风机接地沟测量	17#风机平台环网接地检查
照片	 • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 17#风机接地沟测量 拍摄时间: 2020.08.15 10:12 天气: 阴 24℃ 地点: 毕节市·大山坪	 • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 17#风机平台环网接地 拍摄时间: 2020.08.15 10:13 天气: 阴 24℃ 地点: 毕节市·大山坪
文字描述	13#风机基础土方回填	9#风机基础防腐
照片	 • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 13#风机基础土方回填 拍摄时间: 2020.08.17 09:37 天气: 阴 23℃ 地点: 毕节市·黄泥坝 海拔: 2314.3米	 • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 9#风机基础防腐 拍摄时间: 2020.08.17 08:27 天气: 阴 22℃ 地点: 毕节市·714乡道 海拔: 2279.3米

