

赫章县大山坪风电场项目监理周报

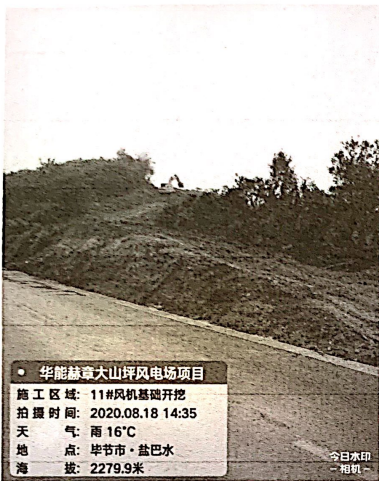

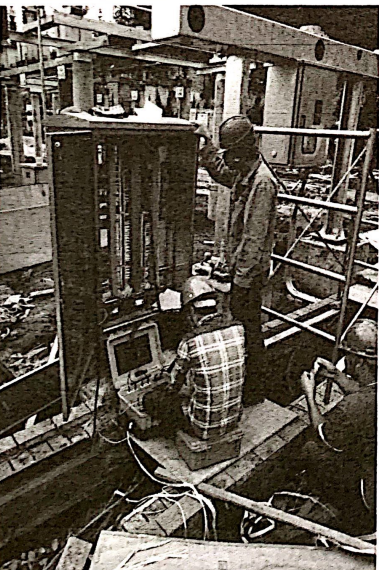

2020年8月第3期

项目：赫章县大山坪风电场项目		填报周期：2020年8月18日-2020年8月24日		
一、项目总体建设进度汇总： 2#风机平台开挖完成20%；9#、10#、12#、13#、14#风机基础浇筑完成；15#风机钢筋绑扎完成、模板安装完成；16#风机基础浇筑完成、回填完成、风机外网接地回填；17#、18#风机基础浇筑完成、回填完成、风机外网接地完成；1#主线毛路开挖完成1080米；2#风机毛路开挖至风机平台；1#风机毛路开挖150米；11#处弃渣场挡土墙基础开挖完成；11#风机平台开挖完成、基础开挖完成90%；升压站主体结构完成，电气一次、二次设备安装完成，电气二次调试完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站土建工程	按照升压站受电前监检通报内容整改。			
2、风机基础工程	15#风机钢筋绑扎完成、模板安装完成。			
3、风机位工程	16#风机位外网接地回填；17#、18#风机位外网接地完成。			
4、升压站电气工程	按照升压站受电前监检通报内容整改。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比及对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
15#风机基础钢筋绑扎完成	2020.8.18	/	2020.8.24	
15#风机基础模板安装完成	2020.8.18	/	2020.8.24	
16#17#、18#风机位外网接地焊接完成	2020.8.18	/	2020.8.24	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1#线征地问题			
未解决的协调问题解决进展	业主正在协调中			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站土建工程	按照升压站受电前监检通报内容整改。			
2、升压站电气工程	按照升压站受电前监检通报内容整改。			
3、风机场区工程	16#17#18#风机位箱变基础开挖。			
4、风机位基础工程	15#风机基础混凝土浇筑。			

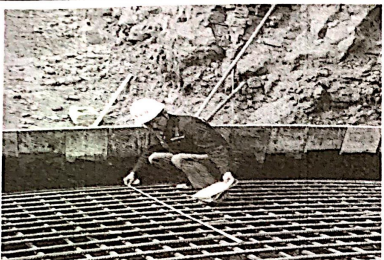
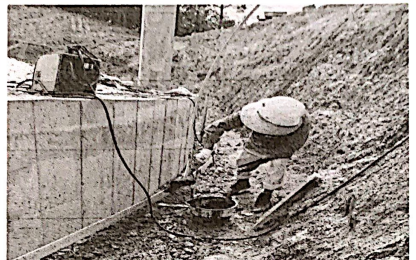
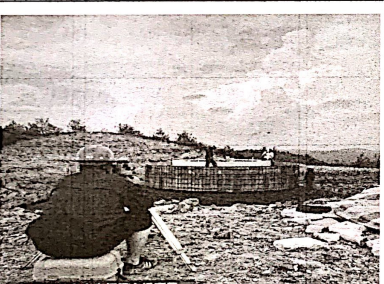
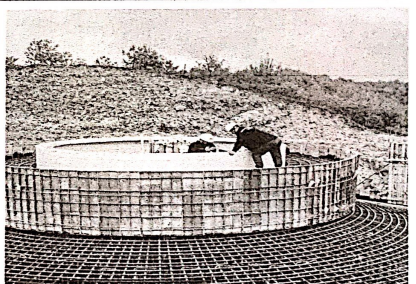


填报人：李运成 审核人：高俊平 时间：2020年08月24日



工程现场照片：（含文字描述）

<p>文字描述</p>	<p>11#风机基础开挖</p>	<p>13#风机位防雷接地焊接</p>
<p>照片</p>	 <p> ● 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 11#风机基础开挖 拍摄时间: 2020.08.18 14:35 天气: 雨 16°C 地点: 毕节市·盐巴水 海拔: 2279.9米 今日水印相机 </p>	 <p> 施工区域: 13#风机位 拍摄时间: 2020.08.19 14:45 海拔: 2313.1米 建设单位: 华能赫章风力发电有限公司 今日水印相机 </p>
<p>文字描述</p>	<p>可乐变电站设备调试</p>	<p>可乐变电站监理工程师巡查</p>
<p>照片</p>		 <p> ● 华能赫章大山坪风电场项目 施工内容: 可乐变电站 拍摄时间: 2020.08.20 13:45 天气: 晴 26°C 地点: 毕节市·768县道 今日水印相机 </p>



<p>文字描述</p>	<p>15#风机位基础钢筋验收</p>	<p>14#风机位防雷接地焊缝防腐</p>
<p>照片</p>	 <p>华能赫章大山坪风电场项目 施工区号: 15#风机位基础钢筋 拍摄时间: 2020.08.21 09:49 天气: 晴 21°C 地点: 毕节市·大山坪 海拔: 2335.9米</p>	 <p>华能赫章大山坪风电场项目 施工内容: 14#风机防雷接地防腐 拍摄时间: 2020.08.21 15:19 天气: 晴 21°C 地点: 毕节市·大山坪</p>
<p>文字描述</p>	<p>15#风机位基础环水平度复测</p>	<p>15#风机位基础模板验收</p>
<p>照片</p>	 <p>华能赫章大山坪风电场项目 施工内容: 15#风机基础环复测 拍摄时间: 2020.08.21 14:40 天气: 晴 21°C 地点: 毕节市·大山坪</p>	 <p>华能赫章大山坪风电场项目 施工内容: 15#风机基础模板验收 拍摄时间: 2020.08.21 15:19 天气: 晴 21°C 地点: 毕节市·大山坪</p>
<p>文字描述</p>	<p>15#风机位浇筑基础混凝土</p>	<p>12#风机位开挖防雷接地沟</p>
<p>照片</p>	 <p>华能赫章大山坪风电场项目 施工区号: 15#风机位基础混凝土浇筑 拍摄时间: 2020.08.22 01:29 天气: 多云 21°C 地点: 毕节市·大山坪 海拔: 2335.9米</p>	 <p>华能赫章大山坪风电场项目 施工内容: 12#风机防雷接地沟开挖 拍摄时间: 2020.08.21 15:19 天气: 晴 21°C 地点: 毕节市·大山坪</p>

