

赫章县大山坪风电场项目监理周报

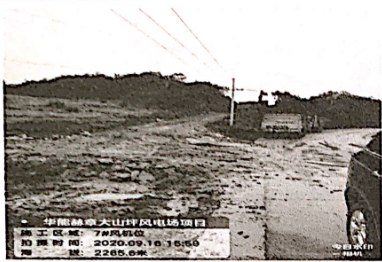
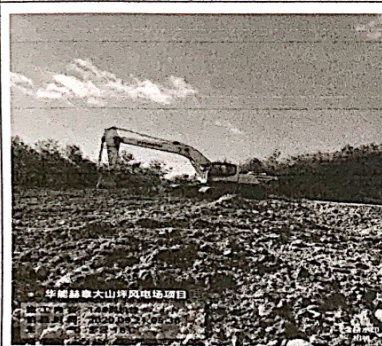
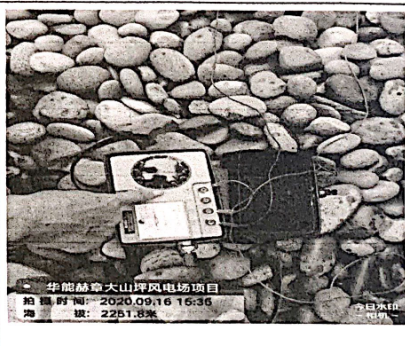
2020年9月第3期

项目：赫章县大山坪风电场项目	填报周期：2020年9月15日-2020年9月21日			
一、项目总体建设进度汇总：				
1#平台开挖完成 20%；2#平台开挖完成 60%；7#风机平台开挖完成 30%；8#风机基础开挖完成 80%；9#、10#、12#、15#、11#风机基础浇筑完成；12#13#14#16#17#18#风机基础浇筑完成、回填完成、风机外网接地回填；X1#风机平台开挖完成 80%；16#渣场挡墙砌筑完成；1#主线毛路开挖完成 1080 米；2#风机毛路开挖至风机平台；1#风机毛路开挖完成；升压站主体结构完成，电气一次、二次设备安装完成，电气二次调试完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站土建工程	按照升压站受电前监检通报内容整改，升压站接地网网引孔。			
2、风机基础工程	11#风机基础混凝土养护。			
3、风机位工程	7#风机平台开挖，8#风机基础开挖，1#风机平台开挖，2#风机平台开挖。9#风机位接地扁铁焊接完成。12#箱变基础支模完成。			
4、升压站电气工程	按照升压站受电前监检通报内容整改。			
三、截止本周工程建设进度与施工组织设计的进度比及对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
12#、13#箱变基础砌筑、模板安装。	2020.9.15	/	2020.9.21	
14#风机基础回填	2020.9.15	/	2020.9.21	
9#风机基础土方回填	2020.9.15	/	2020.9.21	
9#防雷接地电阻测试	2020.9.15	/	2020.9.17	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1#线征地问题			
未解决的协调问题解决进展	业主正在协调中			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站土建工程	按照升压站受电前监检通报内容整改，升压站接地网网引孔。			
2、升压站电气工程	按照升压站受电前监检通报内容整改。			
3、风机场区工程	10#风机位防雷接地焊接、7#、8#风机基础开挖，1#、2#风机平台开挖。			
4、风机位基础工程	8#风机基础垫层混凝土浇筑。			
5、其他	塔筒吊装			

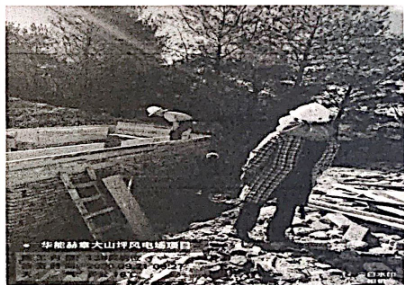


填报人: 任远威 审核人: 袁欣平 时间: 2020 年 09 月 21 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	7#风机进场道路	8#风机进场道路
照片		
文字描述	升压站防雷接地扩网引孔	升压站防雷接地扩网 1#孔
照片		
文字描述	14#风机位土方回填	升压站防雷接地电阻复测数据
照片		



文字描述	1#风机道路修整	9#风机基础防雷接地检验
照片		
文字描述	12#风机基础箱变主梁立模	13#风机基础箱变主梁立模
照片		
文字描述	监理巡查 7#风机平台开挖现场	监理巡查 2#风机平台开挖现场
照片		

白坪山
风电场
项目
部

