

赫章县大山坪风电场项目监理周报



2020年10月第3期

项目：赫章县大山坪风电场项目	填报周期：2020年10月13日-2020年10月19日			
一、项目总体建设进度汇总：				
2#风机基础开挖100%；11#风机位防雷接地环网焊接完成；6#7#风机基础垫层混凝土浇筑完成；6#7#风机位基础环安装完成；1#线道路开挖；送出线路已经倒送电；升压站已经受电。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站土建工程	无			
2、风机基础工程	6#7#风机基础垫层混凝土浇筑完成			
3、风机位工程	2#风机基础开挖100%；11#风机位防雷接地环网焊接完成；6#7#风机位基础环安装完成；1#线道路开挖。			
4、升压站电气工程	升压站已经受电			
5、送出线路工程	送出线路已经倒送电			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比及对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
6#风机基础垫层浇筑完成	2020.10.13	/	2020.10.19	
7#风机基础垫层浇筑完成	2020.10.13	/	2020.10.19	
6#风机位基础环安装完成	2020.10.13	/	2020.10.19	
7#风机位基础环安装完成	2020.10.13	/	2020.10.19	
11#风机位防雷接地环网	2020.10.13	/	2020.10.19	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站土建工程	按照升压站受电前监检通报内容整改。			
2、升压站电气工程	无			
3、风机场区工程	1#3#4#5#19#基础开挖			
4、风机位基础工程	6#7#风机基础钢筋绑扎；2#风机位基础垫层浇筑；8#9#10#风机位箱变基础。			
5、其他	塔筒吊装			




填报人：任远成 审核人：高松军 时间：2020年10月9日



工程现场照片：（含文字描述）

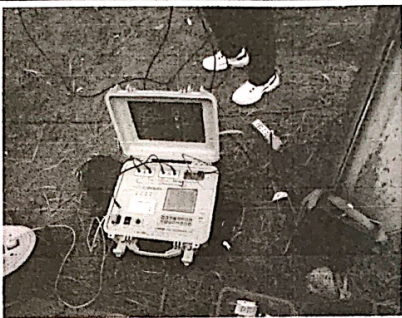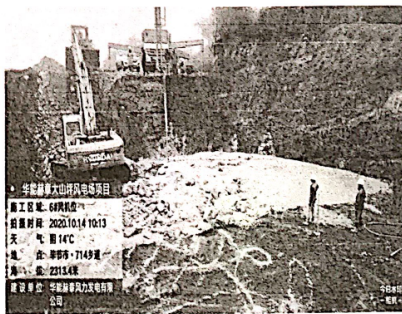文字描述 照片	可乐变电站新建间隔  • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域：可乐变 拍摄时间：2020.10.13 11:45 海拔：1880.1米 今日拍摄：杨帆	可乐变电站 CT 常规实验 
文字描述 照片	可乐变电站新建间隔  • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域：新建间隔 拍摄时间：2020.10.13 18:52 海拔：1880.1米 今日拍摄：杨帆	可乐变电站新建间隔母线安装母线  • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域：可乐变电站 拍摄时间：2020.10.14 10:33 建设单位：华能赫章风力发电有限公司 今日拍摄：杨帆
文字描述 照片	可乐变电站配电箱防火封堵  • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域：可乐变电站 拍摄时间：2020.10.14 10:32 建设单位：华能赫章风力发电有限公司 今日拍摄：杨帆	6#风机位浇筑基础垫层  • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域：6#风机位 拍摄时间：2020.10.14 10:13 天气：晴 14°C 地点：坐标：7149号 海拔：2315.4米 建设单位：华能赫章风力发电有限公司 今日拍摄：杨帆

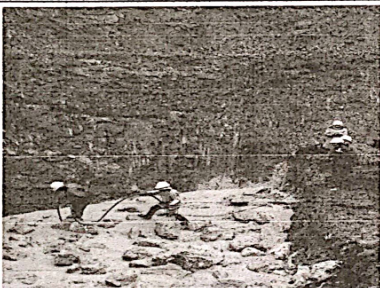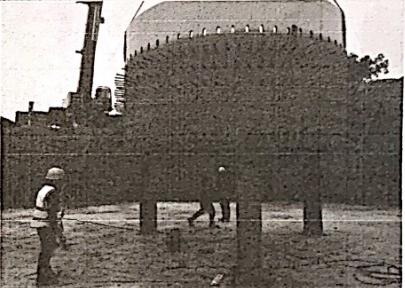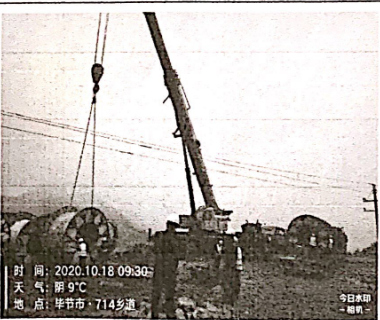

文字描述	可乐变电站新建间隔母线安装母线	升压站受电完成
照片	 OPPO Reno3 Pro 5G 2020.10.18 09:34:32 中国·常州市·经开区	 华能江苏大山湾风电场项目 施工区域：升压站中控室 施工内容：送出线路倒送电 拍摄时间：2020.10.18 今日水印相机
文字描述	7#风机基础垫层浇筑	6#风机位安装基础环
照片		
文字描述	堆场集电线路电缆卸货	6#风机基础钢筋绑扎
照片	 时间：2020.10.18 09:30 天气：阴 9℃ 地点：华江市·714乡道 今日水印相机	
