

赫章县大山坪风电场项目监理周报

2020 年 10 月第 5 期


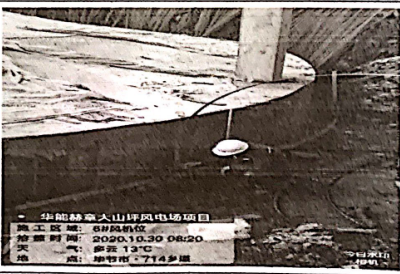
项目：赫章县大山坪风电场项目	填报周期：2020 年 10 月 27 日-2020 年 11 月 01 日			
一、项目总体建设进度汇总：				
1#2#风机位基础环吊装完成；3#风机位进场道路及平台开挖完成 40%；7#风机基础钢筋、模板安装完成，具备混凝土浇筑条件；9#风机位已完成吊装塔筒 2 段；6#8#15#风机位基础混凝土浇筑完成，8#15#防腐完成，暂时没有土方回填。9#10#11#12#13#14#16#17#18#风机位基础土方回填完成、防雷接地环网焊接完成；12#13#14#箱变基础圈梁构造柱混凝土浇筑完成；升压站已经受电，施工资料没有完善、同步，巡检通报没有闭环。 110kV 送出线路工程已经倒送电，可乐变电站内设备及施工过程资料至今没有报验。 大件运输及空障迁改工程已经通车，9#风机位已到场 4 段塔筒；10#风机位已到场 1 段塔筒。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站土建工程	无			
2、风机基础工程	7#风机基础钢筋绑扎、模板支护完成，已具备浇筑混凝土条件；6#风机基础混凝土浇筑完成；			
3、风机位工程	3#风机位进场道路及平台开挖完成 40%；9#风机位完成 2 段塔筒吊装作业；			
4、升压站电气工程	无			
5. 送出线路工程	110kV 送出线路工程已经倒送电			
三、截止本周工程建设进度与施工组织设计的进度对比及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
6#风机基础混凝土浇筑完成	2020. 10. 20	/	2020. 10. 28	
7#风机基础混凝土浇筑	2020. 10. 20	/	2020. 10. 31	修路导致商砼无法到场
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	个别风机位坟墓迁移事宜，后续会影响风机吊装。			
未解决的协调问题解决进展	业主暂时没有协调到位			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站土建工程	按照升压站受电前巡检通报内容整改。			
2、升压站电气工程	无			
3、风机场区工程	3#19#基础开挖风机位进场道路开挖、基础平台开挖；5#风机位基础开挖；			




4、风机位基础工程	1#2#风机基础钢筋绑扎；7#风机位基础混凝土浇筑；8#9#10#风机位箱变基础；12#13#14#风机位箱变基础抹灰。
5、其他	9#10#风机位塔筒吊装

填报人: 任远威 审核人: 徐文强 时间: 2020 年 11 月 01 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	7#风机基础钢筋绑扎	6#风机基础混凝土浇筑
照片		 • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区段: 6#风机位 拍摄时间: 2020.10.27 21:32 天气: 晴 11℃ 地点: 毕节市·714乡道
文字描述	9#风机位第1段塔筒吊装	监理检查6#风机位环网接地焊接情况
照片	 • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区段: 9#风机位 拍摄时间: 2020.10.26 10:30 天气: 晴 13℃ 地点: 毕节市·赫章县	 • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区段: 6#风机位 拍摄时间: 2020.10.30 08:20 天气: 晴 13℃ 地点: 毕节市·714乡道
文字描述	7#风机基础模板支护	3#风机位进场道路及风机平台开挖
照片	 • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区段: 7#风机位 拍摄时间: 2020.10.30 08:28 天气: 晴 13℃ 地点: 毕节市·714乡道	



文字描述	钢筋加工	9#风机位第2段塔筒吊装
照片	 • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 5#风机位 拍摄时间: 2020.10.31 09:37 天气: 晴 11°C 地点: 毕节市·714乡道 今日水印 - 相机 -	 施工区域: 9#风机位 拍摄时间: 2020.10.31 16:52 天气: 晴 12°C 总风速3级 阵风5级 今日水印 - 相机 -
文字描述	6#风机基础模板拆除	9#风机位1段塔筒高强螺栓紧固
照片		 • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 9#风机位 拍摄时间: 2020.10.30 10:14 天气: 多云 14°C 地点: 毕节市·盐巴水 今日水印 - 相机 -
文字描述	钢筋转运	9#风机位塔筒进场卸车
照片		 • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 9#风机位 拍摄时间: 2020.10.30 15:17 地点: 未设置 今日水印 - 相机 -

工程监理单位
常州正衡电力工程监理有限公司
风电场项目

