

赫章县大山坪风电场项目监理周报

2020 年 11 月第 2 期




项目：赫章县大山坪风电场项目	填报周期：2020 年 11 月 10 日-2020 年 11 月 16 日			
一、项目总体建设进度汇总： 1#风机位基础浇筑完成；2#风机位基础钢筋绑扎完成；3#风机位基础开挖完成 15%；5#风机位基础开挖完成 80%；9#风机位完成吊装塔筒 2 段；10#风机位已完成吊装塔筒 3 段；1#7#15#风机位基础混凝土浇筑完成，6#风机基础土方回填完成。8#9#10#11#12#13#14#16#17#18#风机位基础土方回填完成、防雷接地环网焊接完成；12#13#14#箱变基础圈梁构造柱混凝土浇筑完成，外墙抹灰完成；16#17#18#箱变基础底板混凝土浇筑完成，模板支护完成；升压站已经受电，施工资料没有完善、同步，抽检通报没有闭环。 110kV 送出线路工程已经倒送电，可乐变电站内设备及施工过程资料至今没有报验。 大件运输及空障迁改工程已经通车，9#风机位已到场 4 段塔筒；10#风机位已到场 4 段塔筒。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站土建工程	无			
2、风机基础工程	1#风机基础混凝土浇筑完成；			
3、风机位工程	3#风机位基础开挖完成 15%； 10#风机位完成 3 段塔筒吊装作业； 2#风机基础钢筋绑扎完成 100%； 5#风机位基础开挖完成 80%； 8#风机位接地环网焊接完成； 6#风机位基础回填完成；			
4、升压站电气工程	无			
5. 送出线路工程	110kV 送出线路工程已经倒送电			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比及对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1#风机基础混凝土浇筑完成	2020. 11. 10	/	2020. 11. 16	
2#风机基础钢筋绑扎	2020. 11. 10	/	2020. 11. 15	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	个别风机位坟墓迁移事宜，后续会影响风机吊装。			
未解决的协调问题解决进展	业主暂时没有协调到位			
五、下周计划主要工作内容				






1、升压站土建工程	按照升压站受电前监检通报内容整改。
2、升压站电气工程	无
3、风机场区工程	3#风机位基础开挖; 5#风机位基础扩挖;
4、风机位基础工程	2#风机基础混凝土浇筑; 5#风机基础垫层浇筑完成; 8#9#10#风机位箱变基础; 16#17#18#风机位箱变基础混凝土浇筑。
5、其他	9#10#风机位塔筒吊装

填报人: 任远成 审核人: 陈培生 时间: 2020 年 11 月 16 日

工程现场照片: (含文字描述)

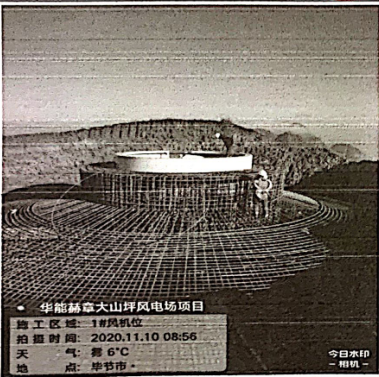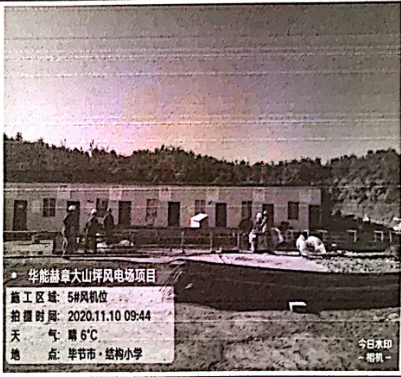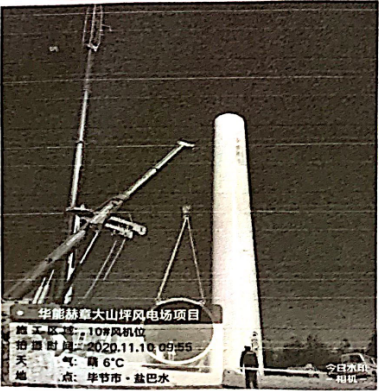文字描述	1#风机位基础钢筋绑扎	钢筋加工现场
照片	 • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 1#风机位 拍摄时间: 2020.11.10 08:55 天气: 晴 6°C 地点: 毕节市· 今日水印 - 相机 -	 • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 5#风机位 拍摄时间: 2020.11.10 09:44 天气: 晴 6°C 地点: 毕节市·结构小学 今日水印 - 相机 -
文字描述	10#风机位第3节塔筒吊装	5#风机位基础扩挖
照片	 • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 10#风机位 拍摄时间: 2020.11.10 09:55 天气: 晴 6°C 地点: 毕节市·基巴水 今日水印 - 相机 -	 • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 5#风机位 拍摄时间: 2020.11.10 17:33 天气: 晴 19°C 东风4级 湿度 33% 今日水印 - 相机 -

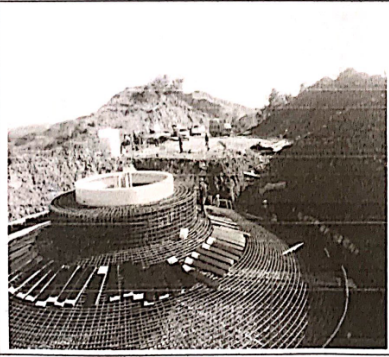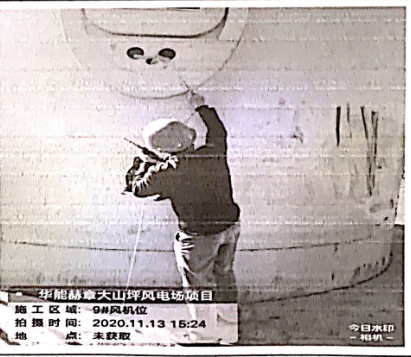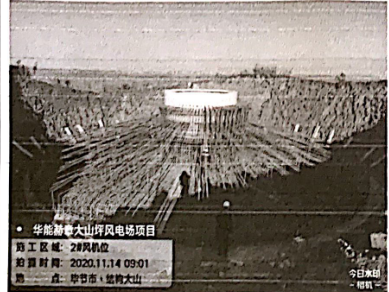

文字描述 照片	集电线路电缆沟开挖 	华能集团公司安监部领导检查 
文字描述 照片	1#风机位基础模板支护 	9#风机位接地电阻第三方检测  华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 9#风机位 拍摄时间: 2020.11.13 16:24 地点: 未获取 今日水印 相机
文字描述 照片	2#风机位基础钢筋绑扎  • 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 2#风机位 拍摄时间: 2020.11.14 09:01 地点: 毕节市·龙坪大山 今日水印 相机	1#风机位基础混凝土浇筑 
