

华能赫章县大山坪风电场项目监理周报

2021 年 6 月第 1 期

项目：贵州华能赫章县大山坪风电场项目		填报周期：2021 年 5 月 31 日-2021 年 6 月 06 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、风机基础累计浇筑完成 19 个。				
2、1#风机吊装完成，塔筒内电气安装完成 85%；2#风机塔筒、机舱、发电机吊装完成。				
3、5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#风机已经并网发电。				
4、35kV 集电线路:1 回路升压站至 5#机位高压电缆敷设完成，电缆沟回填完成，5#-4#机位集电线路电缆沟开挖完成 60%；2 回路高压电缆全部敷设完成，电缆沟回填完成；3 回路升压站至 19#机位高压电缆敷设完成，电缆沟回填完成。				
5、110kV 送出线路工程已经送电，可乐变电站内设备及施工过程资料至今没有报验。				
6、大件运输及空障迁改工程已经通车，已经到场 17 套塔筒、15 套叶片、17 台发电机、19 个机舱、19 个轮毂。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站土建工程	无			
2、风机基础工程	4#风机基础砼浇筑完成、防雷接地环网焊接完成。			
3、风机位工程	11#风机调试完成，已经并网发电。			
4、升压站电气工程	无			
5. 送出线路工程	无			
6. 风机设备吊装	1#风机轮毂叶片组装完成、吊装完成； 2#风机塔筒、机舱、发电机吊装完成，550 吨履带吊闲置一周。			
7. 集电线路工程	5#-4#风机位电缆沟回填完成 60%； 15#-18#风机位进场道路修整、碾压，确保第 17 套塔筒顺利到达 19#机位。			
8. 其他	第 16 套叶片没有到场 ，550 吨履带吊在 2#机位闲置 1 周； 已经吊装完成的机位至今没有提供第三方检测单位出具的防雷接地电阻检测报告； 吊装单位至今没有报验经过专家评审的专项吊装方案，施工现场以包代管，安全隐患较大。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
11#风机位 550 吨履带吊组装、塔筒、机舱、发电机、轮毂、叶片吊装完成。	2021.05.05	2021.5.25	2021.5.08	第 14 套叶片到场缓慢，导致吊装延迟。

1#风机位塔筒、机舱、发电机、轮毂、叶片吊装完成。	2021.05.19	2021.6.05	2021.5.23	第15套叶片5月30日到场，导致吊装延迟。
2#风机位塔筒、机舱、发电机、轮毂、叶片吊装完成。	2021.05.29		2021.6.02	暂时不确定第16套叶片进场时间。
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	第18、19台发电机、第16、17、18、19套叶片及时进场。			
未解决的协调问题解决进展	正在协调中			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站土建工程	无			
2、升压站电气工程	无			
3、风机场区工程	400吨履带吊拆解转场至3#机位并组装完成； 2#机位轮毂、叶片吊装完成，塔筒内电气安装完成，550吨履带吊转场到19#机位并组装完成。			
4、风机位基础工程	4#风机基础土方回填完成，箱变基础开挖，基础筏板浇筑完成。			
5、其他	1#-5#机位集电线路电缆沟开挖，吊装完成一台风机，就要及时并网发电；			

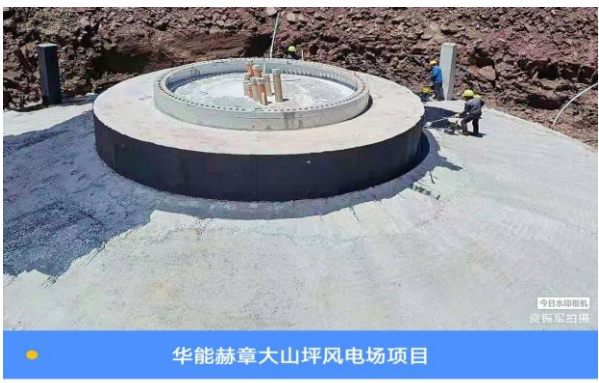
填报人：_____ 审核人：_____ 时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	4#风机基础钢筋验收 5月31日星期一	5#-4#机位集电线路电缆沟开挖 5月31日星期一
照片	 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域：4#机位 监理责任人：秦福章 施工内容：风机基础钢筋验收 拍摄时间：2021.05.31 19:07 施工责任人：王朝联 建设单位：华能赫章风力发电有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：中州建设有限公司	

文字描述	4#风机基础环水平度复测 5月31日星期一	第15套叶片第三片到达1#机位 5月31日星期一
照片	 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 4#机位 施工内容: 基础环水平度复测 施工责任人: 王朝联 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司	 华能赫章大山坪风电场项目 施工内容: 第15套叶片牵引上山 施工责任人: 张海东 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司
文字描述	4#风机基础砼浇筑 5月31日星期一	1#机位轮毂叶片组装 6月01日星期二
照片	 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 4#机位 施工内容: 风机基础砼浇筑 施工责任人: 王朝联 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司	 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 1#机位 施工内容: 轮毂叶片组装作业 施工责任人: 张海东 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司
文字描述	4#风机基础砼浇筑 6月01日星期二	1#风机位钱俊周主任到现场检查工作 6月02日星期三
照片	 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 4#机位 施工内容: 风机基础砼浇筑 施工责任人: 王朝联 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司	

文字描述	4#风机基础砼浇筑完成养护中 6月02日星期三	第7套塔筒到场 6月03日星期四
照片		
文字描述	5#-6#-7#机位集电线路电缆沟土方回填 6月03日星期四	3#机位第17台发电机牵引到场 6月04日星期五
照片		
文字描述	“安全生产月”安全宣贯会议及学习 6月04日星期五	1#风机轮毂叶片吊装完成 6月05日星期六
照片		

文字描述	3#风机位第 17 台发电机卸货 6 月 05 日星期六	19#风机位第 17 套塔筒卸货 6 月 05 日星期六
照片	 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 3#机位 监理责任人: 李连明 施工内容: 第17台发电机卸车 拍摄时间: 2021.06.05 星期六 施工责任人: 张海东 建设单位: 华能赫章风力发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司	 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 19#机位 监理责任人: 李连明 施工内容: 第17套塔筒卸货 拍摄时间: 2021.06.05 星期六 施工责任人: 张海东 建设单位: 华能赫章风力发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司
文字描述	4#风机基础防腐作业 6 月 06 日星期日	1#堆场第 19 台机舱卸货 6 月 06 日星期日
照片	 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 4#机位 监理责任人: 许青松 施工内容: 风机基础防腐作业中 拍摄时间: 2021.06.06 星期日 施工责任人: 王朝联 建设单位: 华能赫章风力发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司	 华能赫章大山坪风电场项目 施工内容: 第19台机舱到场卸货 监理责任人: 李连明 施工责任人: 张海东 拍摄时间: 2021.06.06 星期日 建设单位: 华能赫章风力发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司
文字描述	1#风机位箱变安装就位 6 月 06 日星期日	5#-4#风机位集电线路电缆沟人工清理 6 月 06 日星期日
照片	 华能赫章大山坪风电场项目 施工区域: 1#机位 监理责任人: 秦福章 施工内容: 箱变吊装就位 拍摄时间: 2021.06.06 星期日 施工责任人: 衡文伟 建设单位: 华能赫章风力发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司	 华能赫章大山坪风电场项目 施工内容: 5#-4#机位集电线路 监理责任人: 李连明 电缆沟人工清理 拍摄时间: 2021.06.06 星期日 施工责任人: 衡文伟 建设单位: 华能赫章风力发电有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司
