

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2019年 12 期

项目名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目		填报周期: 2019.07.29-2019.08.04
本周工作如下: 1、综合楼基础开挖;五牌一图安装;警卫室活动板房就位,基坑防护钢管进场。 2、召开第十次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-010 递交至业主、施工方。 3、现场巡视检查发现综合楼基坑防护围栏未安装,要求施工单位基坑开挖完成后,尽快对基坑进行安全防护,安装防护围栏及安全警示标识牌。 4、基坑防护围墙立柱安装;勘察、设计单位人员来现场参加建设、监理、施工五方综合楼验槽,可以进入下一工序施工;现场土方防尘网覆盖。 5、现场检查发现个别施工人员未穿戴安全帽、反光马甲,已口头要求必须穿戴安全帽、反光马甲,现场已整改完成。 6、下发监理通知单 JXM7-JL-003、工程处罚单 001。 7、综合楼垫层模板支撑;去商砼站考察;下发工程处罚单 002;现场巡视检查发现现场发电机随处乱放,无安全保护措施,要求现场柴油发电机存放于指定区域,并检查机器安全防护装置是否齐全有效。 8、综合楼基础垫层支模板,加工区平整,进场道路旁土方回填;现场巡视检查施工质量、安全,发现钢筋未堆放在指定区域内,划分区域地面未硬化;电锯未安装安全防护挡板、防护罩;材料进场吊装时升压站施工班组安全员未到场;下发监理通知单 004,要求施工单位钢筋堆放区周一前达到正常使用条件;尽快整改现场临时用电问题;尽快上报施工班组安全员上报监理备案。 9、检查钢筋材料进场质量;针对施工单位周五前未上报施工节点时间计划,下发工程处罚单 003。 10、综合楼垫层混凝土浇筑;钢筋场地地面硬化;扩宽道路路基回填。 11、检查综合楼垫层模板支护;提取试块两组;进行混凝土塌落度检查;对综合楼基础垫层浇筑全程旁站。		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、道路工程	现场道路清表及风机吊装平台施工已全部完成	
2、开关站/升压站	升压站放线清表施工	
3、综合楼/附属建筑	综合楼基础垫层模板支护、混凝土浇筑;钢筋进场	
4、风机基础施工		
5、风机吊装		
6、箱变		
7、送出工程		


(含对侧)				
8、现场调试				
9、出图情况	目前已提供 2.0 风机基础、综合办公楼电子版图纸及综合办公楼结构蓝图			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况, 累计到货 (), 已到货数量 () % 延误原因及催货措施
11、人员/机械情况	施工人员 16 人, 铲车一台, 挖机一台, 翻斗车一台, 振捣棒一根			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施 (简述)
1、首台风机基础施工				
2、首台风机吊装				
3、线路倒送电				
4、首台风机发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	锚栓进场计划及提供设计图纸下发时间; 现场道路部分位置不能满足运输车通过; 现场施工人员较少; 要求综合楼基坑进行钎探或环刀取样送检试验			
未解决的协调问题解决进展	锚栓进场时间不确定, 设计图纸会尽快下发; 风机运输公司人员通过现场查看建议对部分位置进行加宽, 待业主现场查看后确定; 综合楼基坑钎探或环刀取样送检试验, 经协调等待设计院给予回复。			

五、下周计划主要工作内容

- 1、综合楼基础垫层浇筑；完成各材料的见证取样工作。
- 2、熟悉综合办公楼结构、升压站图纸。
- 3、主持召开第十一次监理例会，施工单位汇报道路施工质量、安全文明施工情况。
- 4、加大施工现场施工质量、安全管理力度。
- 5、整理项目监理资料。
- 6、继续做好新进人员入场前安全教育培训工作，确保人员受控。

填报人： 刘晨瑞 审核人： 刘士发 时间： 2019年 08月 04 日

工程现场照片（含文字描述）：

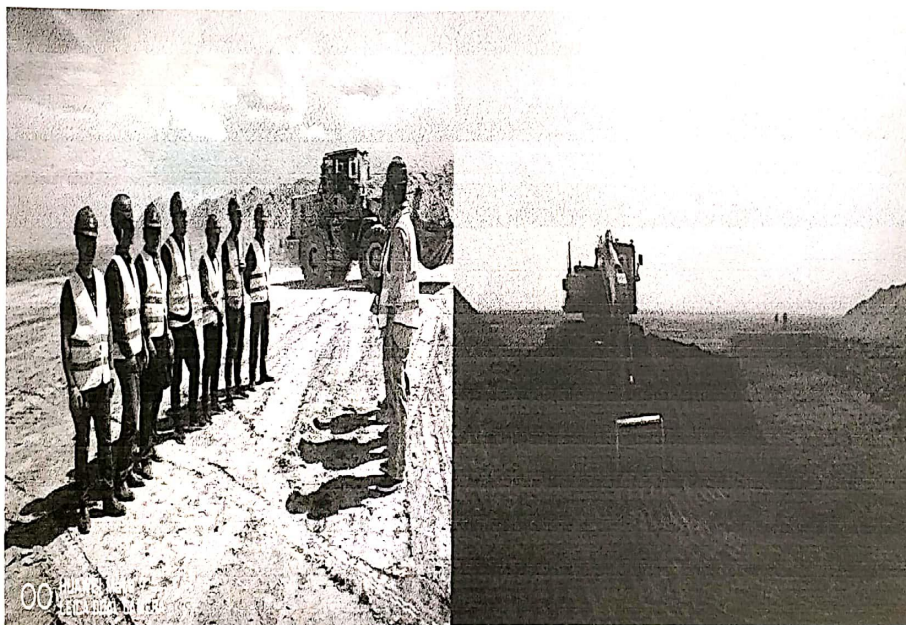

2019.07.29 施工单位对施工班组进行安全
及技术交底

2019.07.29 现场巡视检查综合楼基坑开挖
施工



2019.07.29 主持召开第十次监理例会




2019.07.29 综合楼基槽土方开挖

2019.07.30 综合楼地槽设计、勘察、
施工、建设、监理五方验收




2019.07.31 华能公司督导组现场检查工作

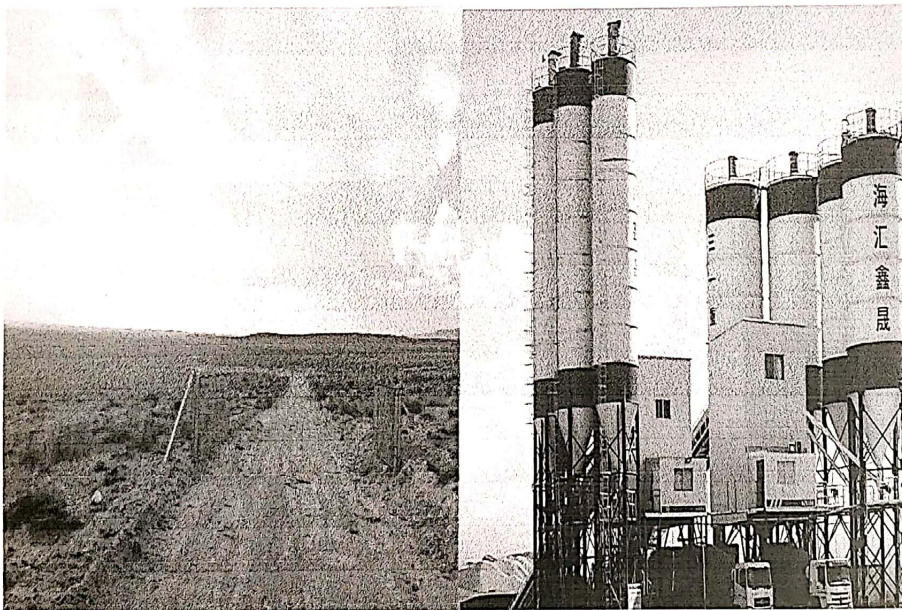

2019.08.02 进出车辆未随车辆进出随时
关闭移动门

2019.08.02 考察供应商矸石厂家

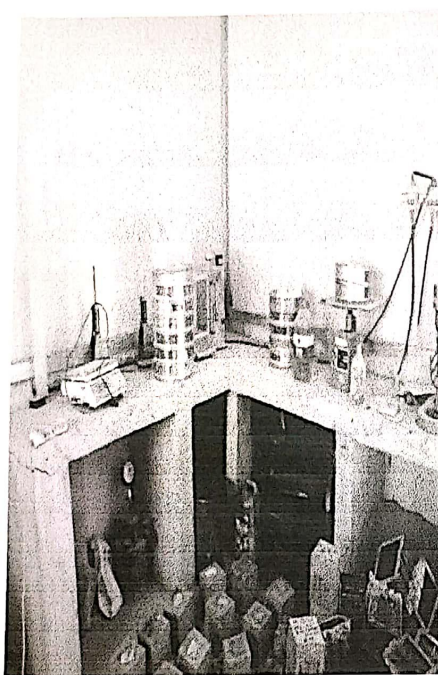

2019.08.02 商砼厂家试验室




2019.08.02 升压站综合楼地基清槽垫层
支模



2019.08.02 现场发电机随处乱放，没有
安全保护措施



2019.08.03 现场油漆与柴油放在一起，
存在安全隐患

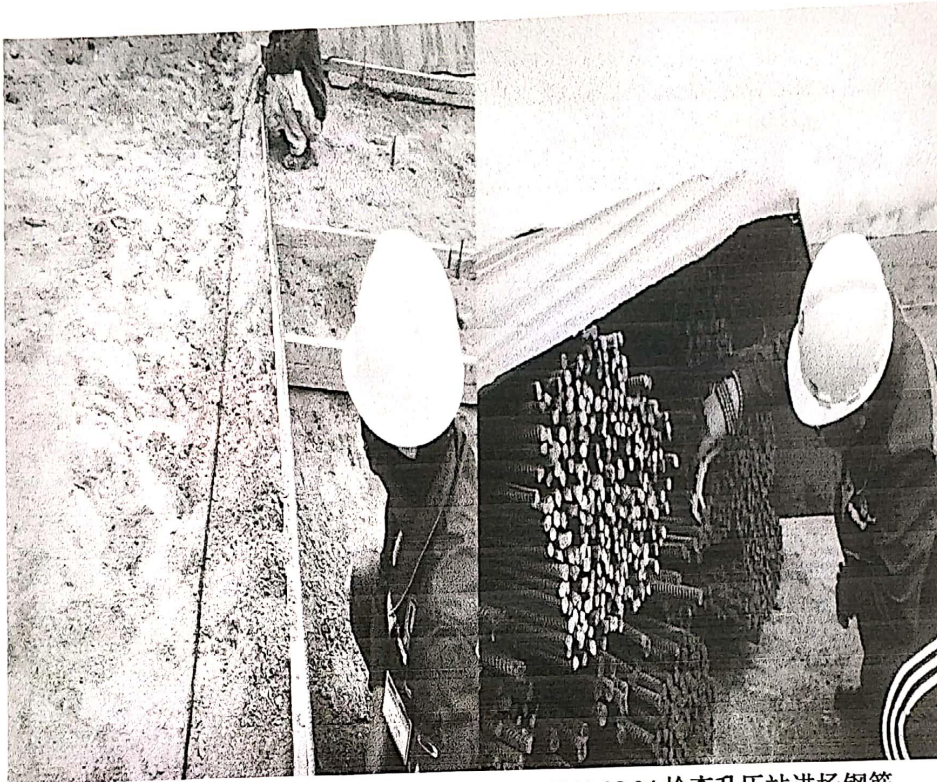


2019.08.04 验收综合楼基础垫层模板

2019.08.04 检查升压站进场钢筋



2019.08.04 混凝土塌落度检查

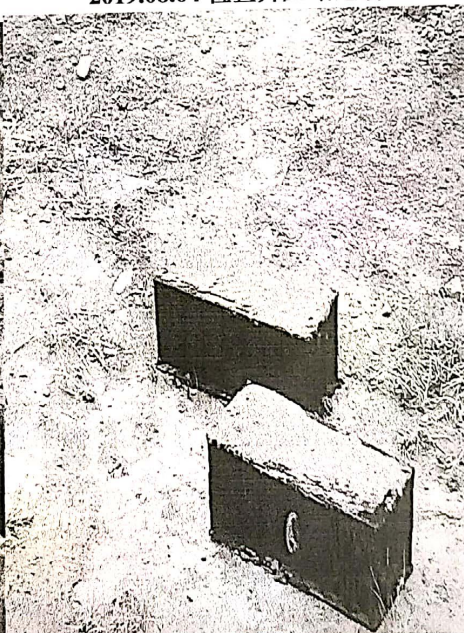

2019.08.04 综合楼基础垫层见证提取同条件养护试块



2019.08.04 对升压站综合楼基础垫层浇筑砼



2019.08.04 对升压站综合楼基础垫层浇筑进行旁站
