

监 理 周 报

项目名称：中粮可口可乐饮料（济南）有限公司 3.7MW 光伏发电项目

业主单位：济南亚新能太阳能科技有限公司 业主代表：赵卫宙

总监（代）：徐耀生 监理人员：刘万斌 汇报时间：2019.7.26

项目开工日期：2019.7.9 项目计划竣工日期：2019.10.5

一、土建工程

序号	工程名称	开工日期	计划完工日期	全部工程量(%)	本周进度(%)	总进展量(%)	滞后时间(天)	备注
1	夹具安装	2019.7.9	2019.7.15	100%	40%	60%	5	
2	支架安装	2019.7.9	2019.7.15	100%	40%	60%	5	
3	组件安装			100%				
4	建筑物(箱、逆变等)	2019.7.23	2019.7.30	100%	30%	30%	7	
5				100%				

二、电气工程

序号	工程名称	开工日期	计划完工日期	全部工程量(%)	本周进度(%)	总进展量(%)	存在问题	滞后时间(天)	备注
1	主电缆施放			100%					
2	逆变器安装			100%					
3	箱变安装			100%					
4	主控室电气安装			100%					
5									

三、现场施工人员配置情况

1. 夹具、支架、组件安装人员数量 （ 30 ） 人
2. 建筑物、电缆沟施工人员数量 （ 15 ） 人
3. 主电缆施工人员数量 （ ） 人
4. 全部电气安装人员数量 （ ） 人
5. 其他人员数量 （ 5 ） 人

四、存在问题及原因分析和拟采取的措施（附图片）：

现场未确定具体停电时间、施工单位施工进度较慢

五、对下周计划进度的预测及采取的措施：


- 1、下周计划 1 期厂房屋面支架安装全部完成。
- 2、1#、2#箱变基础全部完成。
- 3、3 期厂房屋面组件安装完成 70%。

六、需公司（业主）协调的材料、图纸等问题及建议：

七、现场主要施工图片：



1#箱变基础砌筑

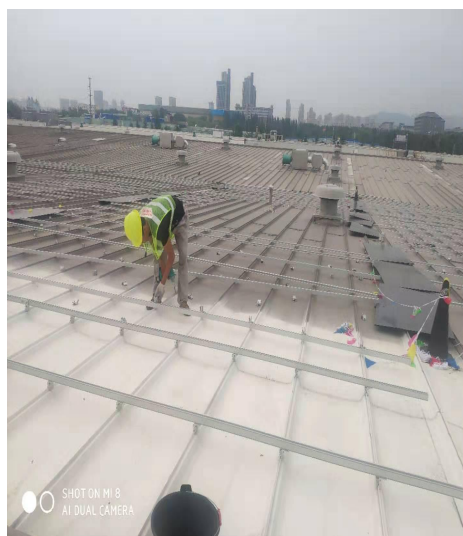

1 期厂房屋面支架安装

常州正衡电力工程监理有限公司

可口可乐项目监理部
