
南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 15 期

编 制 时 间：2019.09.22

监理单位编制人：韩文庆

监理单位审核人：徐耀生

常州正衡电力工程监理有限公司

南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

监理部

项目名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

建设单位：南京梁泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：先能电力工程有限公司

一、工程概况：

本工程装机容量为 15MWp。利用西区车棚建设 8MWp，利用两处车间屋顶建设 7MWp。工程地点：江苏省南京市栖霞区红枫科技园。

二、施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1	西区车棚基础	基础砼	20%	10%	70%
		钢筋	0%	5%	80%
		预埋件	0%	5%	80%
	员工车棚	基础砼	0%	0%	95%
		钢筋	0%	0%	95%
		预埋件	0%	0%	95%
2	车棚接地	环网接地	0%	0	20%
		垂直接地	0	0	15

3	车棚埋管	DN32 热镀锌钢管	0%	0%	0%
		DN50 热镀锌钢管	0	0	0
4	电缆沟	电缆沟	0	0	0
5	西区路面 破碎	硬化地面 破碎	0%	10%	80%
6	员工车路面 破碎	硬化地面 破碎	0%	0%	85%

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电气安装等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/

3、进度情况分析：

本周施工人员平均每天 16 人。西区车棚钢筋绑扎完成 80%，预埋件安装完成 80%，混凝土浇筑完成 70%，西区车棚路面破碎完成 80%

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	（进场材料、构配件、设备）名称	进场时间（年月日）	进场数量（单位）	拟用部位
1	钢筋	2019 年 6 月 26 日	6 吨	车棚基础钢筋网片
2	钢筋	2019 年 6 月 29 日	9 吨	车棚基础钢筋网片
3	Φ 65 镀锌钢管	2019 年 7 月 4 日	8 根	车棚垂直接地体
4	Φ 50 镀锌钢管	2019 年 7 月 4 日	120 根	车棚预埋线管

5	Φ32 镀锌钢管	2019 年 7 月 4 日	80 根	车棚预埋线管
6	40×4 镀锌扁钢	2019 年 7 月 4 日	200 根	车棚水平接地体

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：韩文庆、马少经

2、施工单位：先能电力工程有限公司

(1) 管理人员：付乐勇

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	钢筋 6 吨	平行检查记录表 JZL5-NJBT-001
		/	/
		/	/
		/	/
		/	/
2	监理旁站项目	/	/
		/	/
		/	/
		/	/
		/	/
3	施工质量检查记录	基础钢筋网片	监理检查记录表 JXM13-NJBT-002
		车棚基础地面切割	监理通知单 JXM7-NJBT-001
		西区车棚基础施工	监理检查记录表 JXM13-NJBT-002、003、004/005/006/007
		/	/
		/	/
4	隐蔽工程质量验收	/	/
		/	/
		/	/
		/	/
		/	/
5	分部分项工程	/	/
		/	/

	验收	/	/
		/	/
		/	/
6	其他	/	/
		/	/
		/	/
		/	/

七、施工质量问题

1、无。

八、安全文明施工

暂无

九、沟通协调

蓝图交付进度滞后需协助沟通

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

无

十一、天气统计表。

日期 天气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴	晴	晴		晴	晴		
雨							
阴			阴			阴	阴
雾							
温湿度	20~27℃	19~28℃	21~28℃	19~27℃	18~29℃	19~30℃	16~29℃

十二、监理工作统计表：

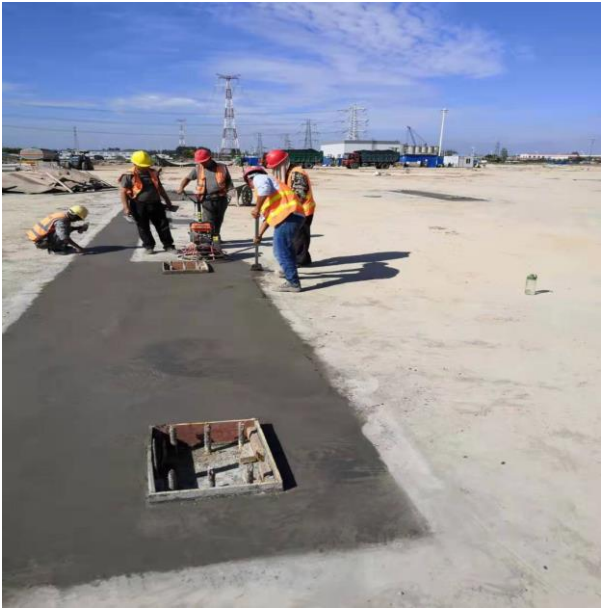
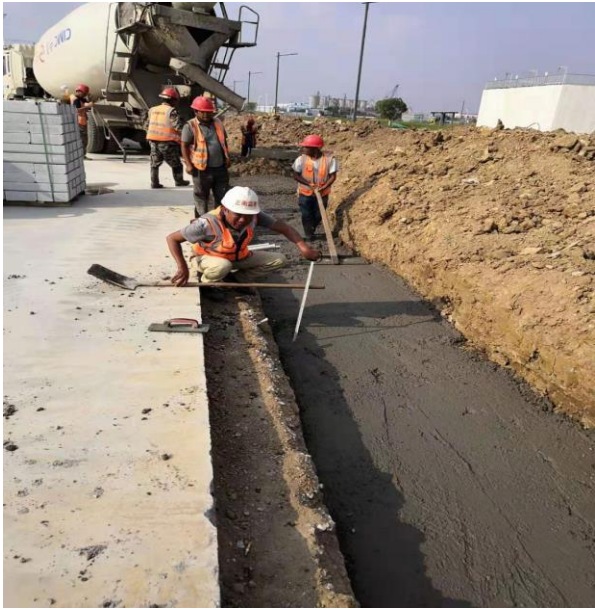
序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议	次	1	11	
2	审批施工组织设计（方案）				
3	审核施工图纸				
4	发出监理通知	次	1	12	
5	审批分包单位				
6	原材料审批	次		2	
7	构配件审批				
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收				
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收				
12	监理抽查复试	次		1	
13	监理见证取样	次		1	
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				

十三、本周监理工作小结：

1、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	西区车棚基础二次浇筑	西区车棚电缆沟垫层浇筑
图片		
文字描述	西区车棚电缆沟开挖	西区车棚基础二次浇筑
图片		

二、质量问题影像

文字描述	西区车棚基础二次浇筑拆模过早致使掉角	
图片		

三、质量检查影像

文字描述	车棚基础砼强度检查	车棚基础砼强度检查
图片		



四、安全文明施工影像

文字描述		
图片		
