
南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

监 理 周 报

第 35 期

编 制 时 间：2020.04.05

监理单位编制人：韩文庆

监理单位审核人：徐耀生

常州正衡电力工程监理有限公司

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

监理部

项目名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

建设单位：南京梁泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：先能电力工程有限公司(土建工程)

宁夏运鼎新能源有限公司（钢构安装工程）

中易建设有限公司（电气安装工程）

一、 工程概况：

本工程装机容量为 15MWp。利用西区车棚建设 8MWp，利用两处车间屋顶建设 7MWp。工程地点：江苏省南京市栖霞区红枫科技园。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1	西区车棚基础	基础砼	0%	0%	100%
		钢筋	0%	0%	100%
		预埋件	0%	0%	100%
	员工车棚	基础砼	0%	0%	100%
		钢筋	0%	0%	100%
		预埋件	0%	0%	100%
2	车棚接地	环网接地	0%	0%	100%

3	车棚埋管	DN32 热镀锌钢管	0%	0%	100%
		DN50 热镀锌钢管	0%	0%	100%
4	电缆沟	电缆沟	0%	0%	100%
5	西区路面 破碎	硬化地面 破碎	0%	0%	100%
6	员工车路面 破碎	硬化地面 破碎	0%	0%	100%
7	员工车棚钢 结构安装	钢构件到货率	0%	0%	100%
		安装进度	0%	0%	100%
8	成品车棚钢 结构安装	钢构件到货率	0%	0%	100%
		安装进度	0%	0%	100%

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电气安装等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1	员工车棚	组件安装	0%	0%	100%
2	成品车棚	组件安装	0%	0%	100%
3	焊装车间	组件安装	0%	0%	100%
4	总装车间	组件安装	4%	0%	96%
5	总装车间	电缆桥架安装	5%	5%	95%
6	总装车间	电缆敷设	5%	5%	95%
7	/	/	/	/	/

3、进度情况分析：

进度正常

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	（进场材料、构配件、设备）名称	进场时间 （年月日）	进场数量 （单位）	拟用部位
----	-----------------	---------------	--------------	------

1	钢筋	2019 年 6 月 26 日	6 吨	车棚基础钢筋网片
2	钢筋	2019 年 6 月 29 日	9 吨	车棚基础钢筋网片
3	Φ 65 镀锌钢管	2019 年 7 月 4 日	8 根	车棚垂直接地体
4	Φ 50 镀锌钢管	2019 年 7 月 4 日	120 根	车棚预埋线管
5	Φ 32 镀锌钢管	2019 年 7 月 4 日	80 根	车棚预埋线管
6	40×4 镀锌扁钢	2019 年 7 月 4 日	200 根	车棚水平接地体
7	钢构	2019 年 10 月 23 日	130 吨	员工车棚
8	钢构	2019 年 11 月 15 日	400 吨	成品车棚
9	组件	2019 年 11 月 20 日	1836 块	员工停车场
10	组件	2019 年 11 月 23 日	1836 块	员工停车场
11	支架	2019 年 11 月 19 日		屋面
12	支架	2019 年 11 月 22 日		螺栓配件
13	变压器	2019 年 12 月 16 日	3 个	屋面变压器
14	高压开关柜	2019 年 12 月 16 日	7 个	焊装屋面高压开关柜

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：韩文庆

2、施工单位：先能电力工程有限公司(土建工程)

宁夏运鼎新能源有限公司（钢构安装工程）

中易建设有限公司（电气安装工程）

（1）管理人员：付乐勇（土建）

朱 强（钢构安装）

杨勇（电气安装）

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	/	/
		/	/
		/	/
		/	/
		/	/
2	监理旁站项目	/	/
		/	/
		/	/
		/	/
		/	/
3	施工质量检查记录	/	/
		电缆盖板切割	监理通知单 JXM7-NJBT-004
		组件挡风板安装、电缆桥架盖板安装	监理检查记录表 JXM13-NJBT-011、012、013
		/	/
		/	/
4	隐蔽工程质量验收	/	/
		/	/
		/	/
		/	/
		/	/
5	分部分项工程验收	/	/
		/	/
		/	/
		/	/
		/	/
6	其他	/	/
		/	/
		/	/
		/	/

七、施工质量问题

1、厂区基建部对我方所有已建工程验收检查，发现存在以下问题：

桥架盖板切割防护不到位需整改，屋面卫生清理不到位需整改，需加强施工人员安全文明施工形象。

八、安全文明施工

1、物料区需要从新堆放 (先能电力工程有限公司)

2、现场施工区域烟头、施工垃圾较多需要及时清理

各施工工序需达到文明施工场地要求（中易建设有限公司）

九、沟通协调

无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

暂无。

十一、天气统计表。

日 期 天 气	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
晴				晴	晴	晴	晴
雨							
阴	阴	阴	阴				
雾							
温湿度	5~17℃	5~15℃	6~20℃	7~21℃	8~22℃	7~23℃	7~20℃

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议	次	1	24	
2	审批施工组织设计（方案）				
3	审核施工图纸				
4	发出监理通知	次	1	12	
5	审批分包单位				
6	原材料审批	次		15	
7	构配件审批			10	
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收	次	3	3	
10	分部（子分部）工程质量验收	次	3	3	
11	不合格项验收				

12	监理抽查复试	次		10	
13	监理见证取样	次		10	
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				

十三、本周监理工作小结：

- 1、 本周主要对总装车间、焊装车间检查电缆桥架盖板施工、光伏线缆敷设、卫生清理、组件挡风板安装、并网设备的查看等；

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

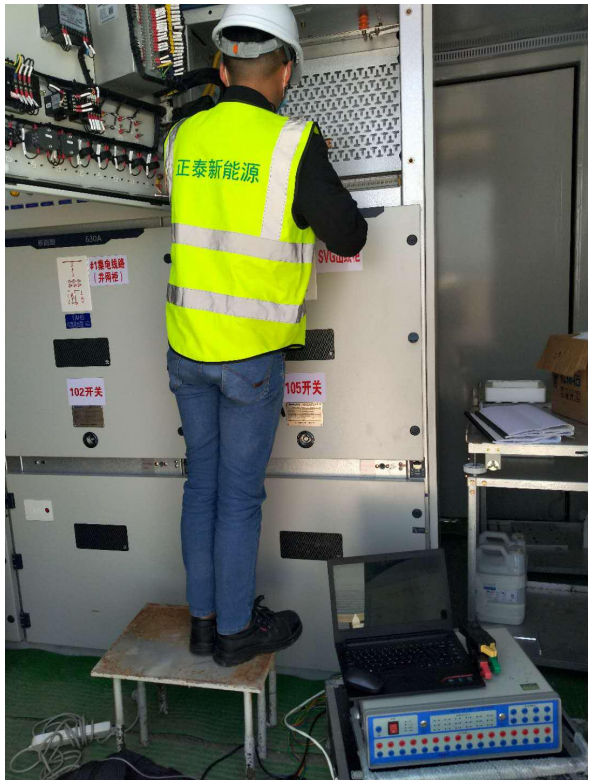
文字描述	总装车间桥架盖板切割、组件挡风板安装	
图片		

二、质量问题影像

文字描述	防水修补	材料堆放差存在破坏屋面防水隐患
------	------	-----------------

图 片		
----------------	---	--

三、质量检查影像

文字 描述	设备检查检测	
图 片		

四、安全文明施工影像

文字 描述	登高作业未佩带安全带
------------------	-------------------

图
片

