

华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶
光伏发电项目

监 理 周 报

第 一 期

(2019年6月20日-2019年6月28日)



扫描全能王 创建

工程名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目	建设单位	华能新能源盘州市风力发电有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	西安热工研究院有限公司		
本周施工内容及进度	1、预制支架基础模板制作，预制支架基础混凝土浇筑 24 块。 2、支架、混凝土基础、组件吊装至辅助综合用房。 3、支架、组件安装完成 630 发电要求。 4、直流电缆穿管，逆变器安装接线，交流电缆敷设，临时并网柜安装接线完成。 5、并网前电缆线路检查试验，6.28 早上成功发电，完成 630 部分并网要求。		
下周计划	1、屋顶支架基础模板制作，制作支架预制混凝土基础。 2、准备车棚基础施工。 3、考察轿子顶实地施工情况，进行施工安排。 4、大爬山屋顶支架基础定位放线。		
安全文明施工情况	1、进场工人已进行安全三级教育。 2、进场工人已佩带好安全帽。 3、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、对现场支架基础模板进行尺寸核对，符合要求。 2、组件、逆变器开箱检查，外观完好，设备符合要求。 3、检查支架、组件安装，组件安装不够平整。		
设备材料进场情况	1、支架、组件、直流、交流电缆进场，对材料设备相关资料进行检查。		
人员机械情况	人员:6 人 搅拌机 1 台，切割机 1 台，		



施工技术交底会议



施工记录

天气: 阴 19度 南风<3级 湿度90%
 经纬度: 104.5328703
 地址: 25.6718480
 地点: 六盘水市盘县在大关附近
 工程名称: 华能大龙山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目
 时间: 2019-06-24 19:11:00

吊装组件, 支架, 支架基础



施工记录

天气: 阴 104.5331639
 经纬度: 25.6717658
 地址: 25.6717658
 地点: 华能大龙山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目
 时间: 2019-06-24 17:44:27

组件开箱




施工记录

天气: 阴 22度 东南风<3级 湿度77%
 经纬度: 104.5332618
 地址: 25.671832
 地点: 六盘水市盘县在大关附近
 工程名称: 华能大龙山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目
 时间: 2019-06-25 14:32:51



变压器开箱检查

组件角度测量

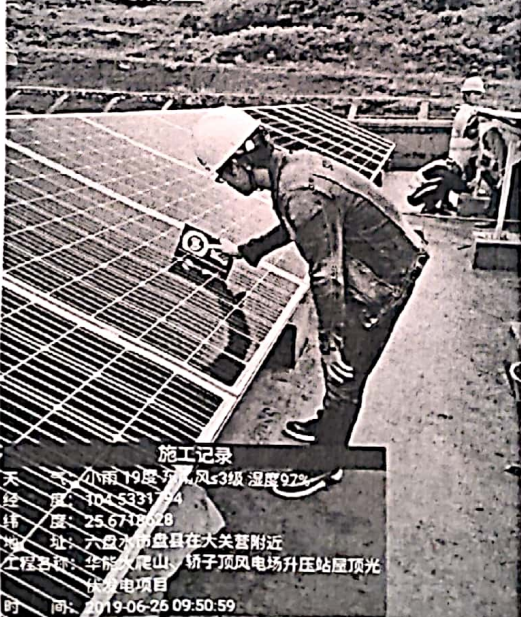

施工记录

天气: 小雨 19度 东南风<3级 湿度97%
 经纬度: 104.5331724
 地址: 25.671828
 地点: 六盘水市盘县在大关附近
 工程名称: 华能大龙山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目
 时间: 2019-06-26 09:50:59

并网前送电测试



施工记录

天气: 阴 24度 东南风<3级 湿度75%
 经纬度: 104.5325047
 地址: 25.6717223
 地点: 六盘水市盘县在大关附近
 工程名称: 华能大龙山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目
 时间: 2019-06-27 19:17:11



扫描全能王 创建
