

华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶
光伏发电项目

监 理 周 报

第 十 期



(2019年8月25日-2019年8月30日)

| | | | |
|-----------|---|------|------------------|
| 工程名称 | 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 | 建设单位 | 华能新能源盘州市风力发电有限公司 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | |
| 施工单位 | 西安热工研究院有限公司 | | |
| 本周施工内容及进度 | <ul style="list-style-type: none"> 1、护坡打孔安装连接支座，支架安装完成。 2、大爬山支架到场，轿子顶支架已补全。 3、轿子顶水泵房、35KVSVG室、仓库、35KV开关室屋顶支架安装。 4、大爬山光伏组件8月31号到场卸货，轿子顶光伏组件已到松河。 | | |
| 下周计划 | <ul style="list-style-type: none"> 1、组件安装。 2、逆变器、汇流箱、并网柜、电缆等设备陆续进场。 | | |
| 安全文明施工情况 | <ul style="list-style-type: none"> 1、进场工人已进行安全三级教育。 2、进场工人已佩带好安全帽。 3、现场已竖立好安全文明标牌。 | | |
| 施工质量 | <ul style="list-style-type: none"> 1、对现场安全进行检查，符合要求。 2、组件吊装进行旁站，符合要求 3、现场安全文明标识牌已放置，符合安全施工要求。 | | |
| 设备材料进场情况 | <ul style="list-style-type: none"> 1、组件已到货。 2、逆变器、汇流箱、并网柜、电缆等设备陆续发货。 | | |
| 人员机械情况 | 施工人员:4人 切割机1台 | | |

svg室屋面安装支架




施工记录

天气: 阴 24度 北风<3级 湿度88%
经度: 104.6527050
纬度: 26.0614212
地址: 六盘水市盘县在小米罗附近
工程名称: 华能大禹山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目
时间: 2019-08-27 15:39:18



摆放基础

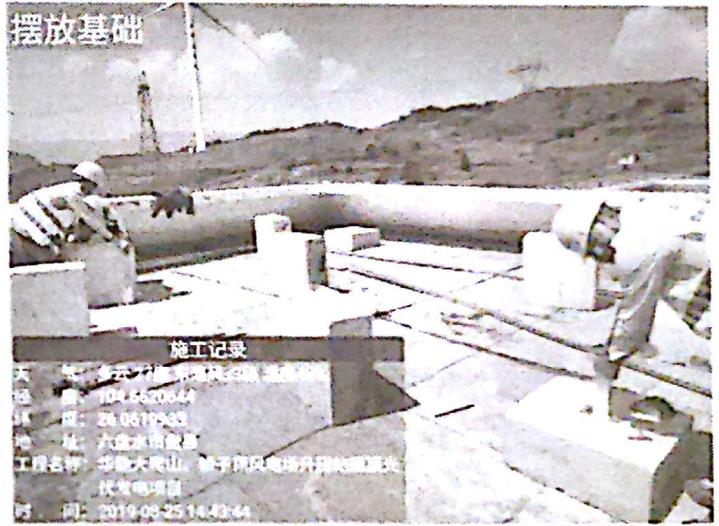

施工记录

天气: 多云 22度 北风<3级 湿度88%
经度: 104.6520644
纬度: 26.0619593
地址: 六盘水市盘县
工程名称: 华能大禹山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目
时间: 2019-09-25 14:43:44

