

新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目(一期 1.9MW)

监 理 周 报

第 6 期

编 制 时 间：2019.08.25

监理单位编制人：李连明

监理单位审核人：徐耀生

常州正衡电力工程监理有限公司

新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目（一期 1.9MW）

监理部

项目名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：湖南沪变电力技术有限公司

一、 工程概况：

河南新乡达新源 3.9MW 屋顶光伏发电项目位于河南省新乡市卫辉市唐庄镇,东经 113° 51' , 北纬 35° 25' , 年有效日照相当于峰值日照 1086 小时。采用分布式光伏发电,在达新源厂区 1#、4#(部分)两栋厂房房顶安装光伏发电板,建设规模 1.9MW(一期),在厂区 2#、4#(部分)两栋厂房房顶安装光伏发电板 1.5mw(二期厂房设备安装中,十月底投运交付施工),本项目规划建设 3.9MW,太阳能光伏组件选用 330Wp,每 18 块组件串联成一串后接入组串式逆变器把直流电转换为交流电,经交流汇流箱低压配电柜接入厂区低压母排光伏并网发电。达新源厂区屋顶面积约 45565m²,该厂房为 2017 年建设项目,屋顶均为彩钢瓦屋顶。

二、 施工概述:(包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述)

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程(土方工程、支架基础、场地及地下设施、建(构)筑物、设备基础、电缆沟等)

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量(%)
1					
2					
3					
4					
5					

2、安装工程(支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

架空线路及电缆、其他电气安装等)

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量(%)
1	夹具安装	1号厂房夹具安装		100%	100%
2	导轨安装	1号厂房导轨安装		100%	100%
3	桥架安装	1号厂房桥架安装		70%	70%
4	检修通道安装	1号厂房检修通道安装		50%	50%
5					

3、进度情况分析:

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	(进场材料、构配件、设备)名称	进场时间 (年月日)	进场数量 (单位)	拟用部位
1				
2				
3				
4				
5				
6				

五、现场人员配置情况

1、监理单位:常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员:李连明

2、施工单位:

(1) 管理人员:丁松

六、施工质量检查情况

序	检查验	具体内容	对应形成文件名称
---	-----	------	----------

号	收内容		
1	材料、构配件、设备进场验收		
2	监理旁站项目	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5	
3	施工质量检查记录	1、巡视	平行检验记录表 001
		2、	
		3、	
		4、	
		5、	
4	隐蔽工程质量验收	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5	
5	分部分项工程验收	1、	
		2	
		3	
		4	
		5	
6	其他	1	
		2	
		3	
		4	

七、施工质量问题

- 1、1号施工屋面一节桥架表面有锈点。
- 2、1号施工屋面个别检修通道夹具未紧固。

八、安全文明施工

要求现场施工人员每天开早会进行安全技术交底

九、沟通协调

无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

2、工程签证：无

3、其他：无

十一、天气统计表。

日期 天气	5	6	7	8	9	10	11
晴	晴				晴		晴
雨				雨		雨	
阴		阴	阴				
雾							
温湿度							

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议		1	4	
2	审批施工组织设计（方案）		1	1	
3	审核施工图纸		1	1	
4	发出监理通知，联系单		1	4	
5	审批分包单位				
6	原材料审批		6	6	
7	构配件审批				
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收				

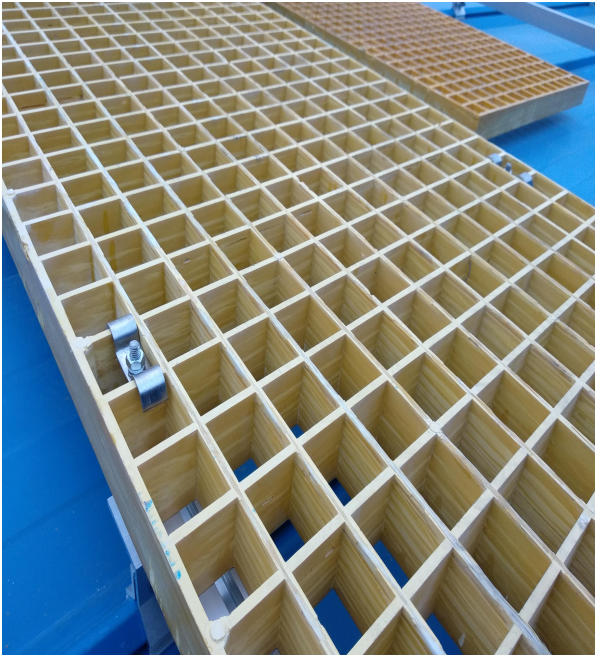
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收				
12	监理抽查复试				
13	监理见证取样				
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				

十三、本周监理工作小结：

- 1、施工人员 1 号厂房安装桥架。
- 2、施工人员 1 号厂房安装检修通道。
- 3、1 号厂房安装检修通道和检修通道支架玩不完成。

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	1 号厂房屋面安装检修通道	1 号厂房安装桥架
图片		
文字描述	1 号厂房桥架夹具安装	1 号厂房安全通道夹具安装
图片		

二、质量问题检查影像

文字描述	1 号厂房个别桥架有锈点	1 号厂房屋面垃圾清理
图片		
