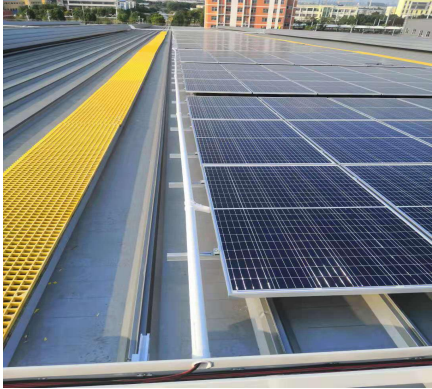


正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 第 12 期

项目：昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目			填报周期：2019 年 10 月 12 日—10 月 18 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
1、屋面夹具安装完成 100%；导轨安装完成 100%；				
2、组件安装累计完成 4850 块，完成 81%；剩余 130 块暂不安装，留做 TUV 检测使用。				
3、桥架安装完成 90%，25 个逆变器全部安装完成，4 个并网柜安装完成；				
4、交流电缆已敷设完成 100%，直流电缆敷设完成 100%，通信电缆敷设完成 100%；				
5、环境监测仪安装完成；				
6、项目并网完成；				
7、屋面直流电缆、接地扁铁、清洗系统水管材料已吊装完成；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、人员进场		7 人		
2、电缆敷设		直流电缆敷设完成 100%；通信电缆敷设完成 100%；		
3、材料吊装		接地扁铁、清洗系统水管吊装完成		
4、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	直流电缆进场	2019.10.13	2019.10.13	本周直流电缆到货 3000 米，累计到货数量 100%
6、人员/机械情况		施工人员 7 人 管理人员 3 人		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、 电缆敷设	2019.9.10	46	2019.10.16	受前期天气影响，进度滞后，要求施工单位增加施工人员，现已敷设完成
2、接地防雷清洗系统	2019.8.20			现材料已到位，开始进行施工。
3、项目验收	2019.9.24			前期雨天较多，项目延期，进度滞后。
四、主要协调问题及解决情况				

提出需要协调的问题	督促施工单位尽快完成接地、清洗系统、检修通道、视频监控施工，尽快进行项目验收
未解决的协调问题解决进展	
五、下周计划主要工作内容	
1、接地扁铁施工。 2、清洗系统施工。 3、直流电缆接线施工。	
六、本周现场施工照片	
 直流电缆吊装  直流电缆敷设  接地扁铁散料  直流电缆穿管	

填报人：王超 时间：2019 年 10 月 18 日
