

联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 1 期

编 制 时 间：2019.10.19

监理单位编制人：何柏林

监理单位审核人：王国富

常州正衡电力工程监理有限公司

联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理部

项目名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

建设单位：正泰新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：安徽臻杰建设工程有限公司

一、工程概况：

合肥联宝电子科技有限公司 1#、2#、3#、4#、5#、6#厂房因屋顶需安装光伏。经研究，对现有结构进行加固处理，施工单位上报加固方案及工期进度表并按照加固方案进行。

二、施工概述：（包含厂房钢结构加固工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

三、工程项目进度情况一览表

1、厂房钢结构加固工程

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1				5#库新增拉条完成 0 根，5#库共计 1680 根，累计完成 920 根。5#库斜支撑连接板安装 12 快，5#库斜支撑连接板共计 104 块，累计完成 42 块。斜支撑安装 7 根，累计完成 20 根，5#库共计 52 根。	
2				1#库新增拉条安装 0 根，6#厂房共计 2122 根，累计完成 400 根	
3				6#库斜支撑安装 0 根、斜支撑连接板安装 0 块、累计完成 75 块、6#厂房连接板共计 146 块，6#厂房斜支撑共计 73 根，累计完成 37 根。6#库新增	

				拉条安装 0 根，6#厂房共计 1500 根，累计完成 808 根。	
4				4#库新增拉条完成 0 根，4#库共计 1998 根，累计完成 1110 根。	
5				2#库新增拉条安装 300 根，6#厂房共计 2176 根，累计完成 300 根	

2、进度情况分析：施工人员平均每天 12 人

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	(进场材料、构配件、设备) 名称	进场时间 (年月日)	进场数量 (单位)	拟用部位
1	无			
2				
3				
4				
5				
6				

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

 监理人员：何柏林

2、施工单位：臻杰建设工程有限公司

 (1) 管理人员：郑云

六、施工质量检查情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
----	--------	------	----------

1	材料、 构配 件、设 备进场 验收		
2	监理旁 站项目	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5	
3	施工质 量检查 记录	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5、	
4	隐蔽工 程质量 验收	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5	
5	分部分 项工程 验收	1、	
		2	
		3	
		4	
		5	
6	其他	1	
		2	
		3	
		4	

七、施工质量问题

1、施工单位目前施工人员不足以进行生产，要求施工单位尽快安排施工人员进场；

八、安全文明施工

要求现场施工人员每天开早会进行安全技术交底形成文件并保存影像

九、沟通协调

无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

2、工程签证：无

3、其他：无

十一、天气统计表。

日期 天气	14	15	16	17	18	19	20
晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
雨							
阴							
雾							
温湿度							

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议			1	
2	审批施工组织设计（方案）				
3	审核施工图纸				
4	发出监理通知			2	
5	审批分包单位				
6	原材料审批				
7	构配件审批				
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收				
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收				


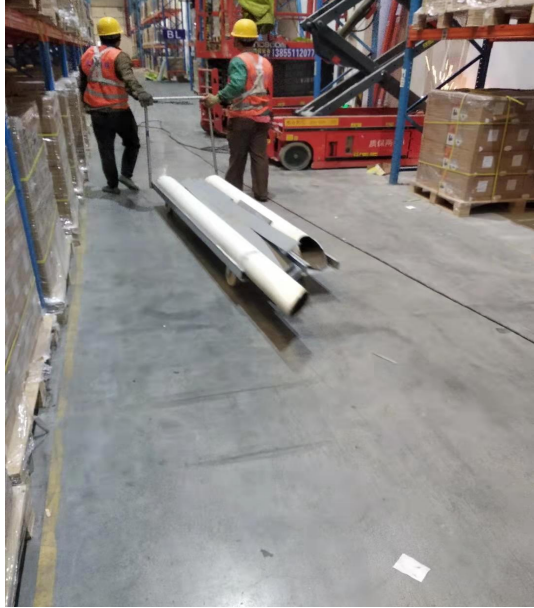
12	监理抽查复试				
13	监理见证取样				
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				


十三、本周监理工作小结：

- 1、厂房内电焊施工易造成火灾，已要求施工单位增加安全员和防火布；
- 2、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）。

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	厂房加固	
图片		
文字描述	进行钢结构加固 电锤打孔	材料运输

图片		
----	---	--

二、质量问题影像

文字描述		
图片		

三、质量问检查影像

文字描述		
------	--	--

图 片		
--------	--	--

四、安全文明施工影像

文字 描述		
图 片		

五、其他施工事宜影像

文字 描述	无	
----------	---	--

图 片	
--------	--
