

昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

监 理 周 报


第 一 期

(2019年11月10日-2019年11月17日)



工程名称	昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站	建设单位	昆明市人民政府扶贫开发办公室
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	一标段：四川东旭电力工程有限公司 负责人：褚智军 二标段：南京中核能源工程有限公司 负责人：李金昌 三标段：鼎晟光伏能源有限公司 刘乃凡 四标段：云南朔铭电力工程有限公司 赵家鹏 五标段：湖南恒宇电力建设有限公司 胡志军		
本周施工内容及进度	1、召开第一次工地例会，确认各施工单位负责人，明确监理职责。 2、施工现场对施工人员进行质量安全技术交底技术交底；各标段陆续开始进场进行基础施工。 3、一标段电站基础施工已完成 80%，二标段电站基础施工完成 45%，三标段场地确认，基础定位放线，四标段电站基础施工完成 20%，五标段电站基础施工完成 60%。 4、砂、石、水泥、进场，进行原材料检查，支架及零部件进场检查；现场施工问题发送监理联系单 1 份、监理通知单 2 份。		
下周计划	1、各标段场地全部均可以进行施工。 2、各标段至少要完成 5 个电站的基础施工，个别标段进度快的，抓紧时间进行下一步工序。 3、三级安全教育要做好，人员安全工器具要配备齐全。		
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育。 2、进场工人佩带好安全帽，并配有其它安全措施。 3、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、符合施工要求及规范，现场施工质量可控		


设备材料进场情况	1、砂、石、水泥进场。 2、 3、支架进场。
人员机械情况	人员:46 人 挖机 4 台

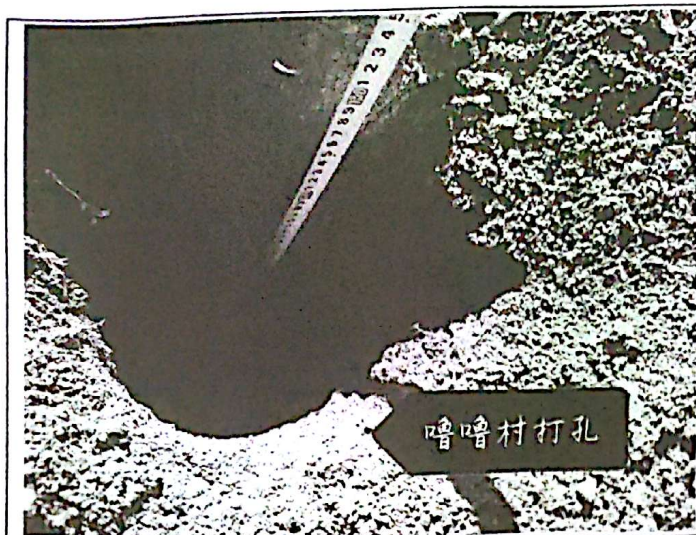


四标段噜噜村基础打孔



三标段普福村放线完成

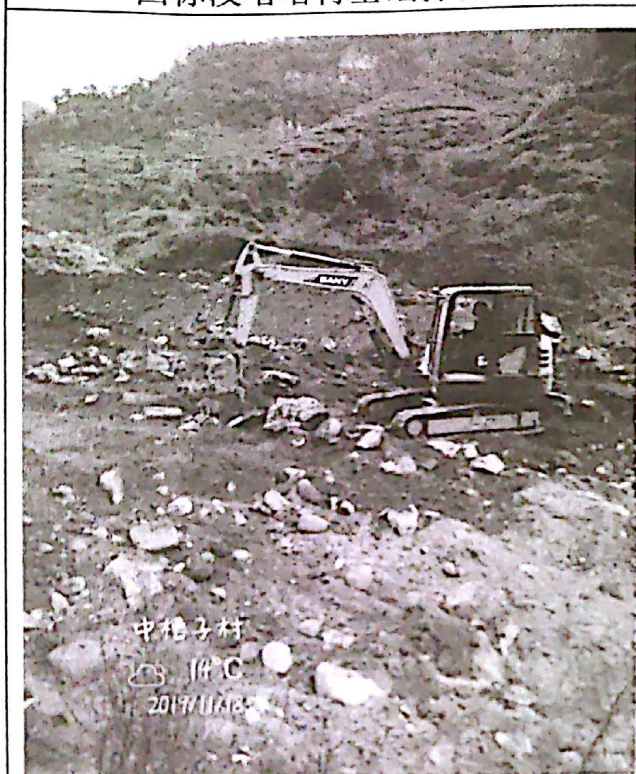

四标段中槽子村场平完成

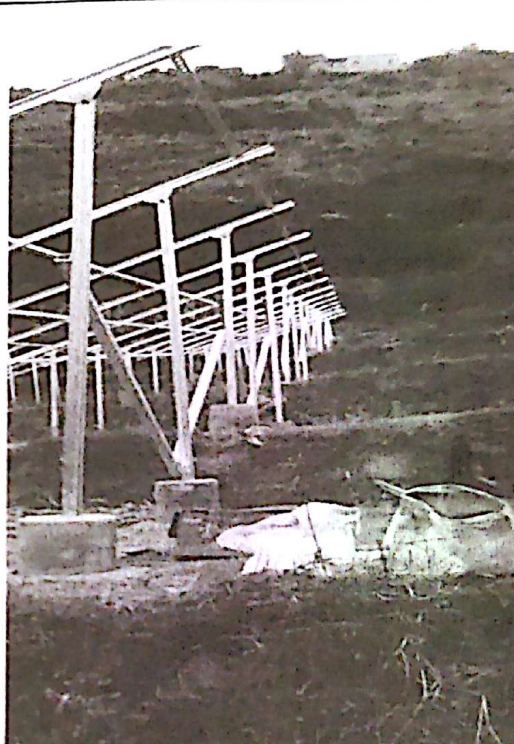

五标段支架安装
