

昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

监 理 周 报

第 六 期


(2019年12月16日-2019年12月23日)




工程名称	昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站	建设单位	昆明市人民政府扶贫开发办公室
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	一标段：四川东旭电力工程有限公司 负责人：褚智军 二标段：南京中核能源工程有限公司 负责人：李金昌 三标段：鼎晟光伏能源有限公司 刘乃凡 四标段：云南朔铭电力工程有限公司 赵家鹏 五标段：湖南恒宇电力建设有限公司 胡志军		
本周施工内容及进度	一标段：13 个电站已具备全容量并网条件，已有 2 个电站成功并网。 二标段：13 个电站具备全容量并网条件，已有 10 个电站并网成功。 三标段：13 个点具备全容量并网条件，已有 2 个电站并网成功。 四标段：13 个点具备全容量并网条件，已有 2 个电站并网成功。 五标段：14 个电站具备全容量并网条件，已有 4 个电站并网成功。 同供电局加强沟通，加快进度完成并网任务。		
下周计划	1、各标段各个施工点全部安装完成，具备并网条件。 2、各标段和供电局对接好各点并网工作。 3、并网安全要做好，人员安全工器具要配备齐全。		
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育。 2、进场工人佩戴好安全帽，并配有其它安全措施。 3、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、符合施工要求及规范，现场施工质量可控		
设备材料进场情况	1、支架、组件、逆变器进场。		
人员机械情况	人员:65 人 发电机 1 台。		




二标段并网调试

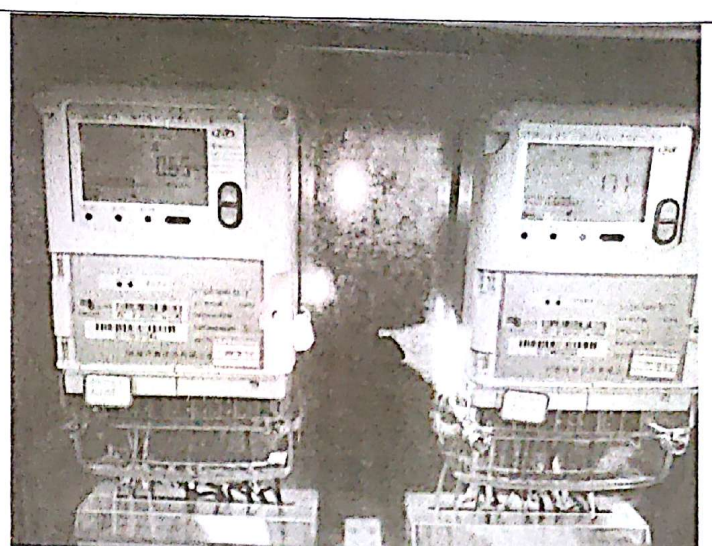

二标段法格村并网成功

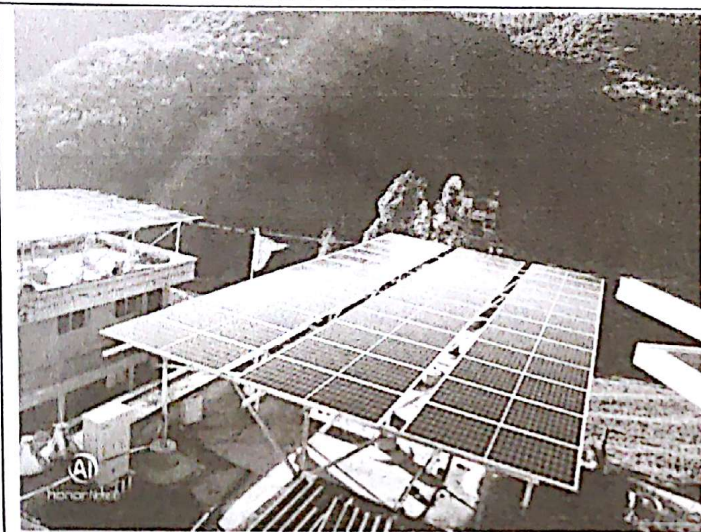

一标段组件安装完成

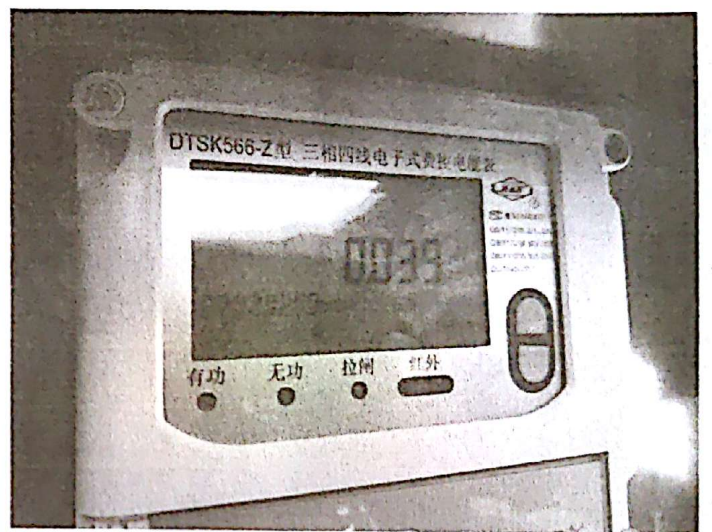

二标段康井并网成功
