

正衡监理风电项目工程建设监理周报

2020 年 第 011 期

项目：淮安中恒 99MW 风电项目		填报周期：2020.4.27-2020.5.3		
本周工作如下； 1、编辑打印日志 4 月 27 日-5 月 3 日。 2、编辑打印监理旁站 081-094。 3、召开第 16 次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-016 递交至业主、施工方扫描后上传至监理云。 4、基点道路施工协调。除 21#29#37#外，其他基本具备通车条件 5、 主控楼一层墙体砌筑完成。 事故油池基础配模板支模。 一次舱、二次舱电缆沟基础钢筋绑扎。一次舱、二次舱电缆沟基础钢筋浇筑。SVG 区电缆沟基础钢筋绑扎。出线构架安装。 6、需协调与帮助： 暂无				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	21#29#37#未完成道路施工，其余基点已初步具备通车条件			
2、开关站/升压站	主控楼主体已完成。消防泵房基础施工已完成。主变基础施工已完成。避雷器基础施工已完成。出线构架基础施工已完成。GIS 基础施工已完成。SVG 基础施工已完成。二次舱设备基础施工已完成。			
3、场内桩基施工	1#2#13#18#管桩施工已完成。			
4、场内风机基础施工	2#基坑开挖清理，预埋电缆管，9#场地平整。			
5、风机安装				
6、汇集线路				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况	已提供图纸			
10、设备/材料到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
11、人员/机械情况	进场道路：（挖掘机 4 台、压路机 2 台）			

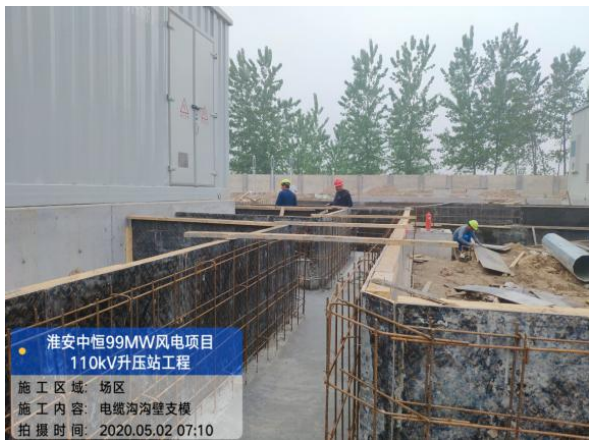
	升压站：（电焊机 3 台、钩机 1 台、铲车 2 台、污水泵 2 台） 风机基础：（施工人员 8 人；电焊机 2 台、打桩机 1 台、挖掘机 1 台、发电机 2 台）			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个风机基础施工				
2、首套风机安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
道路： 1、37#基点计划完成 200m。 2、29#基点计划完成 300m。 4、21#基点计划完成 300m。 升压站： 1、 主控楼一层墙体砌筑完成。 2、 事故油池基础配模板支模。 3、 一次舱、二次舱电缆沟基础钢筋绑扎。 4、 一次舱、二次舱电缆沟基础钢筋浇筑。 5、 SVG 区电缆沟基础钢筋绑扎。 6、 出线构架安装。				

桩基:

- 1、26#25#钢筋绑扎
- 2、1#2#6#机位完成基坑开挖，桩检测。
- 3、15、16、39、22#桩基完成
- 4/25 基础浇筑完成。

填报人: 闫率 审核人: 苗守明 时间: 2020 年 5 月 3 日

现场照片（含文字描述）:

39#管桩施工	升压站电缆沟支模
	 淮安中恒99MW风电项目 110kV升压站工程 施工区域: 场区 施工内容: 电缆沟沟壁支模 拍摄时间: 2020.05.02 07:10
升压站预埋钢管焊接	18#桩检测
 淮安中恒99MW风电项目 110kV升压站工程 施工区域: 出线构架 施工内容: 预埋钢筋焊接 拍摄时间: 2020.05.02 09:51 天气: 雨 21℃	
